



## COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Agrigento

### PROGETTO ESECUTIVO

art. 23 D.lgs. n. 50/2016 - Nuovo Codice Appalti

PROGETTO

### RIQUALIFICAZIONE CENTRO POLIVALENTE, MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DEL CAMPO DA GIOCO NELL'ISOLA DI LINOSA

Progetto esecutivo

ELABORATO TECNICO

13.Cronoprogramma

MARZO 2017

Piano D'Interventi per l'Isola di Lampedusa

 R.U.P. 	 Progettista 	Consulenti 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

**PROGRAMMA DEI LAVORI**

Dati di base:

IMPORTO DEI LAVORI I

€

CATEGORIA

opere edili coeff. 1,54

CONDIZIONI CLIMATICHE NORMALI

Produzione ottimale mensile i

€ 70.000,00

Quindi  $n = I/i \times 1,54$  **4,56**Determinazione tempo di avvio cantiere  $n < 12$   $n^\circ =$  **1**Durata presunta del cantiere:  $n + n^\circ$  **5,56**

	Data	Imp.Parziale	Imp. Totale
consegna lavori			
inizio lavori			
0,90 x i	settembre	€	€
0,90 x i	ottobre	€	€
0,90 x i	novembr	€	€
0,45 x i	dicembre	€	€
0,15 x i	gennaio		
0,15 x i	febbraio		
0,75 x i	marzo		
0,90 x i	aprile		
0,90 x i	maggio		
0,90 x i	giugno		
0,90 x i	luglio		
0,45x i	agosto		

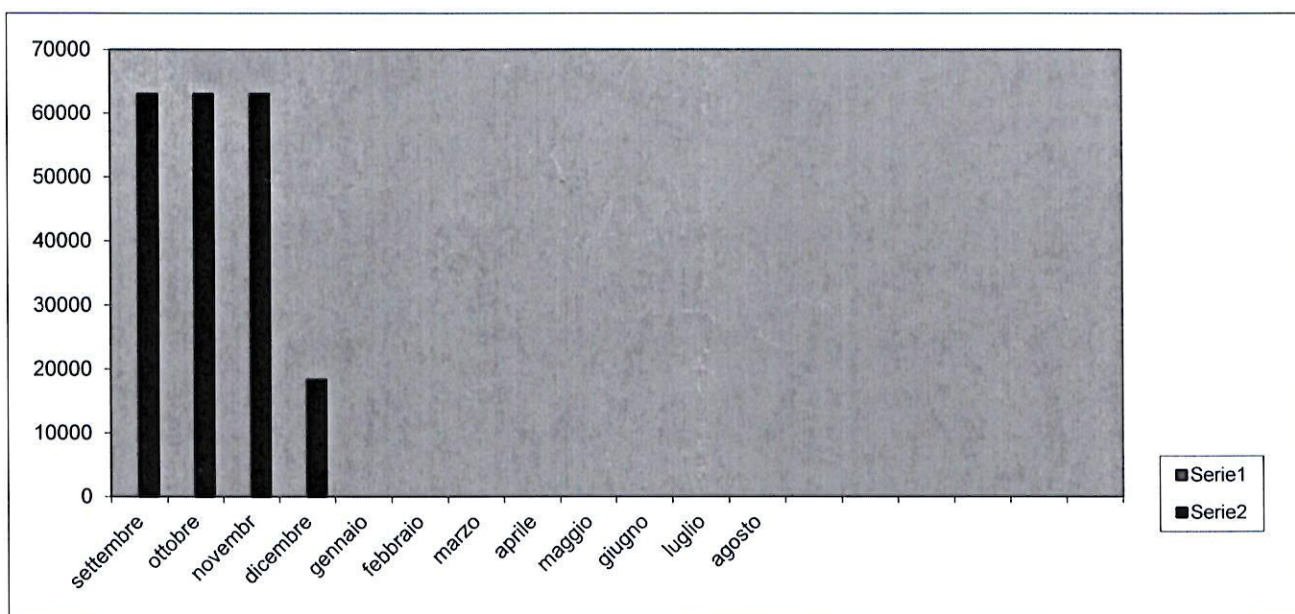


Diagramma climatico ambientale - NORMALE

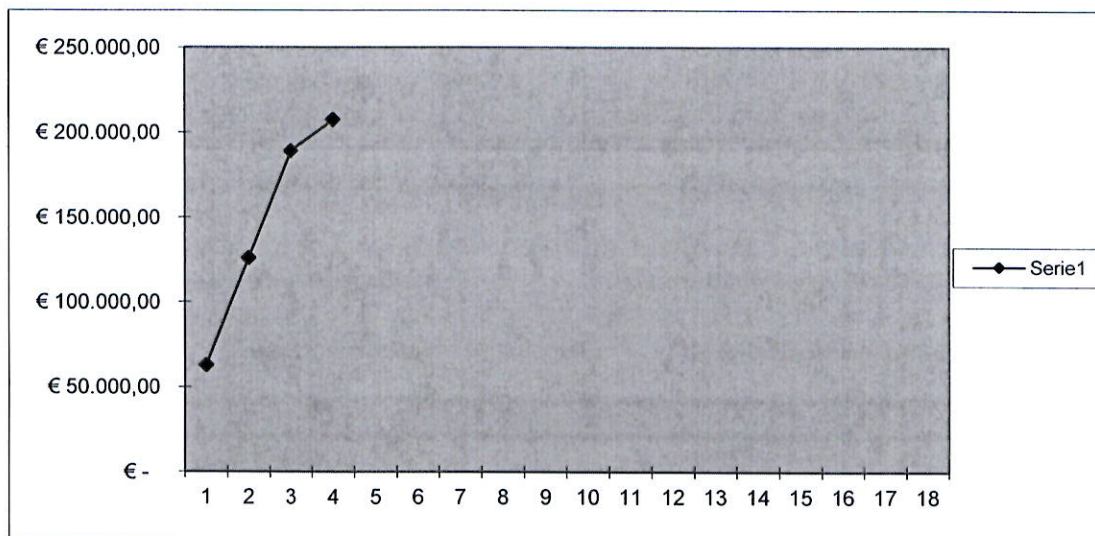


Diagramma di avanzamento

Il Progettista  
Arch.C.Fiorentino

RIEPILOGO:Prev. 01/09/2018 - 10/01/2019 = 132 gg. Giorni lavorativi Prev.90 gg.

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	SETTEMBRE/18	OTTOBRE/18	NOVEMBRE/18	DICEMBRE/18	GENNAIO/19
Demolizioni - Scavi E Dismissioni	13.324,08	01/09/2018	30/09/2018	30	13.324,08				
2.- Opere Edili E Sistemazioni	184.641,58	01/10/2018	30/11/2018	61					
3.- Impianti	6.379,54	01/12/2018	27/12/2018	27					
4.- Sicurezza	3.013,12	28/12/2018	10/01/2019	14					
PARZIALI	-----				13.324,08	93.834,30	90.807,36	7.240,53	2.152,23
PROGRESSIVI	-----				13.324,08	107.158,39	197.965,76	205.206,29	207.358,52
MESE	-----				SETTEMBRE/18	OTTOBRE/18	NOVEMBRE/18	DICEMBRE/18	GENNAIO/19
