



REGIONE SICILIA



COMUNE DI LAMPEDUSA

Provincia di Agrigento

COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA DI BASE PER LA PRATICA DEL NUOTO



Well Tech Engineering srl
CERTIFICATA ISO 9001
Via Dogana n°1 - 38122 Trento
Tel. 461 261784 - Fax 461 223469
Zona industriale n°120
- 92100 Agrigento
Tel. 0922 441526 - Fax 0922 441527
E-mail info@welltechsrl.it

PROGETTISTA
Dott. Arch. Calogero Isalio



Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Di Malta

CAPITOLO

RELAZIONI E CAPITOLATI

TITOLO DELLA TAVOLA

Cronoprogramma delle lavorazioni

Il Sindaco

Salvatore Martello



PROGETTO

W T 0 0 0 1 9 6 A

Scala	Formato	All.	Ediz.	Rev.
///	A/4	15	A	1

EDIZ.	REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	CONTR.	APPR.	FILE ARCHIVIO
A	0	AGOSTO 2019	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO aggiornamento a seguito nota prot. 6324 del 21/05/2019	G.D.	L.S.	C.B.	WT000196A15.pdf
A	1	15 Novembre 2019	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO aggiornamento a seguito nota prot. 6324 del 21/05/2019	G.D.	L.S.	C.B.	WT000196A15.pdf

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Provincia di Agrigento

*Progetto di completamento per la costruzione della struttura di base per la
pratica del nuoto*

PIANIFICAZIONE DEI LAVORI
ELENCO DELLE ATTIVITA'

Lavori di completamento della struttura di base per la pratica del nuoto

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
2. 1	COSTI PER LA SICUREZZA	379	21/01/2020	13/07/2021						57.288,74	
1. 1	DEMOLIZIONI, DISMISSIONI	5	24/01/2020	30/01/2020						11.987,88	
1. 2	RIPRISTINI E NUOVE OPERE	10	28/01/2020	10/02/2020						46.610,00	
1. 3	MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE	80	07/02/2020	29/05/2020						309.962,47	
1. 5	(1/2) COPERTURE ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI	16	10/02/2020	02/03/2020						39.930,00	
1. 8	(1/2) ANTINCENDIO, ASCENSORE E OPERE VARIE E DI RIFINITURA	7	25/03/2020	02/04/2020						8.000,00	
1. 5	(2/2) COPERTURE ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI	30	30/03/2020	11/05/2020						365.089,46	
1.12	(1/2) IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA	31	31/03/2020	13/05/2020						30.360,00	
1.11	(1/3) IMPIANTI RISCALDAMENTO E TRATTAMENTO ACQUA	62	01/04/2020	29/06/2020						48.520,00	
1.10	(1/2) IMPIANTI ELETTRICI	31	13/04/2020	26/05/2020						45.954,04	
1.10	(2/2) IMPIANTI ELETTRICI	136	16/06/2020	23/12/2020						106.101,64	
1. 6	(1/2) PORTE INTERNE E INFISSI	11	29/06/2020	13/07/2020						9.998,32	
1. 7	(1/2) IMPIANTI IDRICI, IGIENICO-SANITARI	16	07/08/2020	28/08/2020						6.000,00	
1. 4	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	70	30/09/2020	11/01/2021						193.833,92	
1.11	(2/3) IMPIANTI RISCALDAMENTO E TRATTAMENTO ACQUA	35	15/12/2020	04/02/2021						18.652,00	
1.11	(3/3) IMPIANTI RISCALDAMENTO E TRATTAMENTO ACQUA	82	04/01/2021	28/04/2021						184.192,00	
1. 6	(2/2) PORTE INTERNE E INFISSI	30	22/02/2021	02/04/2021						112.938,27	
1. 9	OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA	100	22/02/2021	12/07/2021						377.617,28	
1.12	(2/2) IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA	50	03/05/2021	12/07/2021						62.001,00	
1. 7	(2/2) IMPIANTI IDRICI, IGIENICO-SANITARI	18	27/05/2021	22/06/2021						80.957,52	
1. 8	(2/2) ANTINCENDIO, ASCENSORE E OPERE VARIE E DI RIFINITURA										

Lavori di completamento della struttura di base per la pratica del nuoto

Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
		20	15/06/2021	12/07/2021						87.462,41	

Agrigento, 15/11/2019



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Provincia di Agrigento

*Progetto di completamento per la costruzione della struttura di base per la
pratica del nuoto*

DIAGRAMMA FINANZIARIO

Lavori di completamento della struttura di base per la pratica del nuoto

Diagramma Finanziario

N°	Attività da svolgere	Distribuzione Mensile degli Importi delle attività da svolgere (arrotondati alle migliaia di Euro)																								Tot. Attività
		Mese	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°					
1	COSTI PER LA SICUREZZA		1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1					53
2	DEMOLIZIONI, DISMISSIONI		12																							12
3	RIPRISTINI E NUOVE OPERE		19	28																						47
4	MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE			62	85	85	77																			309
5	(1/2) COPERTURE ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI			37	2																					39
6	(1/2) ANTINCENDIO, ASCENSORE E OPERE VARIE E DI RIFINITURA				6	2																				8
7	(2/2) COPERTURE ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI				24	268	73																			365
8	(1/2) IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA				1,0	22	8																			31
9	(1/3) IMPIANTI RISCALDAMENTO E TRATTAMENTO ACQUA					17	16	16																		49
10	(1/2) IMPIANTI ELETTRICI					21	25																			46
11	(2/2) IMPIANTI ELETTRICI							9	18	16	17	17	16	12												105
12	(1/2) PORTE INTERNE E INFISSI							2	8																	10
13	(1/2) IMPIANTI IDRICI, IGIENICO-SANITARI									6																6
14	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI										3	61	58	58	14											194
15	(2/3) IMPIANTI RISCALDAMENTO E TRATTAMENTO ACQUA													6	10	2										18
16	(3/3) IMPIANTI RISCALDAMENTO E TRATTAMENTO ACQUA														43	45	52	45								185
17	(2/2) PORTE INTERNE E INFISSI															19	87	8								114
18	OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA															19	87	83	79	79	30					377
19	(2/2) IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA																		26	26	10					62
20	(2/2) IMPIANTI IDRICI, IGIENICO-SANITARI																		13	67						80
21	(2/2) ANTINCENDIO, ASCENSORE E OPERE VARIE E DI RIFINITURA																			52	35					87
Parziali Mese			32	130	121	418	202	30	29	25	23	81	77	79	70	88	229	139	121	227	76					
Progressivi			32	162	283	701	903	933	962	987	1.010	1.091	1.168	1.247	1.317	1.405	1.634	1.773	1.894	2.121	2.197					2.197

Lavori di completamento della struttura di base per la pratica del nuoto

Diagramma Finanziario - Lista delle Attività

N°	Descrizione Attività	Previsto (netto)		Date		Giorni	
		Euro	%	Inizio	Fine	Lav.	Tot.
1	COSTI PER LA SICUREZZA	57.288,74	2,60	21/01/2020	13/07/2021	379	540
2	DEMOLIZIONI, DISMISSIONI	11.987,88	0,54	24/01/2020	30/01/2020	5	7
3	RIPRISTINI E NUOVE OPERE	46.610,00	2,12	28/01/2020	10/02/2020	10	14
4	MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE	309.962,47	14,07	07/02/2020	29/05/2020	80	113
5	(1/2) COPERTURE ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI	39.930,00	1,81	10/02/2020	02/03/2020	16	22
6	(1/2) ANTINCENDIO, ASCENSORE E OPERE VARIE E DI RIFINITURA	8.000,00	0,36	25/03/2020	02/04/2020	7	9
7	(2/2) COPERTURE ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI	365.089,46	16,57	30/03/2020	11/05/2020	30	43
8	(1/2) IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA	30.360,00	1,38	31/03/2020	13/05/2020	31	44
9	(1/3) IMPIANTI RISCALDAMENTO E TRATTAMENTO ACQUA	48.520,00	2,20	01/04/2020	29/06/2020	62	90
10	(1/2) IMPIANTI ELETTRICI	45.954,04	2,09	13/04/2020	26/05/2020	31	44
11	(2/2) IMPIANTI ELETTRICI	106.101,64	4,82	16/06/2020	23/12/2020	136	191
12	(1/2) PORTE INTERNE E INFISSI	9.998,32	0,45	29/06/2020	13/07/2020	11	15
13	(1/2) IMPIANTI IDRICI, IGIENICO-SANITARI	6.000,00	0,27	07/08/2020	28/08/2020	16	22
14	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	193.833,92	8,80	30/09/2020	11/01/2021	70	104
15	(2/3) IMPIANTI RISCALDAMENTO E TRATTAMENTO ACQUA	18.652,00	0,85	15/12/2020	04/02/2021	35	52
16	(3/3) IMPIANTI RISCALDAMENTO E TRATTAMENTO ACQUA	184.192,00	8,36	04/01/2021	28/04/2021	82	115
17	(2/2) PORTE INTERNE E INFISSI	112.938,27	5,13	22/02/2021	02/04/2021	30	40
18	OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA	377.617,28	17,14	22/02/2021	12/07/2021	100	141
19	(2/2) IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA	62.001,00	2,81	03/05/2021	12/07/2021	50	71
20	(2/2) IMPIANTI IDRICI, IGIENICO-SANITARI	80.957,52	3,67	27/05/2021	22/06/2021	18	27
21	(2/2) ANTINCENDIO, ASCENSORE E OPERE VARIE E DI RIFINITURA	87.462,41	3,97	15/06/2021	12/07/2021	20	28

Agrigento, 15/11/2019



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Provincia di Agrigento

*Progetto di completamento per la costruzione della struttura di base per la
pratica del nuoto*

PIANIFICAZIONE DEI LAVORI
DIAGRAMMA DI GANTT - "ANNI/MESI"

[illegible]



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Provincia di Agrigento

*Progetto di completamento per la costruzione della struttura di base per la
pratica del nuoto*

PIANIFICAZIONE DEI LAVORI
DIAGRAMMA DI GANTT "MESI/GIORNI"

	Mese	January 2020											February 2020																													
	Giorno	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	Ric. Parziale Prev. (x 1000)	0,15	0,15	0,15	2,54	0,00	0,00	2,54	7,21	7,21	7,21	4,81	0,00	0,00	4,81	4,81	4,81	4,81	8,68	0,00	0,00	11,18	6,52	6,52	6,52	6,52	0,00	0,00	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	0,00	0,00	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	
	Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	0,1	0,3	0,4	3,0	3,0	3,0	5,5	12,7	19,9	27,1	31,9	31,9	31,9	36,8	41,6	46,4	51,2	59,9	59,9	59,9	71,1	77,6	84,1	90,6	97,2	97,2	97,2	103,7	110,2	116,7	123,2	129,8	129,8	129,8	136,3	142,8	149,3	155,8	162,4		
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COSTI PER LA SICUREZZA																																										
DEMOLIZIONI, DISMISSIONI																																										
RIPRISTINI E NUOVE OPERE																																										
MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE																																										
(1/2) COPERTURE ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI																																										
(1/2) ANTINCENDIO, ASCENSORE E OPERE VARIE E DI RIFINITURA																																										
(2/2) COPERTURE ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI																																										
(1/2) IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA																																										
(1/3) IMPIANTI RISCALDAMENTO E TRATTAMENTO ACQUA																																										
(1/2) IMPIANTI ELETTRICI																																										
(2/2) IMPIANTI ELETTRICI																																										
(1/2) PORTE INTERNE E INFISSI																																										
(1/2) IMPIANTI IDRICI, IGIENICO-SANITARI																																										
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI																																										
(2/3) IMPIANTI RISCALDAMENTO E TRATTAMENTO ACQUA																																										
(3/3) IMPIANTI RISCALDAMENTO E TRATTAMENTO ACQUA																																										
(2/2) PORTE INTERNE E INFISSI																																										
OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA																																										
(2/2) IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA																																										
(2/2) IMPIANTI IDRICI, IGIENICO-SANITARI																																										
(2/2) ANTINCENDIO, ASCENSORE E OPERE VARIE E DI RIFINITURA																																										


[illegible]

	Mese	June 2020							July 2020																												Aug				
	Giorno	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	
	Ric. Parziale Prev. (x 1000)	1,71	1,71	0,00	0,00	2,62	1,84	1,84	1,84	1,84	0,00	0,00	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	0,00	0,00	1,84	0,93	0,93	0,93	0,93	0,00	0,00	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,00	0,00	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,00	0,00	
Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	927,8	929,5	929,5	929,5	932,2	934,0	935,8	937,7	939,5	939,5	939,5	941,4	943,2	945,0	946,9	948,7	948,7	950,6	951,5	952,4	953,4	954,3	954,3	955,2	956,2	957,1	958,0	958,9	958,9	958,9	959,9	960,8	961,7	962,7	963,6	963,6	963,6	963,6	963,6		
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
COSTI PER LA SICUREZZA																																									
DEMOLIZIONI, DISMISSIONI																																									
RIPRISTINI E NUOVE OPERE																																									
MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE																																									
(1/2) COPERTURE ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI																																									
(1/2) ANTINCENDIO, ASCENSORE E OPERE VARIE E DI RIFINITURA																																									
(2/2) COPERTURE ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI																																									
(1/2) IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA																																									
(1/3) IMPIANTI RISCALDAMENTO E TRATTAMENTO ACQUA																																									
(1/2) IMPIANTI ELETTRICI																																									
(2/2) IMPIANTI ELETTRICI																																									
(1/2) PORTE INTERNE E INFISSI																																									
(1/2) IMPIANTI IDRICI, IGIENICO-SANITARI																																									
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI																																									
(2/3) IMPIANTI RISCALDAMENTO E TRATTAMENTO ACQUA																																									
(3/3) IMPIANTI RISCALDAMENTO E TRATTAMENTO ACQUA																																									
(2/2) PORTE INTERNE E INFISSI																																									
OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA																																									
(2/2) IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA																																									
(2/2) IMPIANTI IDRICI, IGIENICO-SANITARI																																									
(2/2) ANTINCENDIO, ASCENSORE E OPERE VARIE E DI RIFINITURA																																									

[illegible]

	Mese	September 2020																				October 2020																		
	Giorno	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Ric. Parziale Prev. (x 1000)	0,93	0,00	0,00	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,00	0,00	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,00	0,00	0,93	0,93	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00	3,70	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00	3,70	
	Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	997,5	997,5	997,5	998,5	999,4	1000,3	1001,3	1002,2	1002,2	1002,2	1003,1	1004,1	1005,0	1005,9	1006,9	1006,9	1006,9	1007,8	1008,7	1012,4	1016,1	1019,8	1019,8	1019,8	1023,5	1027,2	1030,9	1034,6	1038,3	1038,3	1038,3	1042,0	1045,7	1049,4	1053,1	1056,8	1056,8	1056,8	1060,5
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
COSTI PER LA SICUREZZA																																								
DEMOLIZIONI, DISMISSIONI																																								
RIPRISTINI E NUOVE OPERE																																								
MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE																																								
(1/2) COPERTURE ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI																																								
(1/2) ANTINCENDIO, ASCENSORE E OPERE VARIE E DI RIFINITURA																																								
(2/2) COPERTURE ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI																																								
(1/2) IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA																																								
(1/3) IMPIANTI RISCALDAMENTO E TRATTAMENTO ACQUA																																								
(1/2) IMPIANTI ELETTRICI																																								
(2/2) IMPIANTI ELETTRICI																																								
(1/2) PORTE INTERNE E INFISSI																																								
(1/2) IMPIANTI IDRICI, IGIENICO-SANITARI																																								
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI																																								
(2/3) IMPIANTI RISCALDAMENTO E TRATTAMENTO ACQUA																																								
(3/3) IMPIANTI RISCALDAMENTO E TRATTAMENTO ACQUA																																								
(2/2) PORTE INTERNE E INFISSI																																								
OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA																																								
(2/2) IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA																																								
(2/2) IMPIANTI IDRICI, IGIENICO-SANITARI																																								
(2/2) ANTINCENDIO, ASCENSORE E OPERE VARIE E DI RIFINITURA																																								

	Mese	October 2020												November 2020																										
	Giorno	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Ric. Parziale Prev. (x 1000)	3,70	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
	Ric. Parziale Cons. (x 1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ric. Progressivo Prev. (x 1000)	1064,2	1067,9	1071,6	1075,3	1075,3	1075,3	1079,0	1082,7	1086,4	1090,1	1093,8	1093,8	1093,8	1097,5	1101,2	1104,9	1108,6	1112,3	1112,3	1112,3	1116,0	1119,7	1123,4	1127,1	1130,8	1130,8	1130,8	1134,5	1138,2	1141,9	1145,6	1149,3	1149,3	1149,3	1153,0	1156,7	1160,4	1164,1	1167,8
Ric. Progressivo Cons. (x 1000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SP5																																								
COSTI PER LA SICUREZZA																																								
DEMOLIZIONI, DISMISSIONI																																								
RIPRISTINI E NUOVE OPERE																																								
MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE																																								
(1/2) COPERTURE ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI																																								
(1/2) ANTINCENDIO, ASCENSORE E OPERE VARIE E DI RIFINITURA																																								
(2/2) COPERTURE ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI																																								
(1/2) IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA																																								
(1/3) IMPIANTI RISCALDAMENTO E TRATTAMENTO ACQUA																																								
(1/2) IMPIANTI ELETTRICI																																								
(2/2) IMPIANTI ELETTRICI																																								
(1/2) PORTE INTERNE E INFISSI																																								
(1/2) IMPIANTI IDRICI, IGIENICO-SANITARI																																								
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI																																								
(2/3) IMPIANTI RISCALDAMENTO E TRATTAMENTO ACQUA																																								
(3/3) IMPIANTI RISCALDAMENTO E TRATTAMENTO ACQUA																																								
(2/2) PORTE INTERNE E INFISSI																																								
OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA																																								
(2/2) IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA																																								
(2/2) IMPIANTI IDRICI, IGIENICO-SANITARI																																								
(2/2) ANTINCENDIO, ASCENSORE E OPERE VARIE E DI RIFINITURA																																								

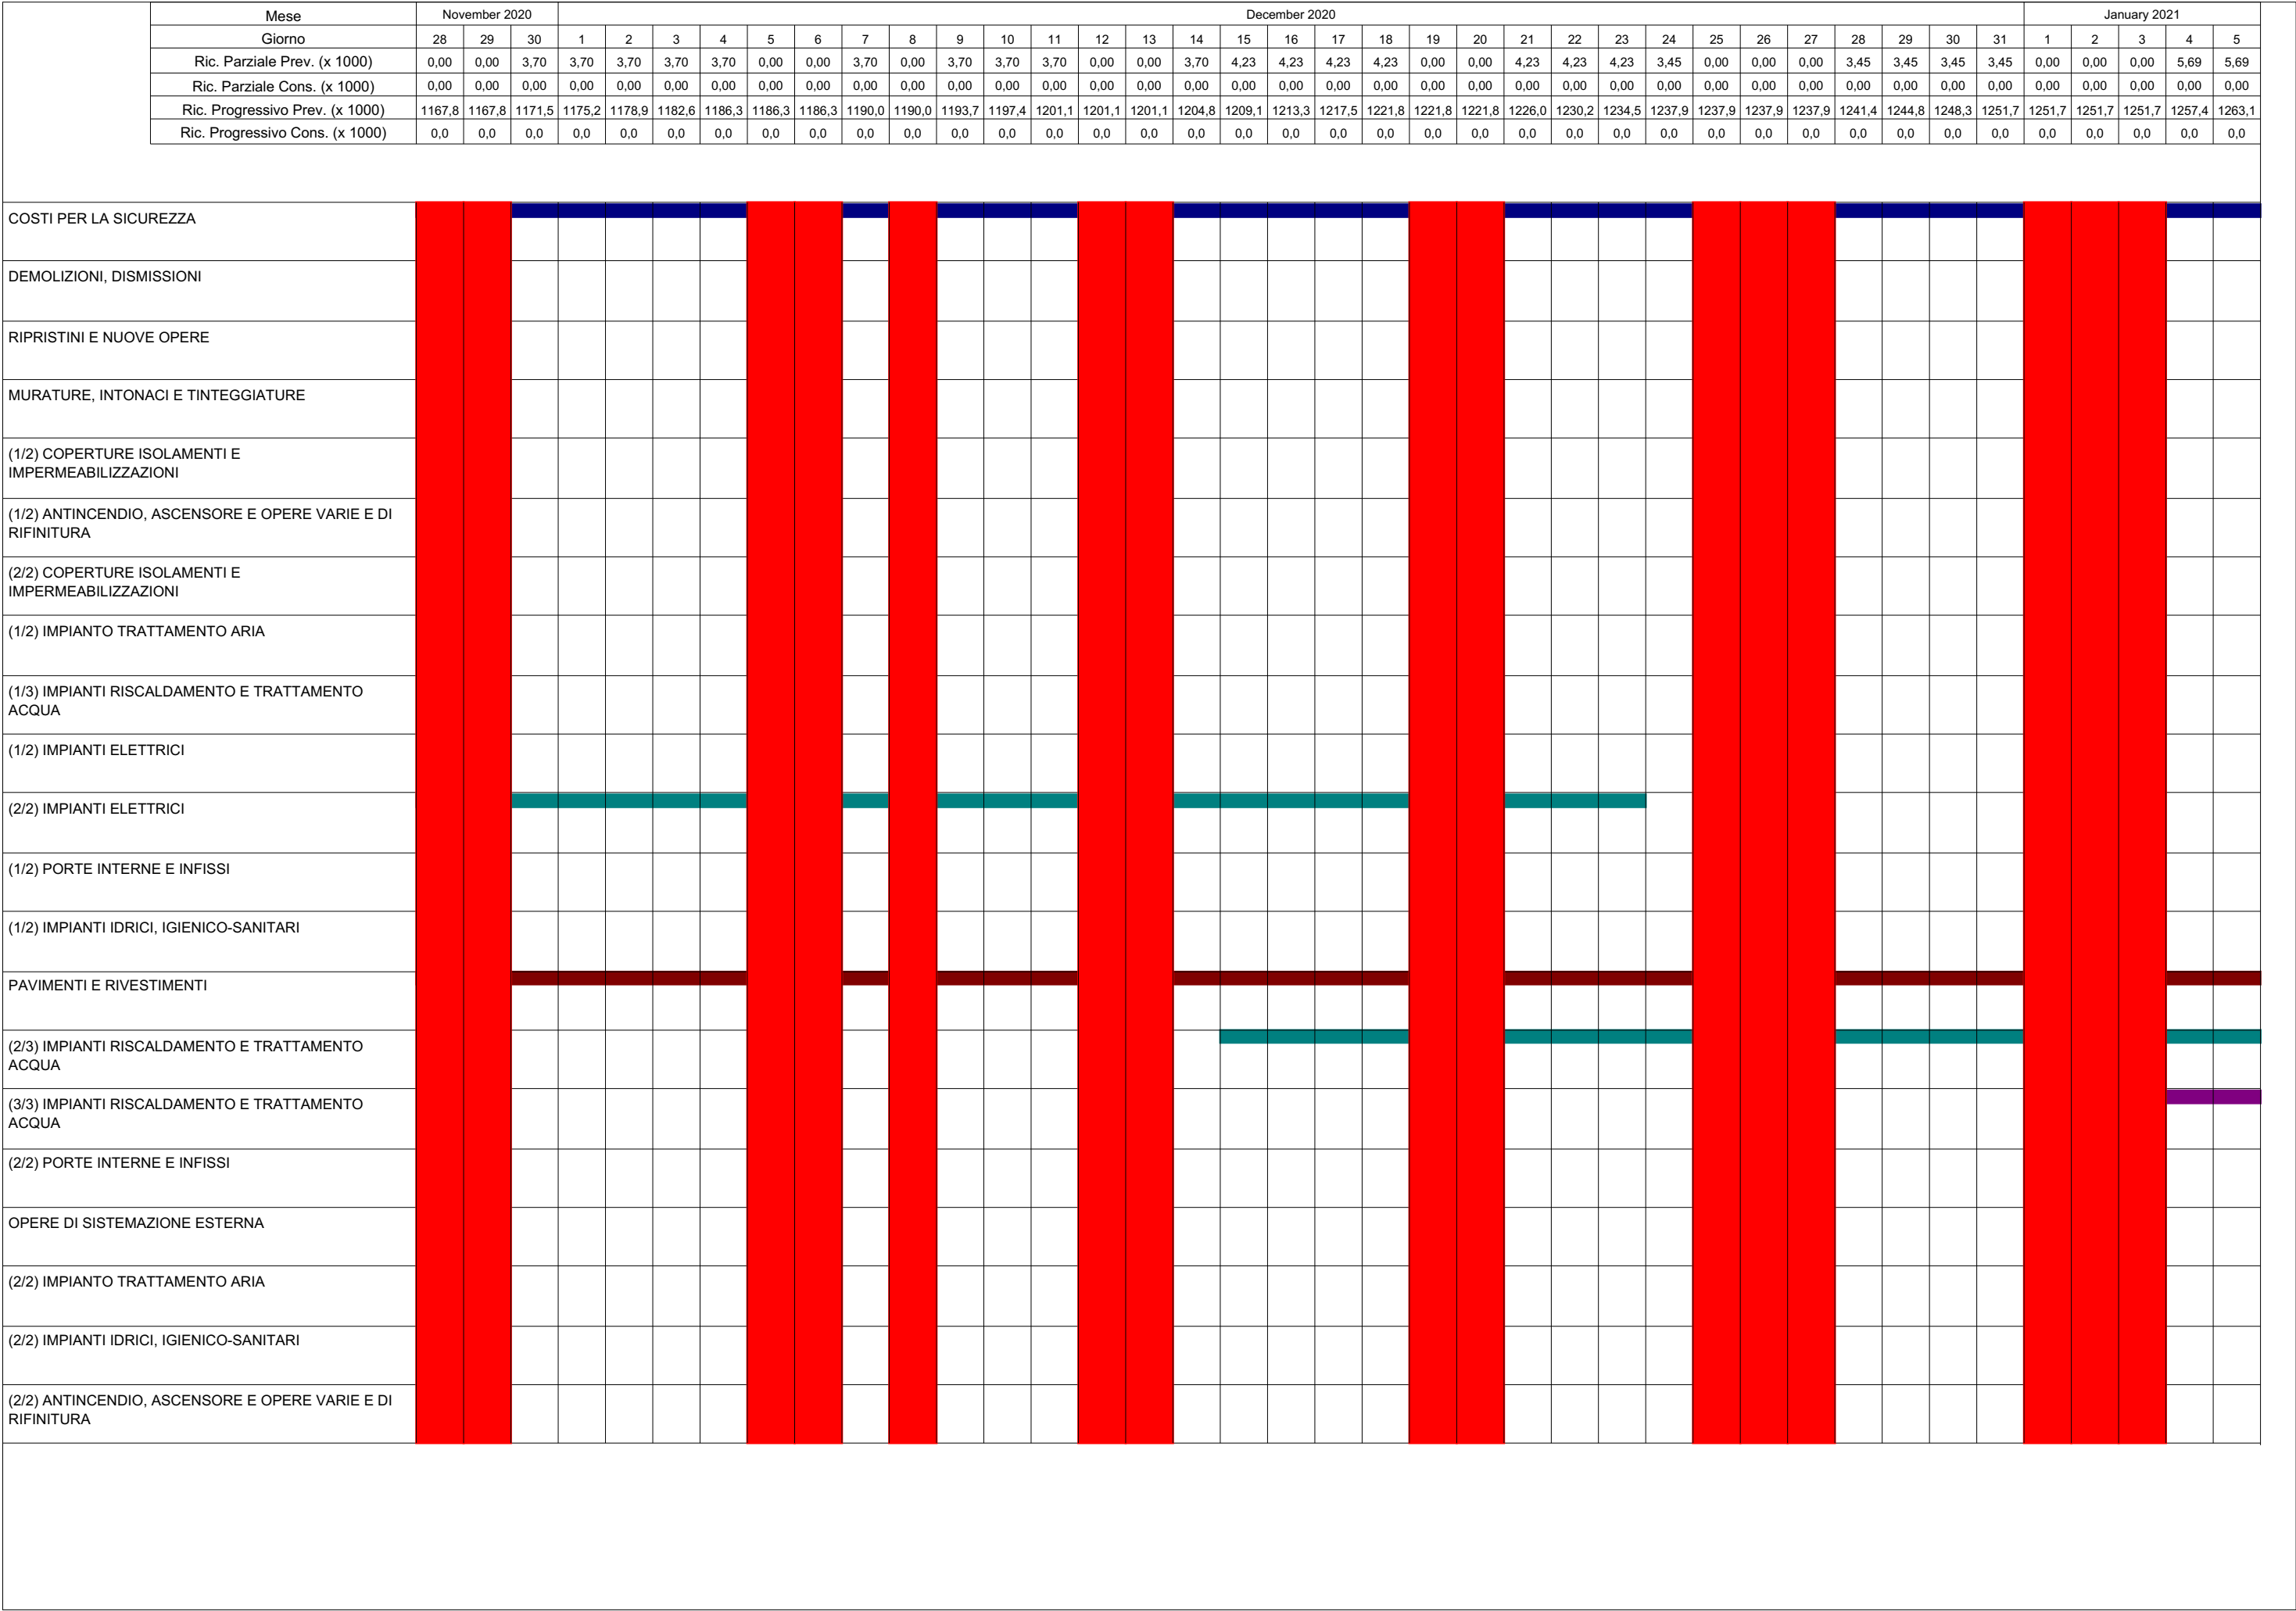

[illegible]

[illegible]

