



# COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

## PROVINCIA DI AGRIGENTO

**OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER L'AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CIMITERO  
COMUNALE DI LAMPEDUSA, SITO IN ZONA CALA PISANA.**



**ELABORATO**

**7.2**

**ELABORATO CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI:**

- **CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

**REV. DEL**


**IL SINDACO**  
dott. Salvatore Martello

**IL R.U.P.**

**Giuseppe Architetto Licata**

Viale della Vittoria, 98  
92020 - Grotte (AG)  
arch.giuseppelicata@virgilio.it  
cell. 333 4563339  
P.Iva 02663380844

**IL PROGETTISTA**



Lampedusa e Linosa (AG), li \_\_\_\_\_

**Comune di Lampedusa e Linosa**

**Provincia di Agrigento**


# **Cronoprogramma di PROGETTO**

**OGGETTO:** PROGETTO ESECUTIVO PER L'AMPLIAMENTO E  
SISTEMAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DI LAMPEDUSA,  
SITO IN ZONA CALA PISANA.

**COMMITTENTE:** Comune di Lampedusa e Linosa

Lampedusa e Linosa,

Il Tecnico  
(arch. Licata Giuseppe)






ID	Nome attività	Durata	Importo	Mese 1									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Lavori a MISURA</b>	231 g	897'531,93										
2	<b>Scavi, Demolizioni e trasporto in discarica</b>	12 g	30'205,79										
3	Dismissione, pulizia accatastamento di pavimentazione aut ... l'eventuale strato di sottofondo in calcestruzzo di...	6 g	6'704,08										
4	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simi ... ro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.	3 g	6'870,30										
5	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori d ... ta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.	5 g	9'762,30										
6	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, ... cavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:	1 g	2'197,44										
7	Dismissione blocco palo di illuminazione tronco conico a ... io per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	1 g	722,79										
8	Dismissione di cancello esistente in acciaio inox delle d ... io per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	1 g	218,50										
9	Smontaggio, spostamento e rimontaggio di monumento lapide ... io per dare il lavoro completo e a perfetta reg...	1 g	2'530,00										
10	<b>overflow</b>	2 g	1'200,38										
11	Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, ... ta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.	2 g	1'200,38										
12	<b>Stutture in fondazione e elevazione</b>	104 g	185'449,45										
13	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolm ... le barre di armatura. per opere in fondazi...	3 g	9'057,95										
14	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B4 ... ministrazione); per strutture in cemento armato intelaiate	65 g	52'246,30										
15	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata ... in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).	11 g	6'618,78										
16	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, d ... per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.	38 g	28'205,13										
17	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato i ... tura. - Per opere in fondazione per lavori edili : C 28/35	13 g	43'211,67										
18	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato i ... atura. - Per opere in elevazione per lavori edili: C 28/35	7 g	26'754,27										
19	Fornitura e collocazione di rivestimento isolante per mur ... ssario per dare il lavoro finito a perfetta regole d'arte.	3 g	2'562,50										
20	Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzont ... armatura trasversale regolamentare, per luci fino a 6,00 m	7 g	16'792,85										
21	<b>elementi prefabbricati</b>	12 g	288'227,36										
22	Fornitura, trasporto e posa in opera di batteria di loculi ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	1 g	10'935,48										
23	Fornitura, trasporto e posa in opera di batteria di loculi ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	7 g	237'935,00										
24	Fornitura, trasporto e posa in opera di batteria di loculi ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	4 g	17'110,56										
25	Fornitura e posa in opera di cassetta ossario in batteria ... onere e magistero per realizzare l'opera a regola d'arte.	2 g	22'246,32										
26	<b>Tompagni e tramezzi</b>	22 g	49'150,33										
27	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con ... arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.	12 g	42'564,30										
28	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg ... pessore di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-...	12 g	6'586,03										
29	<b>Rifiniture</b>	101 g	251'300,63										
30	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo no ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	11 g	35'485,25										
31	Finiture idrofugata a civile media (rasante) e successiv ... sario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte	14 g	30'527,64										
32	Fornitura e collocazione di scossalina in lamiera prevern ... ssario per dare il lavoro finito a perfetta regole d'arte.	3 g	7'893,42										
33	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo no ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	16 g	15'718,59										
34	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello s ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	5 g	8'260,30										
35	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina ... corre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	6 g	2'995,97										
36	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolic ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	6 g	11'815,36										

ID	Nome attività	Durata	Importo	Mese 1									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due pa ... entemente dall'interno o dall'esterno con appos...	1 g	7'304,47										
38	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ... erfetta regola d'arte, collocato all'int...	6 g	2'458,86										
39	Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con s ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	5 g	7'471,83										
40	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ... ate dalla D.L. battiscopa a becco civetta 8x30 cm s ...	3 g	1'098,77										
41	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ... erfetta regola d'arte, colloc...	4 g	7'229,64										
42	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione pe ... ore non inferiore a 28 mm per elementi di formato 40...	3 g	2'070,58										
43	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con gua ... istero per dare l'opera completa a perfetta reg...	6 g	7'991,72										
44	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qua ... di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travertino e simili	2 g	39'285,81										
45	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qua ... di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travertino e simili	7 g	1'751,84										
46	Fornitura, e collocazione di staffa in bronzo per sostegn ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	2 g	17'064,96										
47	Fornitura, e collocazione di perno tipo parma in bronzo p ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	2 g	6'412,23										
48	Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con r ... istero per dare l'opera completa a perfetta reg...	2 g	5'161,01										
49	Messa in opera di pavimentazione autobloccante esistente ... l'onere della compattazione con appos...	7 g	3'164,70										
50	Fornitura e posa in opera di cancelli carrabile e pedonal ... orre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	1 g	7'877,27										
51	Fornitura e posa in opera di controsoffitti piani in rete ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	3 g	1'324,41										
52	Fornitura e collocazione d'infisso di PVC per portoncino, ... smittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(...	4 g	5'808,35										
53	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzat ... smittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(...	4 g	9'613,20										
54	Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in con ... , da compensarsi a parte, per elementi di formato 16x12 cm	7 g	4'042,84										
55	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera prevernici ... ompleta ed a perfetta regola d'arte, per diametro da...	2 g	1'471,61										
56	<b>Impianto elettrico</b>	32 g	36'329,14										
57	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli a ... eccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale costipato	2 g	207,13										
58	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, ... cavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:	1 g	21,70										
59	Fornitura e montaggio di quadro elettrico per ente distri ... o con malta cementizia, ed ogni altro onere...	3 g	1'265,00										
60	Fornitura e montaggio di quadro elettrico GENERALE preass ... o con malta cementizia, ed ogni altro onere...	5 g	5'635,00										
61	Fornitura e montaggio di quadro elettrico ONORANZE FUNEBR ... o con malta cementizia, ed ogni altro onere...	2 g	1'495,00										
62	Fornitura e montaggio di quadro elettrico SALA AUTOPTICA ... o con malta cementizia, ed ogni altro onere...	2 g	2'461,00										
63	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato ce ... pleta a perfetta regola d'arte per pozzetti...	3 g	1'985,20										
64	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a ... a a regola d'arte, classe B 125 (carico di rottura 125 kN)	1 g	1'183,14										
65	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con ma ... unzionante a perfetta regola d'arte, diametro pari a...	6 g	582,00										
66	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con ma ... unzionante a perfetta regola d'arte, diametro pari a...	2 g	981,75										
67	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda ... ento con parti metalliche da proteggere...	2 g	354,00										
68	Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e co ... ompleta a perfetta regola d'arte secondo le vige...	1 g	259,90										
69	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato co ... l'opera completa a perfetta regola d'arte, sez. 2 x 1,5 mm²	4 g	921,00										
70	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato co ... l'opera completa a perfetta regola d'arte, sez. 1 x 10 mm²	5 g	1'409,70										
71	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato co ... l'opera completa a perfetta regola d'arte, sez. 1 x 6 mm²	7 g	688,55										
72	Impianto citofonico realizzato con: apparecchio citofonic ... nte, comprese opere murarie. - per ogni punto...	1 g	496,80										




ID	Nome attività	Durata	Importo	Mese 1									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65 ... pera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC...	1 g	1'073,64										
74	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65 ... pera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC...	1 g	2'038,26										
75	Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, p ... era finita a perfetta regola d'arte. Con lampade FL 2x36 W	1 g	2'427,04										
76	Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, p ... era finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FL 1x58 W	1 g	1'799,52										
77	Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna I ... pera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC...	1 g	938,40										
78	Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, compl ... Ita cementizia e ogni altro onere. Dimensione 116x92...	2 g	93,96										
79	Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, compl ... Ita cementizia e ogni altro onere. Dimensione 154x92...	3 g	124,74										
80	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commuta ... minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione ...	7 g	1'779,05										
81	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, dev ... minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione ...	8 g	963,25										
82	Punto di comando aggiunto ad uno esistente, costituito da ... minuteria, ed ogni altro onere. Conduttori sezione ...	2 g	60,95										
83	Maggiorazione per realizzazione di punto di comando lumin ... mando predisposto per localizzazione dello ste...	1 g	23,60										
84	Maggiorazione per la realizzazione di punto di comando e/ ... collegamento dell'apparecchio modulare e o...	1 g	130,60										
85	Installazione di relè interruttore/commutatore di tipo el ... già predisposti. Inclusa la minuteria ed ogni altro onere.	1 g	70,15										
86	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofa ... minuteria ed ogni altro onere. Condutt...	1 g	87,64										
87	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con ... elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm²	8 g	2'075,40										
88	Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1. ... di terra laterali e centrale e alveoli di fase schermati.	1 g	39,70										
89	Punto presa telefono di attestamento linea telefonica est ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	1 g	71,76										
90	Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con line ... istero per dare l'opera completa a perfetta reg...	1 g	83,26										
91	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo uni ... segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm²	11 g	676,80										
92	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo uni ... segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 4,0 mm²	11 g	931,00										
93	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo uni ... segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 6,0 mm²	11 g	893,55										
94	<b>Impianto di scarico acque nere, bionde e meteoriche</b>	14 g	22'922,37										
95	Fornitura e montaggio e installazione di valvola antirifi ... il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.	2 g	1'288,00										
96	Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, ... ta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.	4 g	4'998,36										
97	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli a ... eccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale costipato	1 g	929,09										
98	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, ... cavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:	1 g	117,80										
99	Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tip ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	2 g	2'709,40										
100	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a ... a a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN)	1 g	3'211,38										
101	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fog ... da compensarsi a parte. D esterno 110 mm; interno 10...	6 g	926,07										
102	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fog ... da compensarsi a parte. D esterno 125 mm; interno 11...	6 g	4'549,86										
103	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazio ... icati dalla norma UNI EN 12056-1/5. - per punto di scarico	3 g	1'342,74										
104	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi ... pleta ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 100 mm	5 g	1'297,17										
105	Fornitura e collocazione di autoclave per acqua uso sanit ... i elettrici. Compreso di collettore e valvole di chiusura.	1 g	1'552,50										
106	<b>Impianto idrico-sanitario</b>	18 g	20'397,19										
107	Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina ... ca in ottone OT 58 con premistoppa in tube...	1 g	47,27										
108	Impianto di produzione ACS con scaldacqua elettrici o ter ... perfetta regola d'arte. Per Scaldacqua elettrico da l 100.	1 g	1'725,00										

ID	Nome attività	Durata	Importo	Mese 1											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
109	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idri ... o d'acqua: con tubazioni in multistrato colbentato Ø...	2 g	953,81												
110	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da ½" compreso ogni onere e magistero.	2 g	188,37												
111	Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilen ... gni altro onere e magistero. per diametro esterno da...	5 g	364,05												
112	Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, ... ta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.	3 g	549,29												
113	Fornitura e collocazione di autoclave per acqua uso sanit ... i elettrici. Compreso di collettore e valvole di chiusura.	1 g	1'552,50												
114	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli a ... eccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale costipato	1 g	102,07												
115	Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tip ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	1 g	641,70												
116	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a ... a a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN)	1 g	760,59												
117	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr ... pleta a perfetta regola d'arte. per diametro DN 16x1...	6 g	1'545,60												
118	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr ... ompleta a perfetta regola d'arte. per diametro DN 20...	6 g	2'300,20												
119	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellan ... e l'opera completa e funzionante a perfetta reg...	3 g	2'170,08												
120	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès por ... nte a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 80x80 cm	1 g	306,71												
121	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana v ... per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.	2 g	1'678,80												
122	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monobloc ... e per dare l'opera completa e funzionant...	1 g	2'175,80												
123	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabil ... e l'opera completa e funzionante a perfetta reg...	2 g	2'083,80												
124	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza riba ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	1 g	434,01												
125	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disa ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	1 g	507,15												
126	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabi ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	1 g	310,39												
127	<b>Impianto di condizionamento</b>	1 g	7'565,85												
128	Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di c ... à esterna a 1 metro di distanza non superiore a: 48 dB(A).	1 g	7'565,85												
129	<b>Prove di laboratorio</b>	102 g	1'876,63												
130	Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm ... provini. UNI EN 12390-3:2009 - Per ogni coppia di provini	1 g	640,08												
131	Prova di abbassamento al cono (Slump test). Verifica dell ... l calcestruzzo fresco. UNI EN12350-2:2009 - Per ogni prova	3 g	53,82												
132	Confezionamento di calcestruzzo fresco in cubiere (15*15* 15 cm). UNI EN12390-2:2009 - Per ogni serie da 2 provini	20 g	413,07												
133	Prova di trazione con determinazione di snervamento, rott ... . UNI EN ISO 6892-1:2009; D.M. 14.01.2008 - Per ogni prova	1 g	331,68												
134	Prova di piegamento e raddrizzamento. (per ogni terna). UNI EN ISO 7438:2005; D.M. 14.01.2008	1 g	141,24												
135	Taglio e preparazione della barra di acciaio, in fondo ad ... UNI EN ISO 7438:2005; D.M. 14.01.2008 - Per ogni campione	1 g	91,92												
136	Prova di trazione su provetta di reti o tralicci elettros ... . UNI EN ISO 6892-1:2009; D.M. 14.01.2008 - Per ogni prova	1 g	181,93												
137	Preparazione del campione di reti o tralicci elettrosaldati da sottoporsi a prove di laboratorio. - Per ogni campione	1 g	22,89												
138	<b>Opere provvisorie e di sicurezza</b>	2 g	4'107,19												
139	Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e con manicotto : lunghezza 20 m	2 g	1'003,98												
140	Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e con manicotto : lunghezza 10 m	1 g	401,60												
141	Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m)	1 g	2'424,69												
142	Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 p ... ione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio.	1 g	130,64												
143	Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con assorbit ... oraggio per impalcature e moschettone - Lunghez...	1 g	146,28												

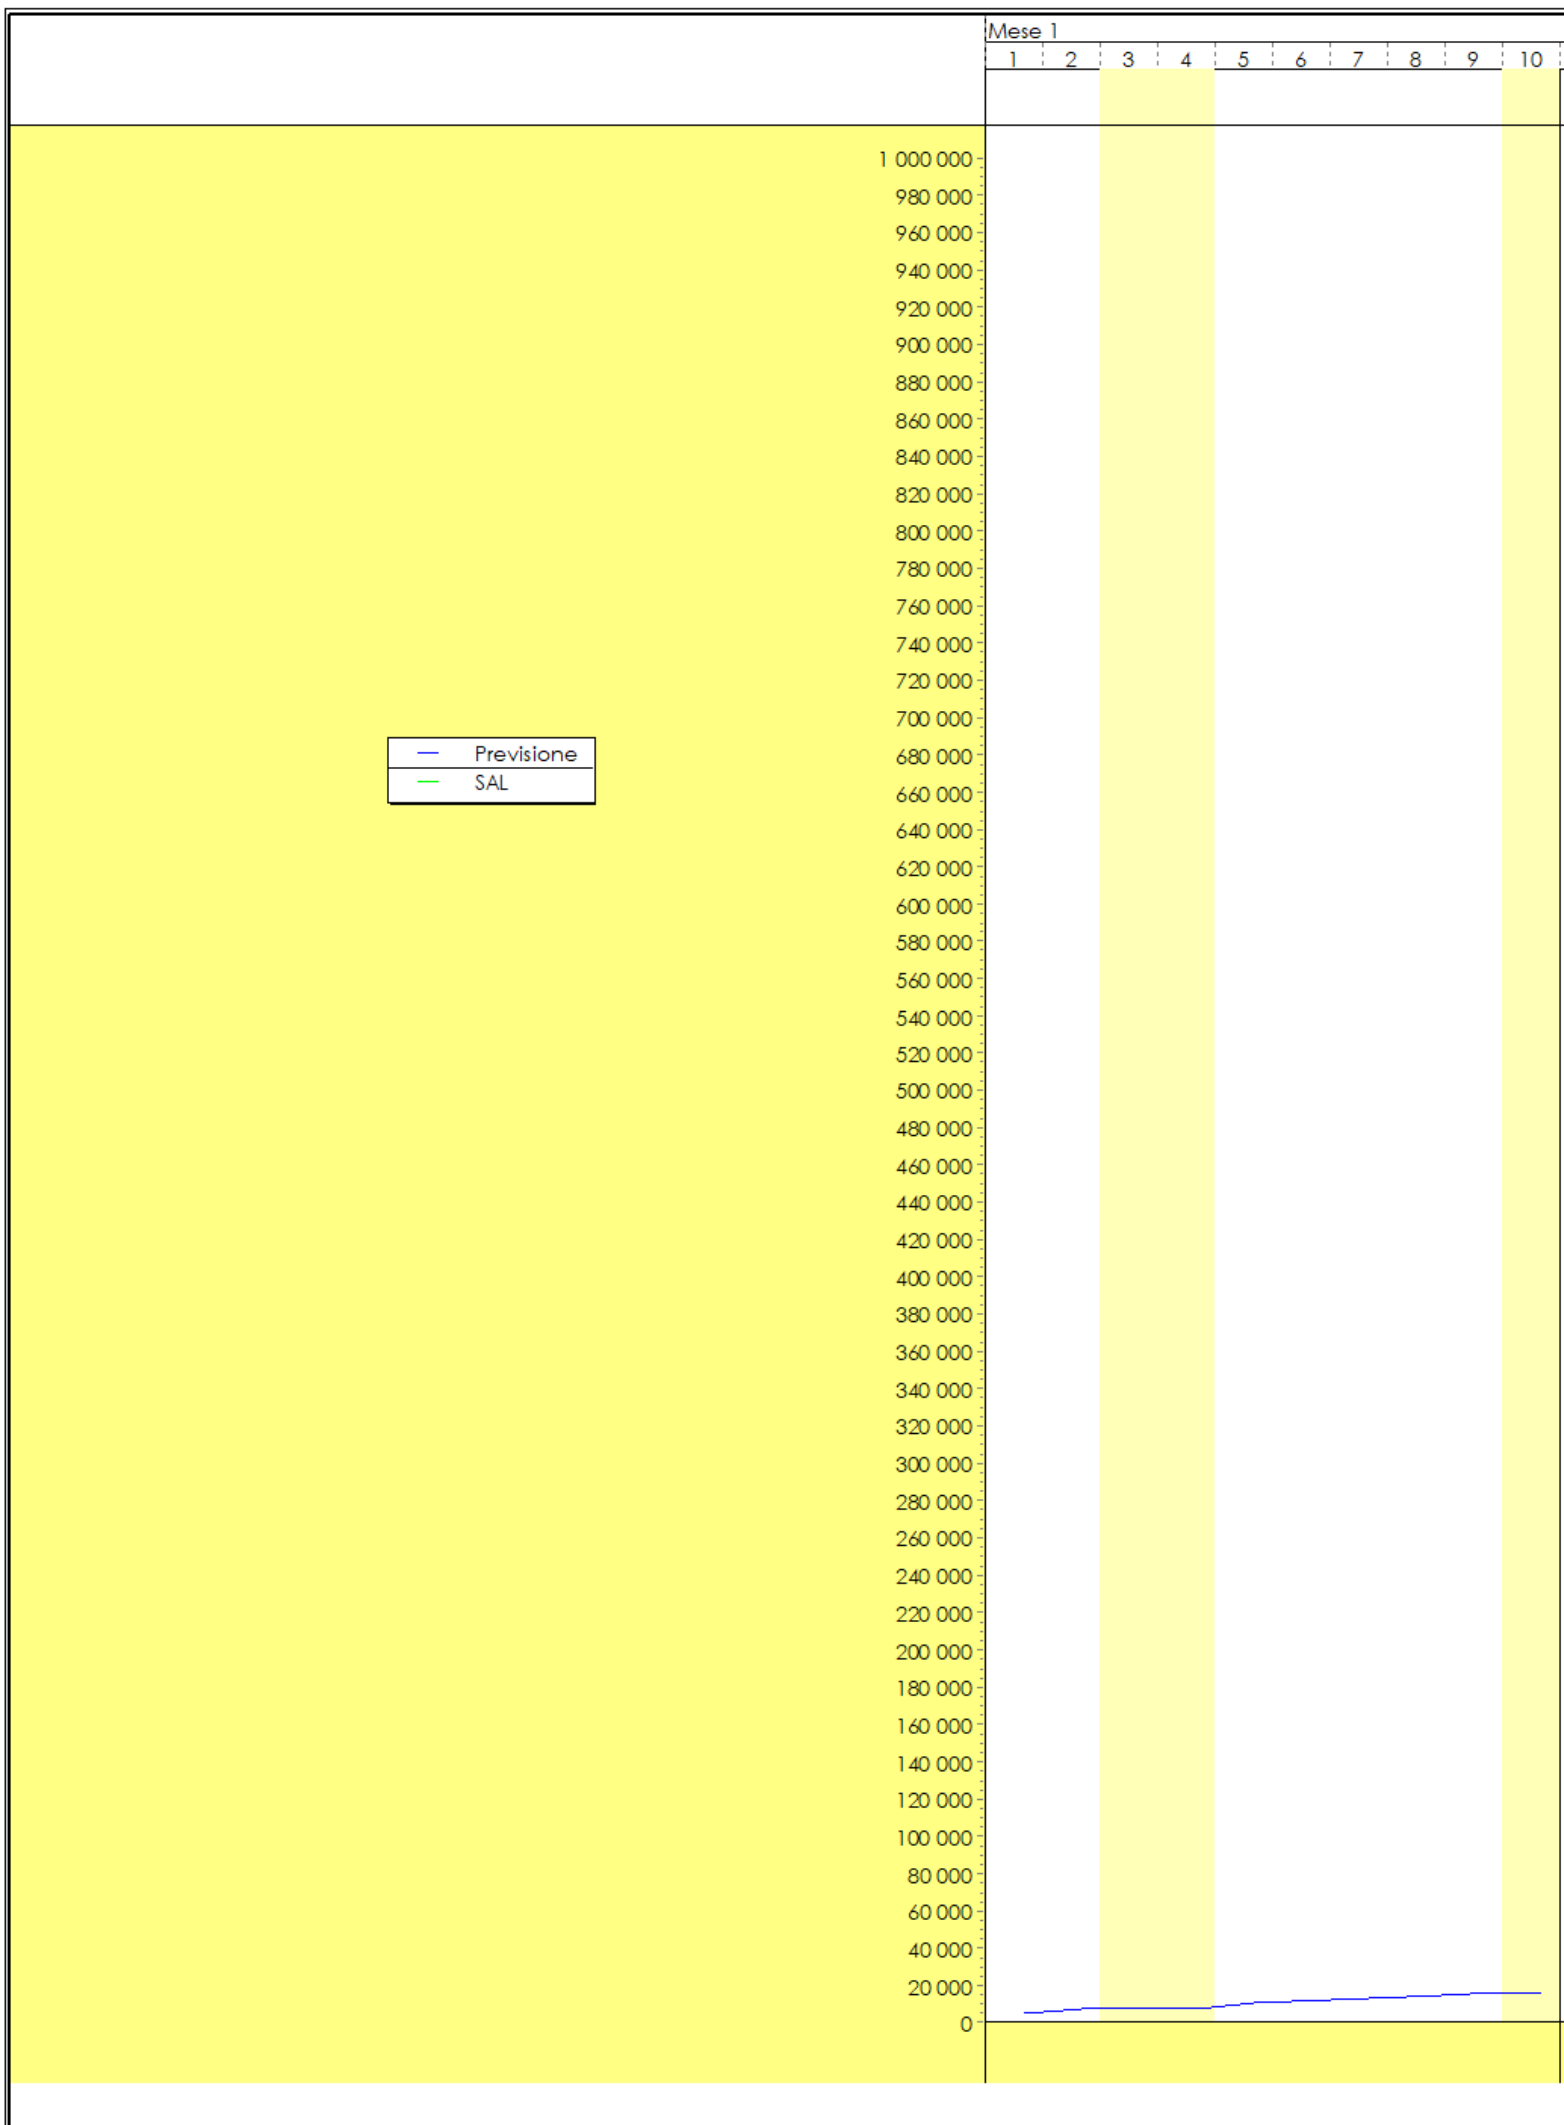



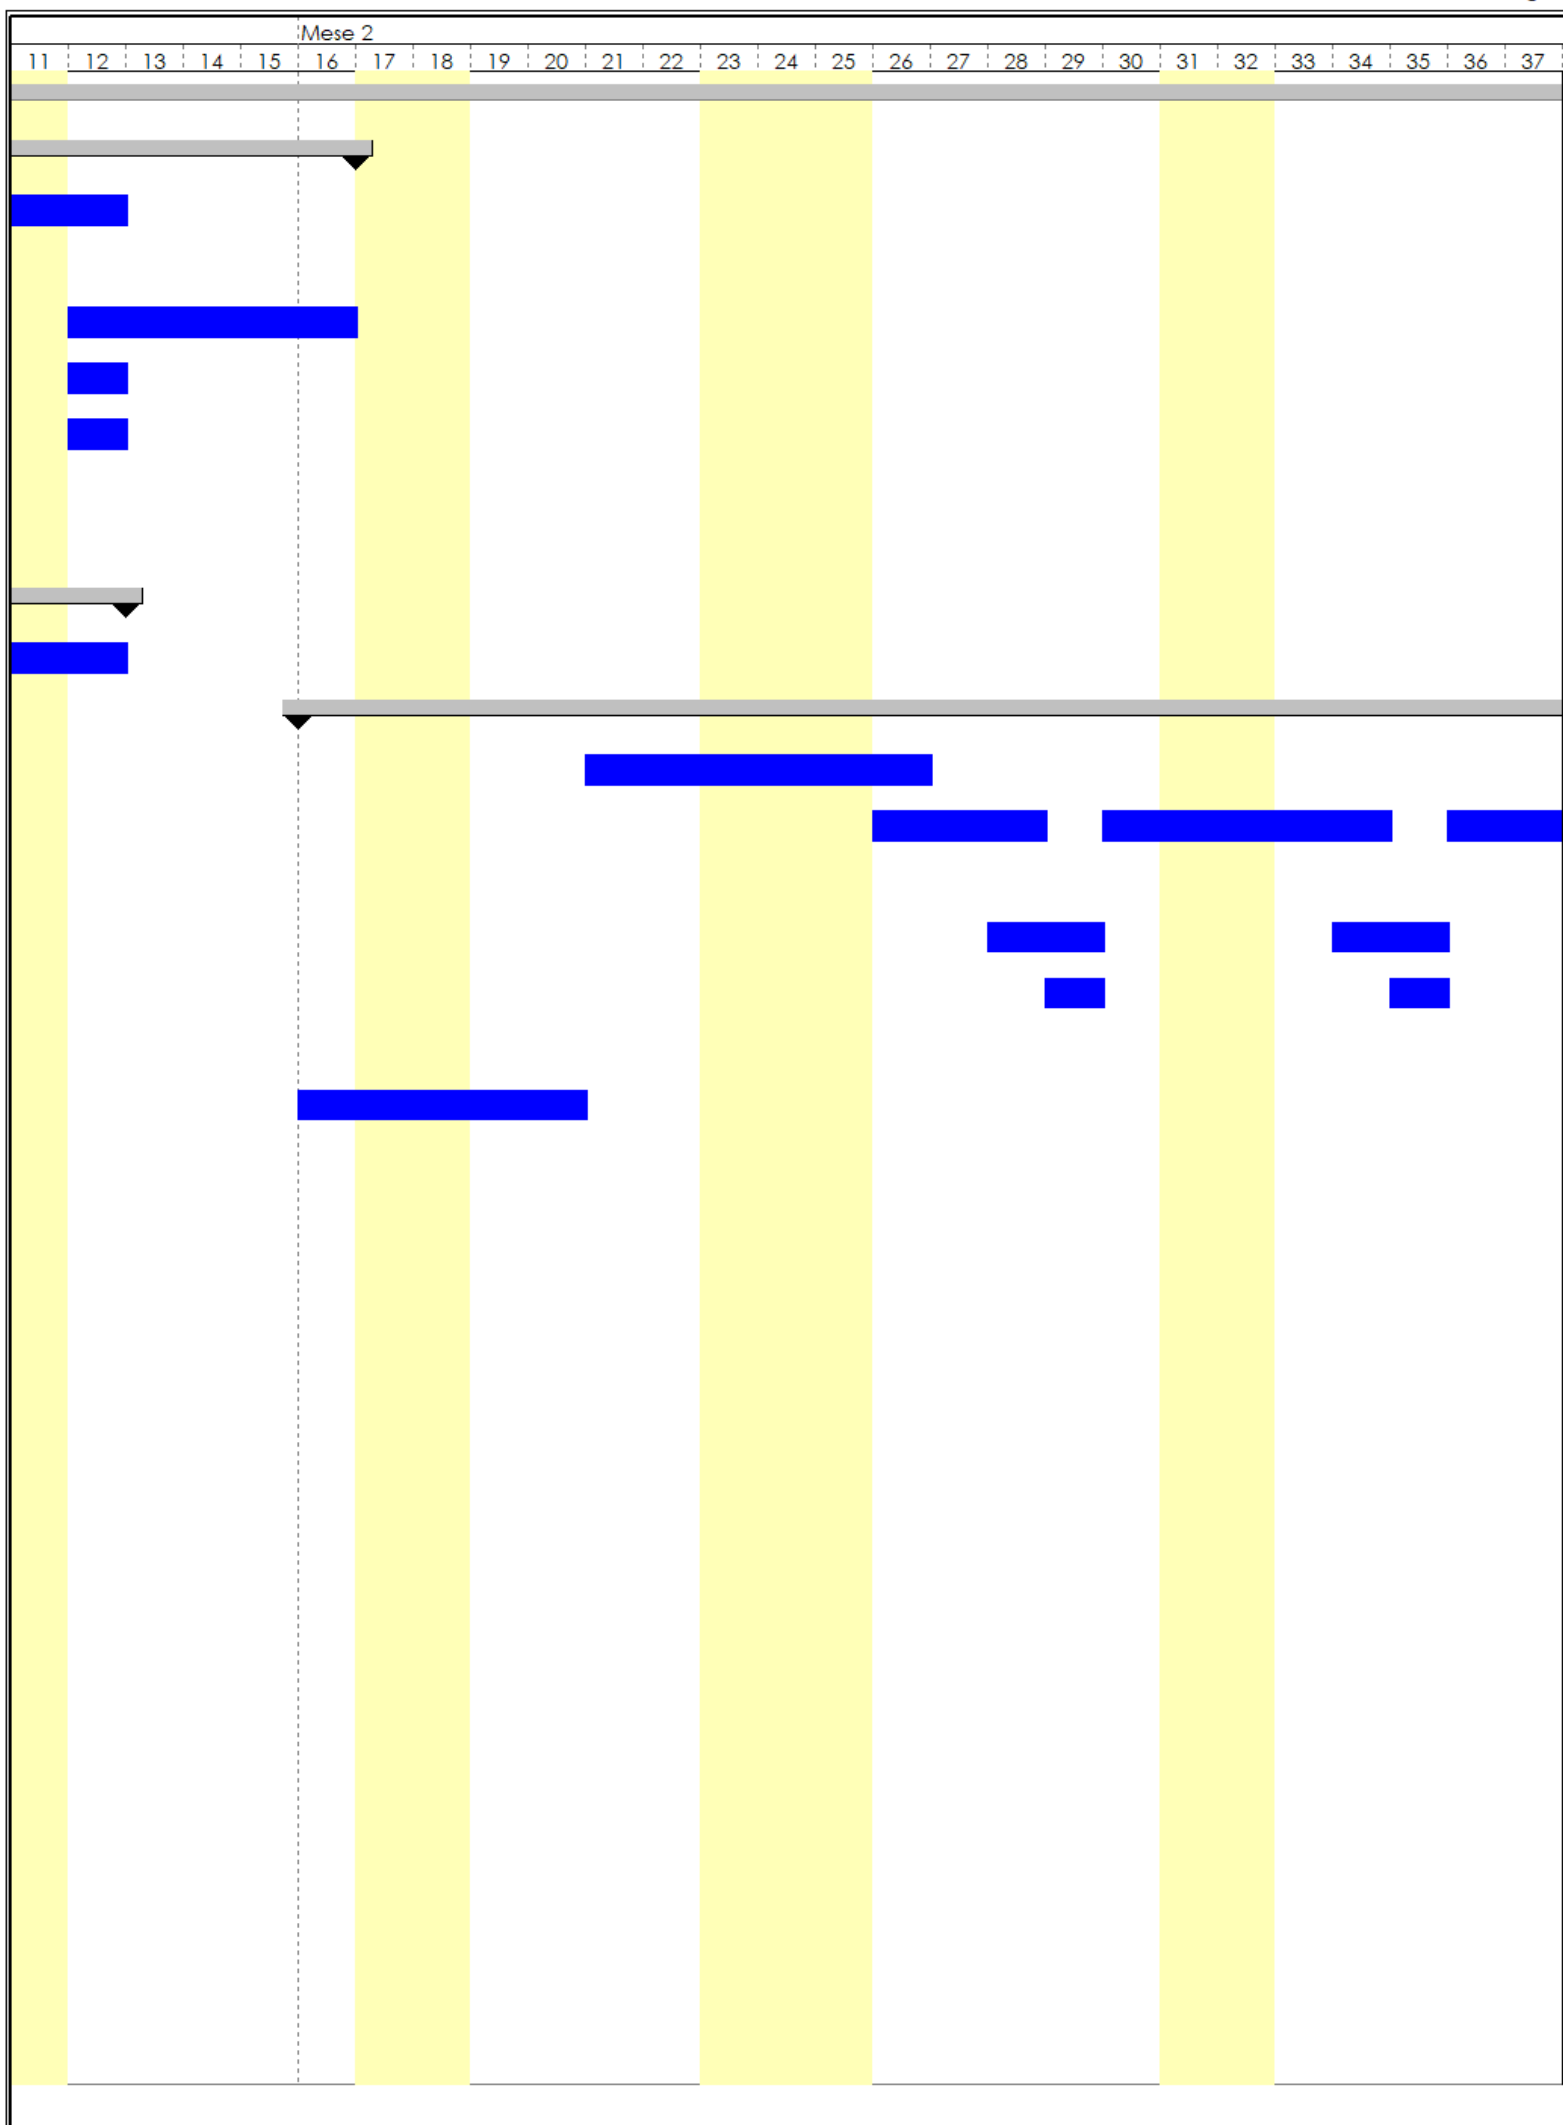

Mese 2

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Mese 2


Mese 2

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----




Mese 2

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----





Mese 3

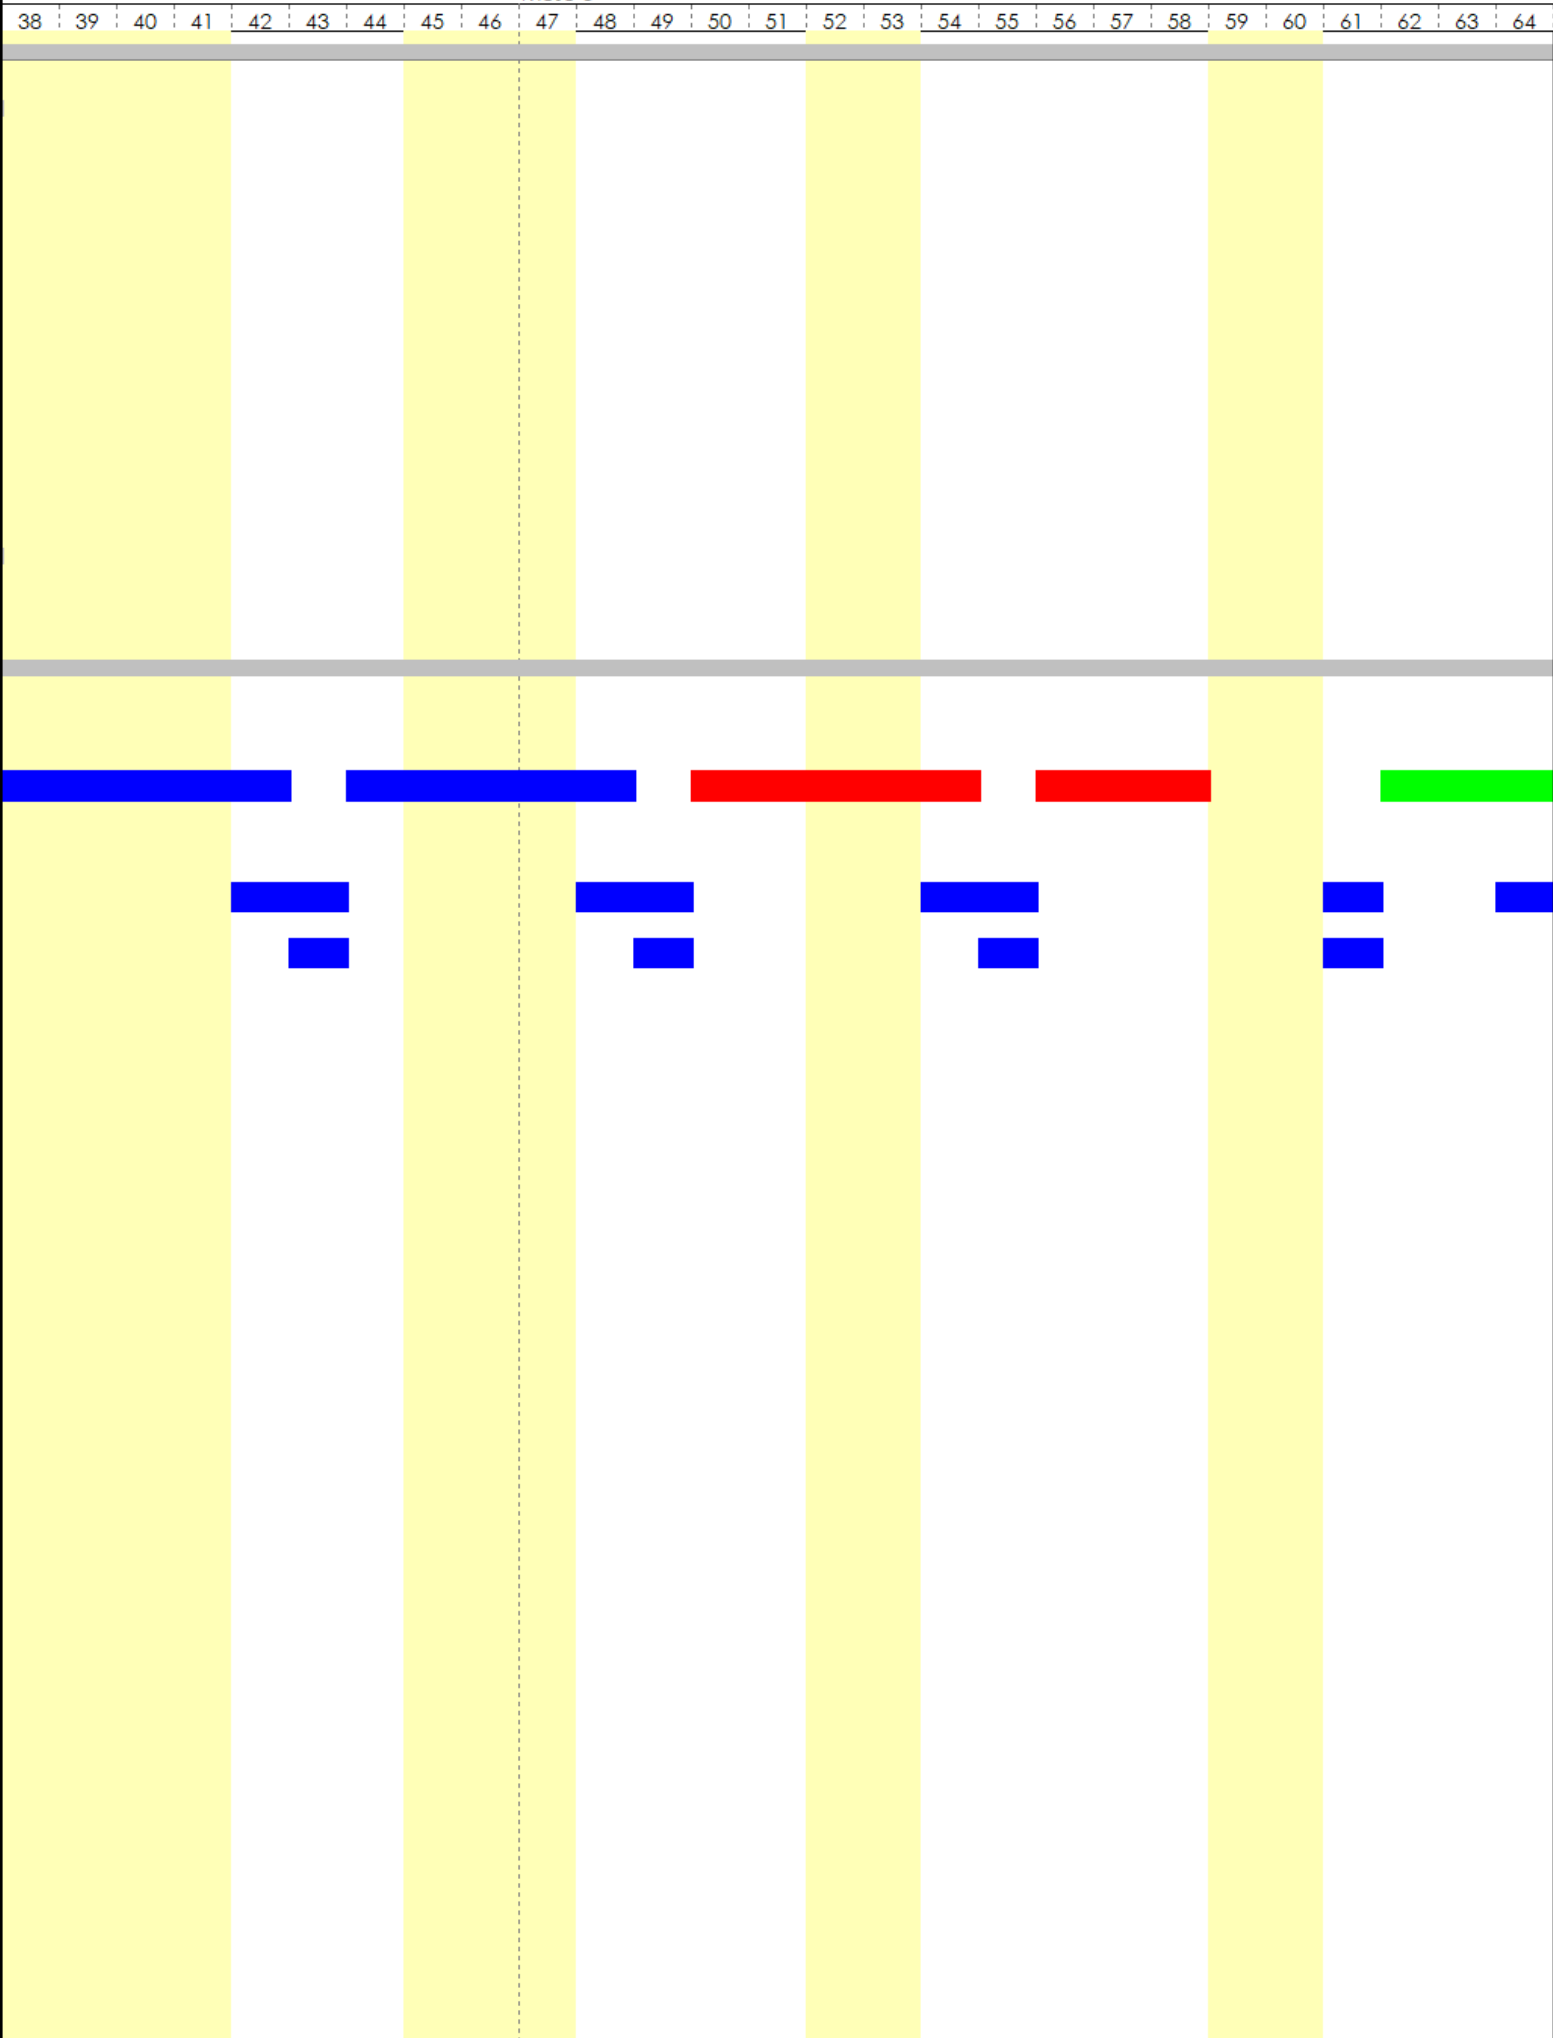

Mese 3

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Mese 3

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Mese 3

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----




Mese 3

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----





Mese 4

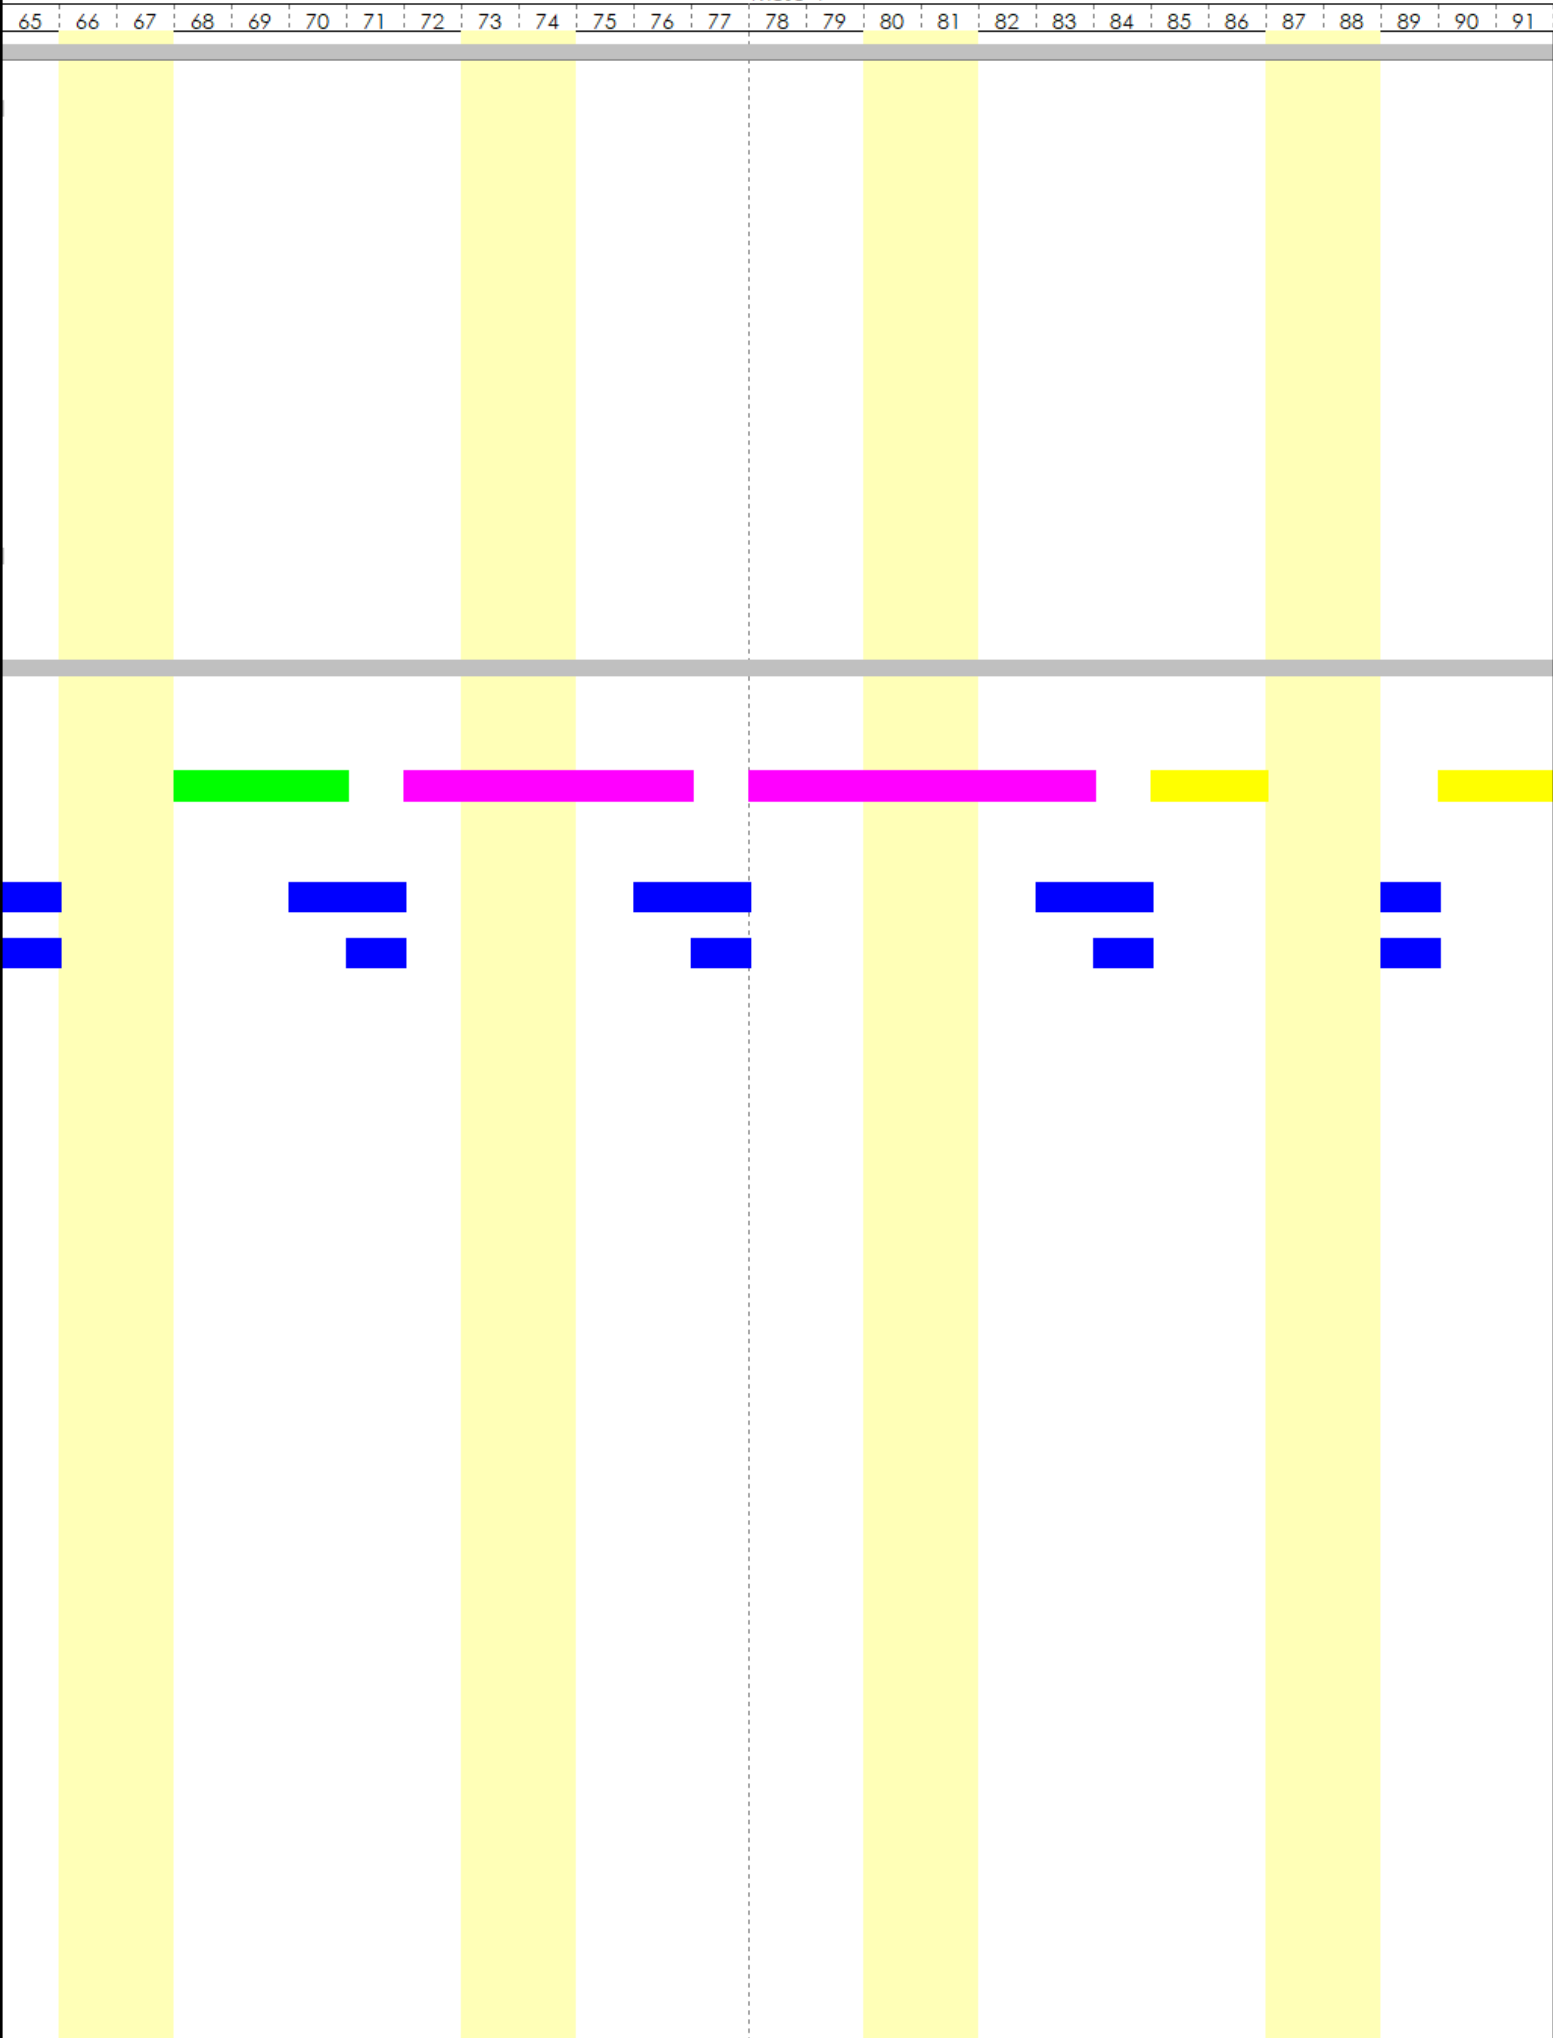

Mese 4

65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91

Mese 4

65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91

[illegible]


Mese 4

65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----





Mese 5

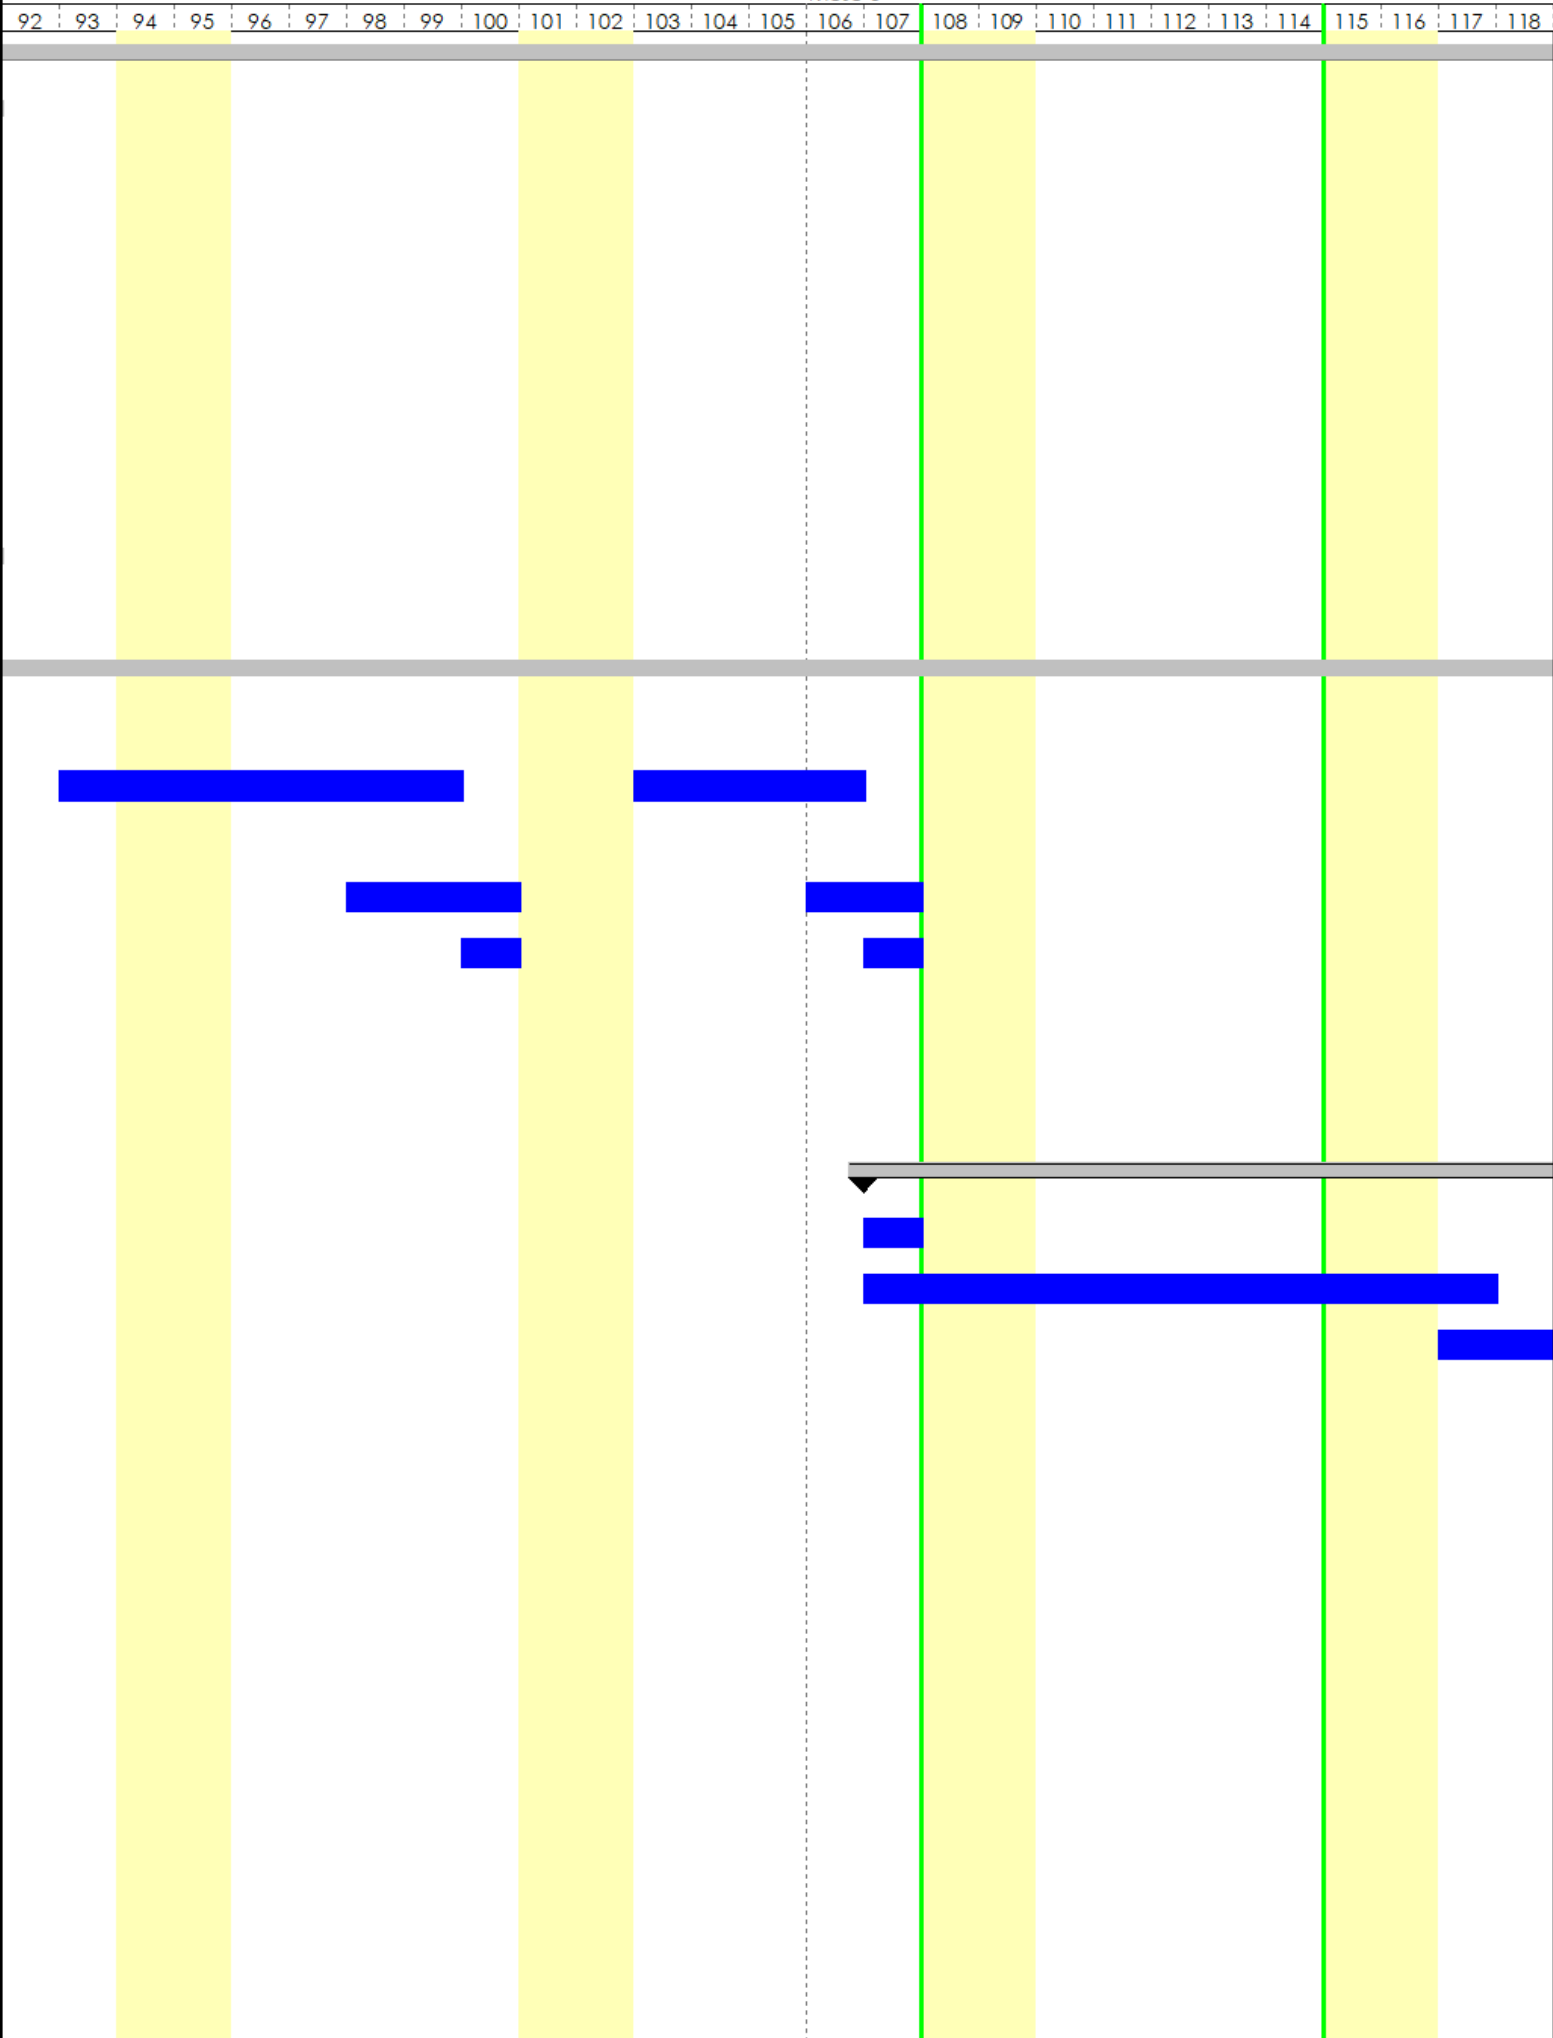

Mese 5


92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118

Mese 5

92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118

[illegible]


Mese 5

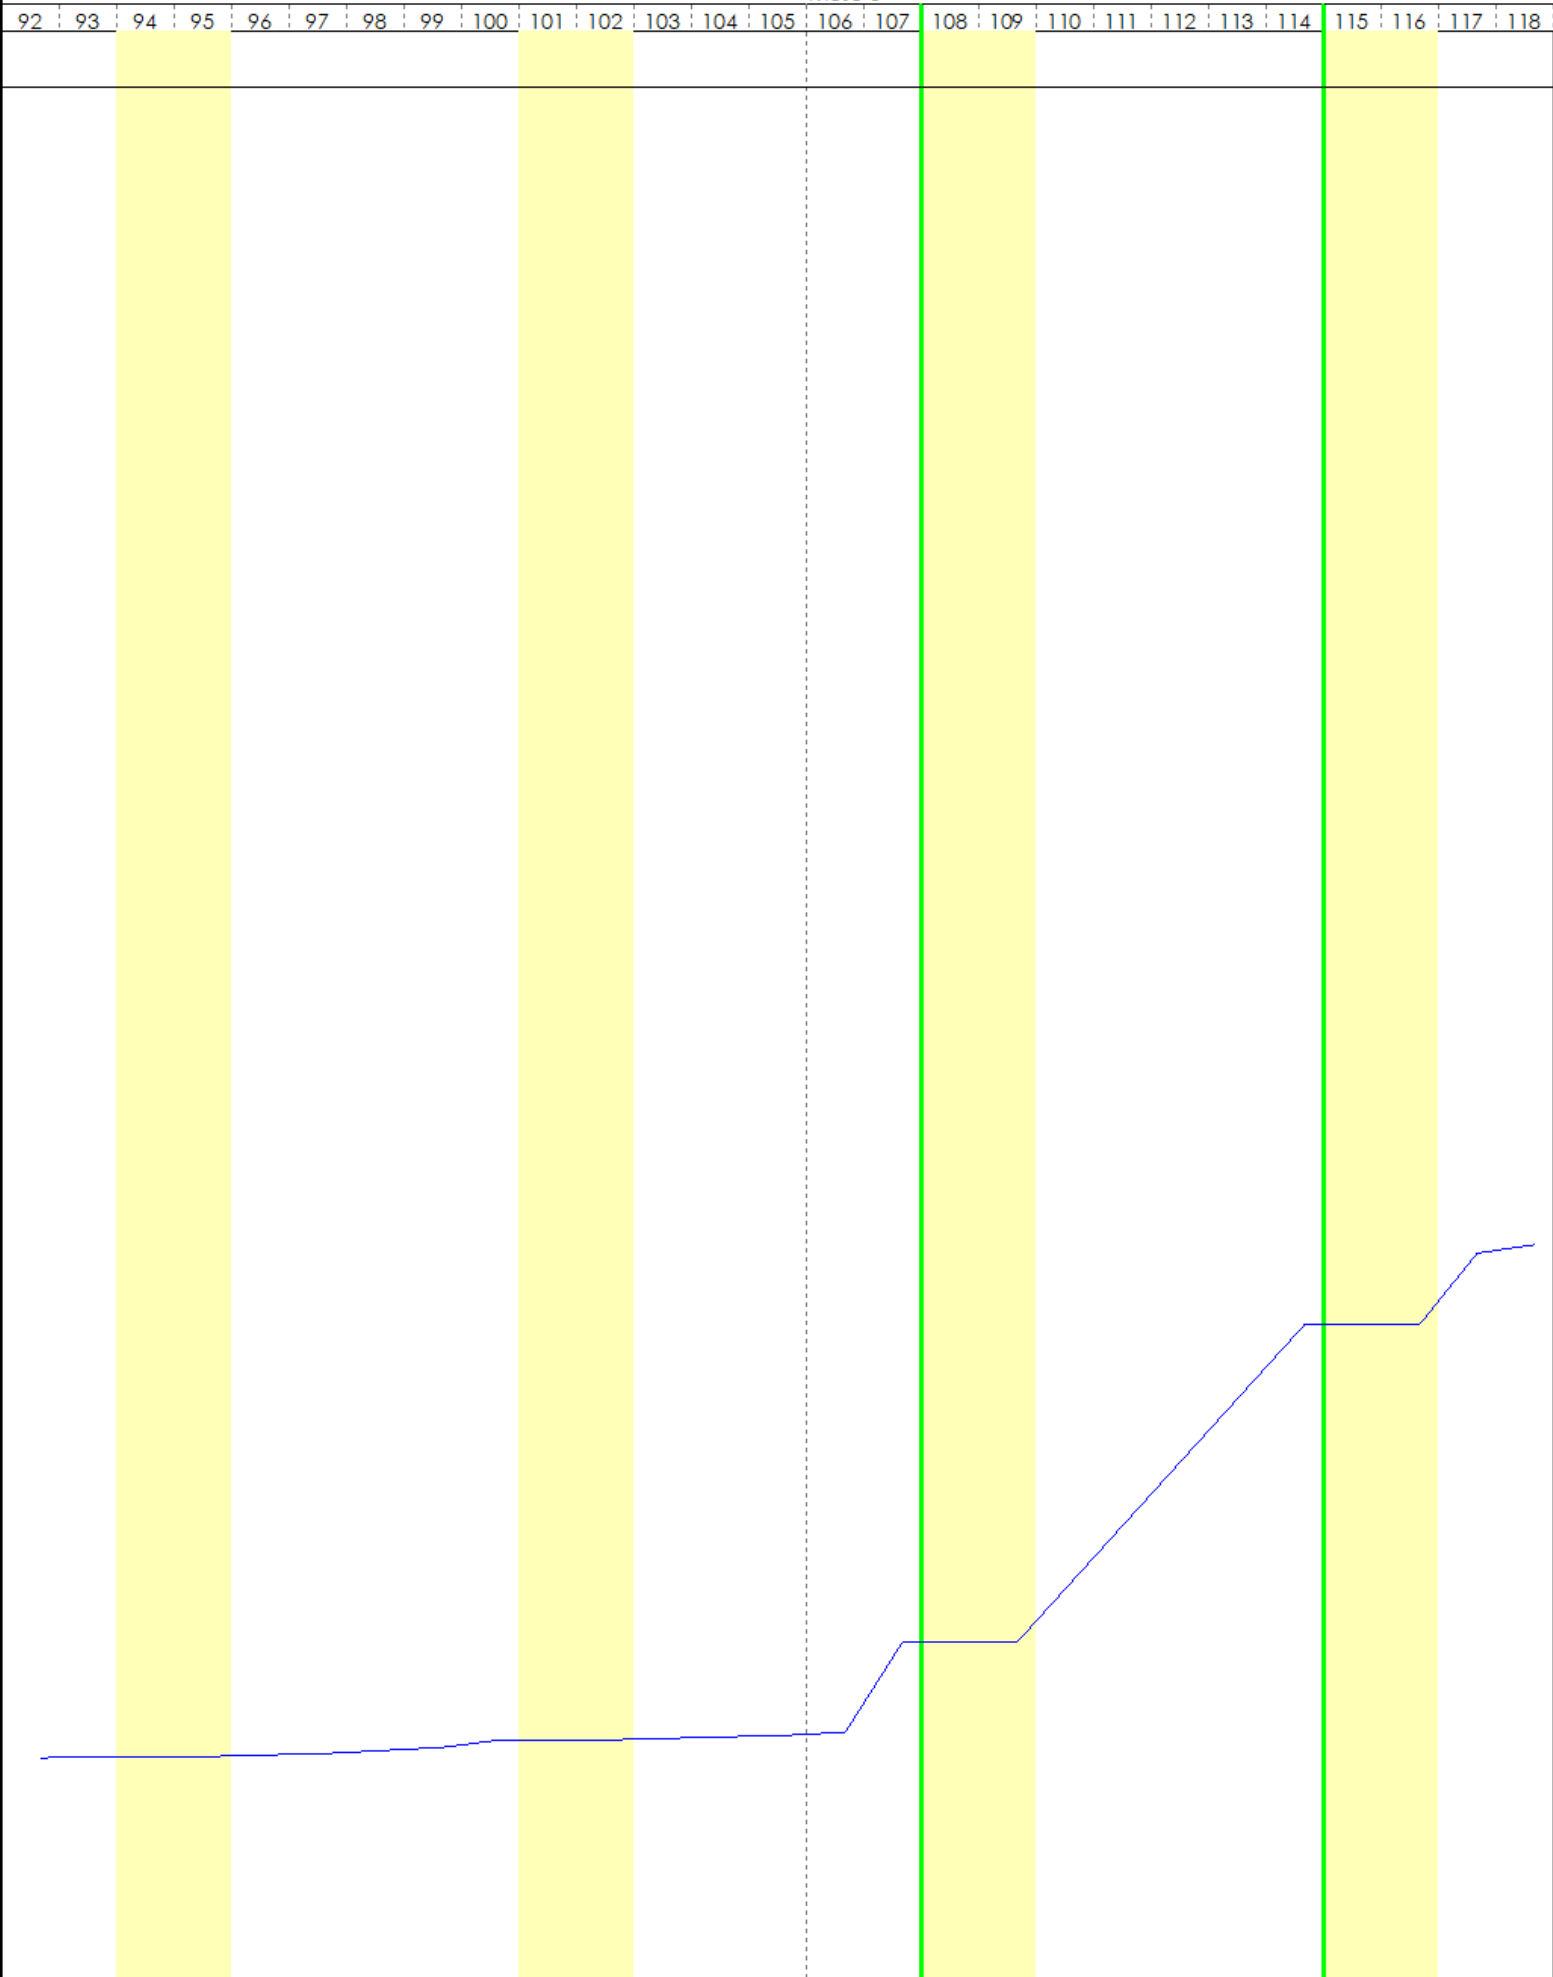



Mese 6

119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

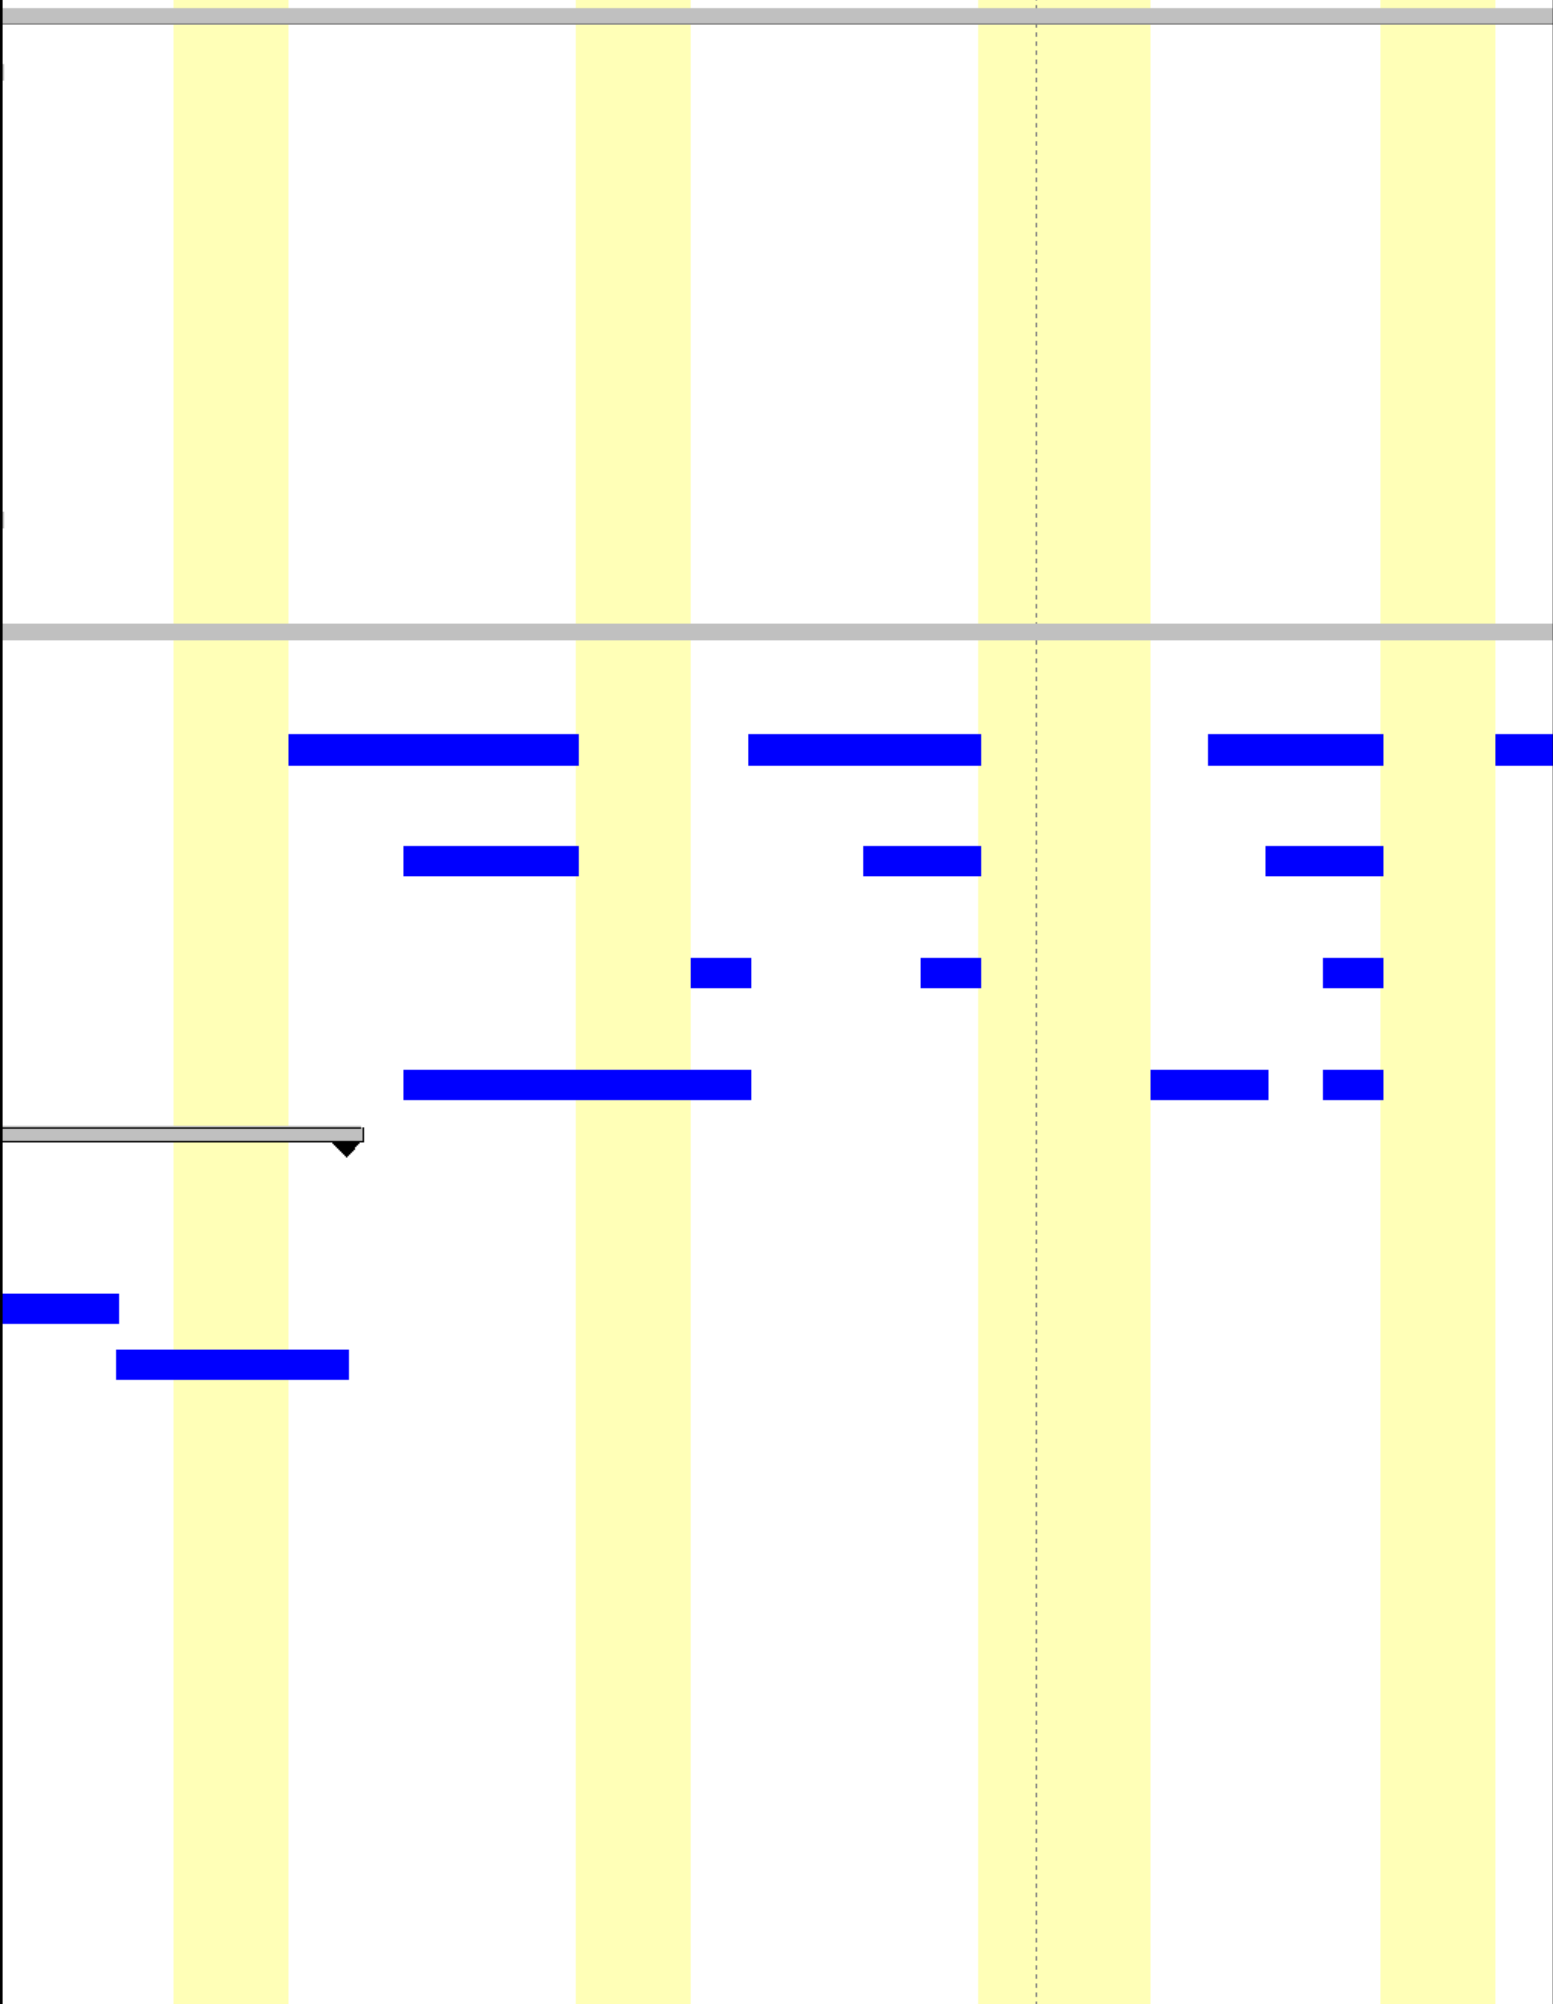

Mese 6

119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Mese 6

119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]


Mese 6

119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Mese 7

146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

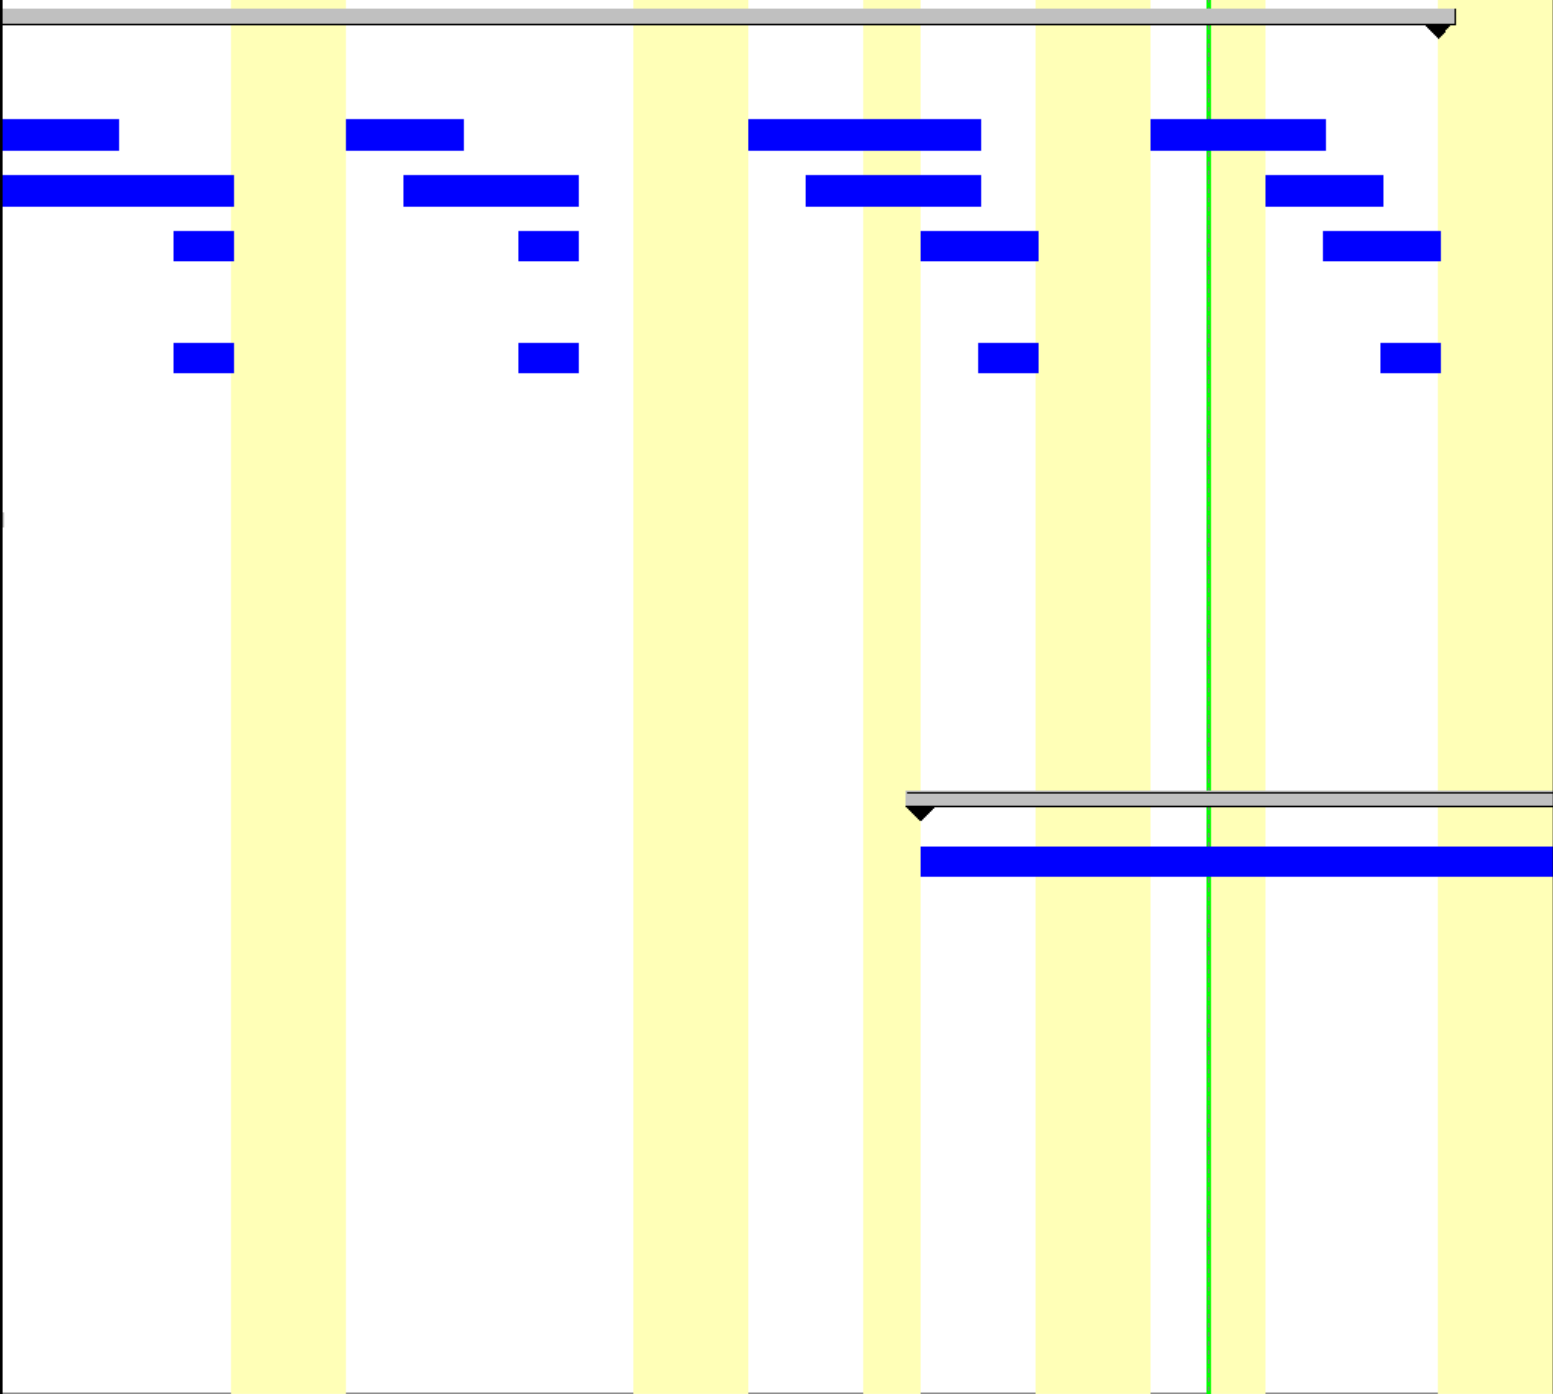

Mese 7

146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Mese 7

146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Mese 7

146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----




Mese 7

146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Mese 8

173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

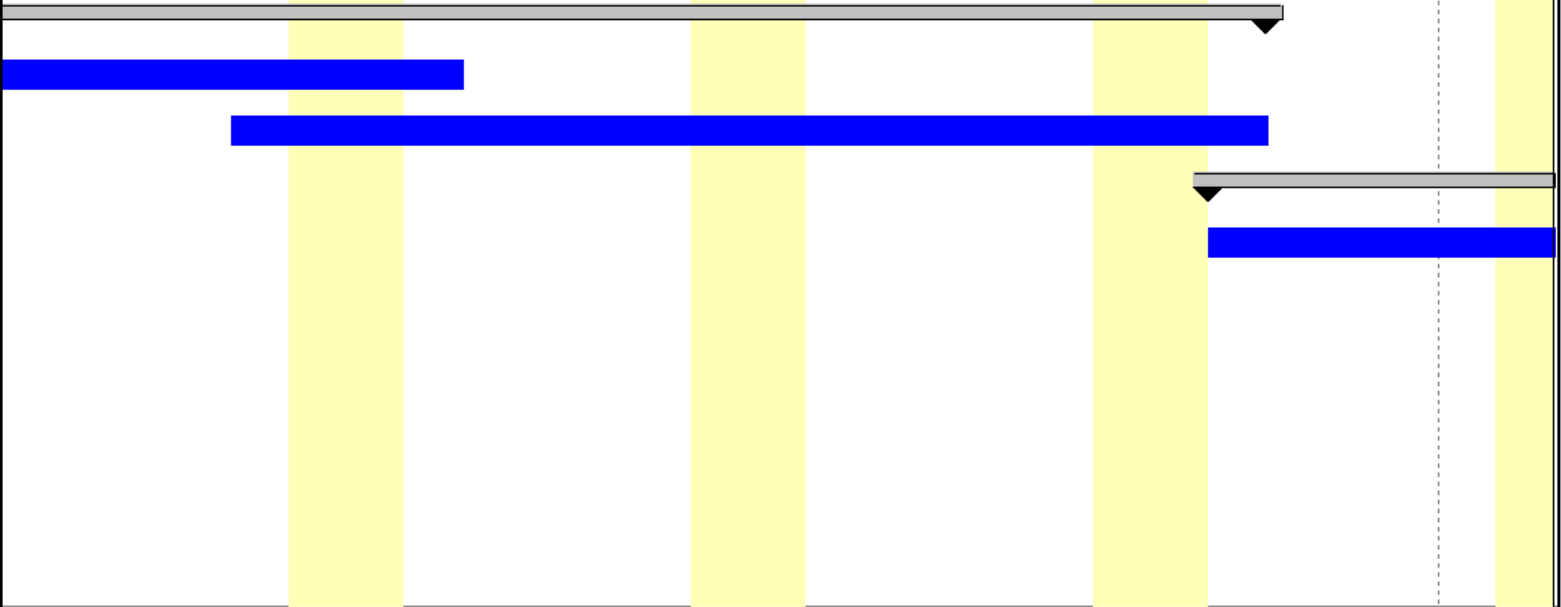

Mese 8

173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Mese 8

173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

COMMITTENTE: Comune di Lampedusa e Linosa

Mese 8

173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



[illegible]




200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226

200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Mese 9

227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

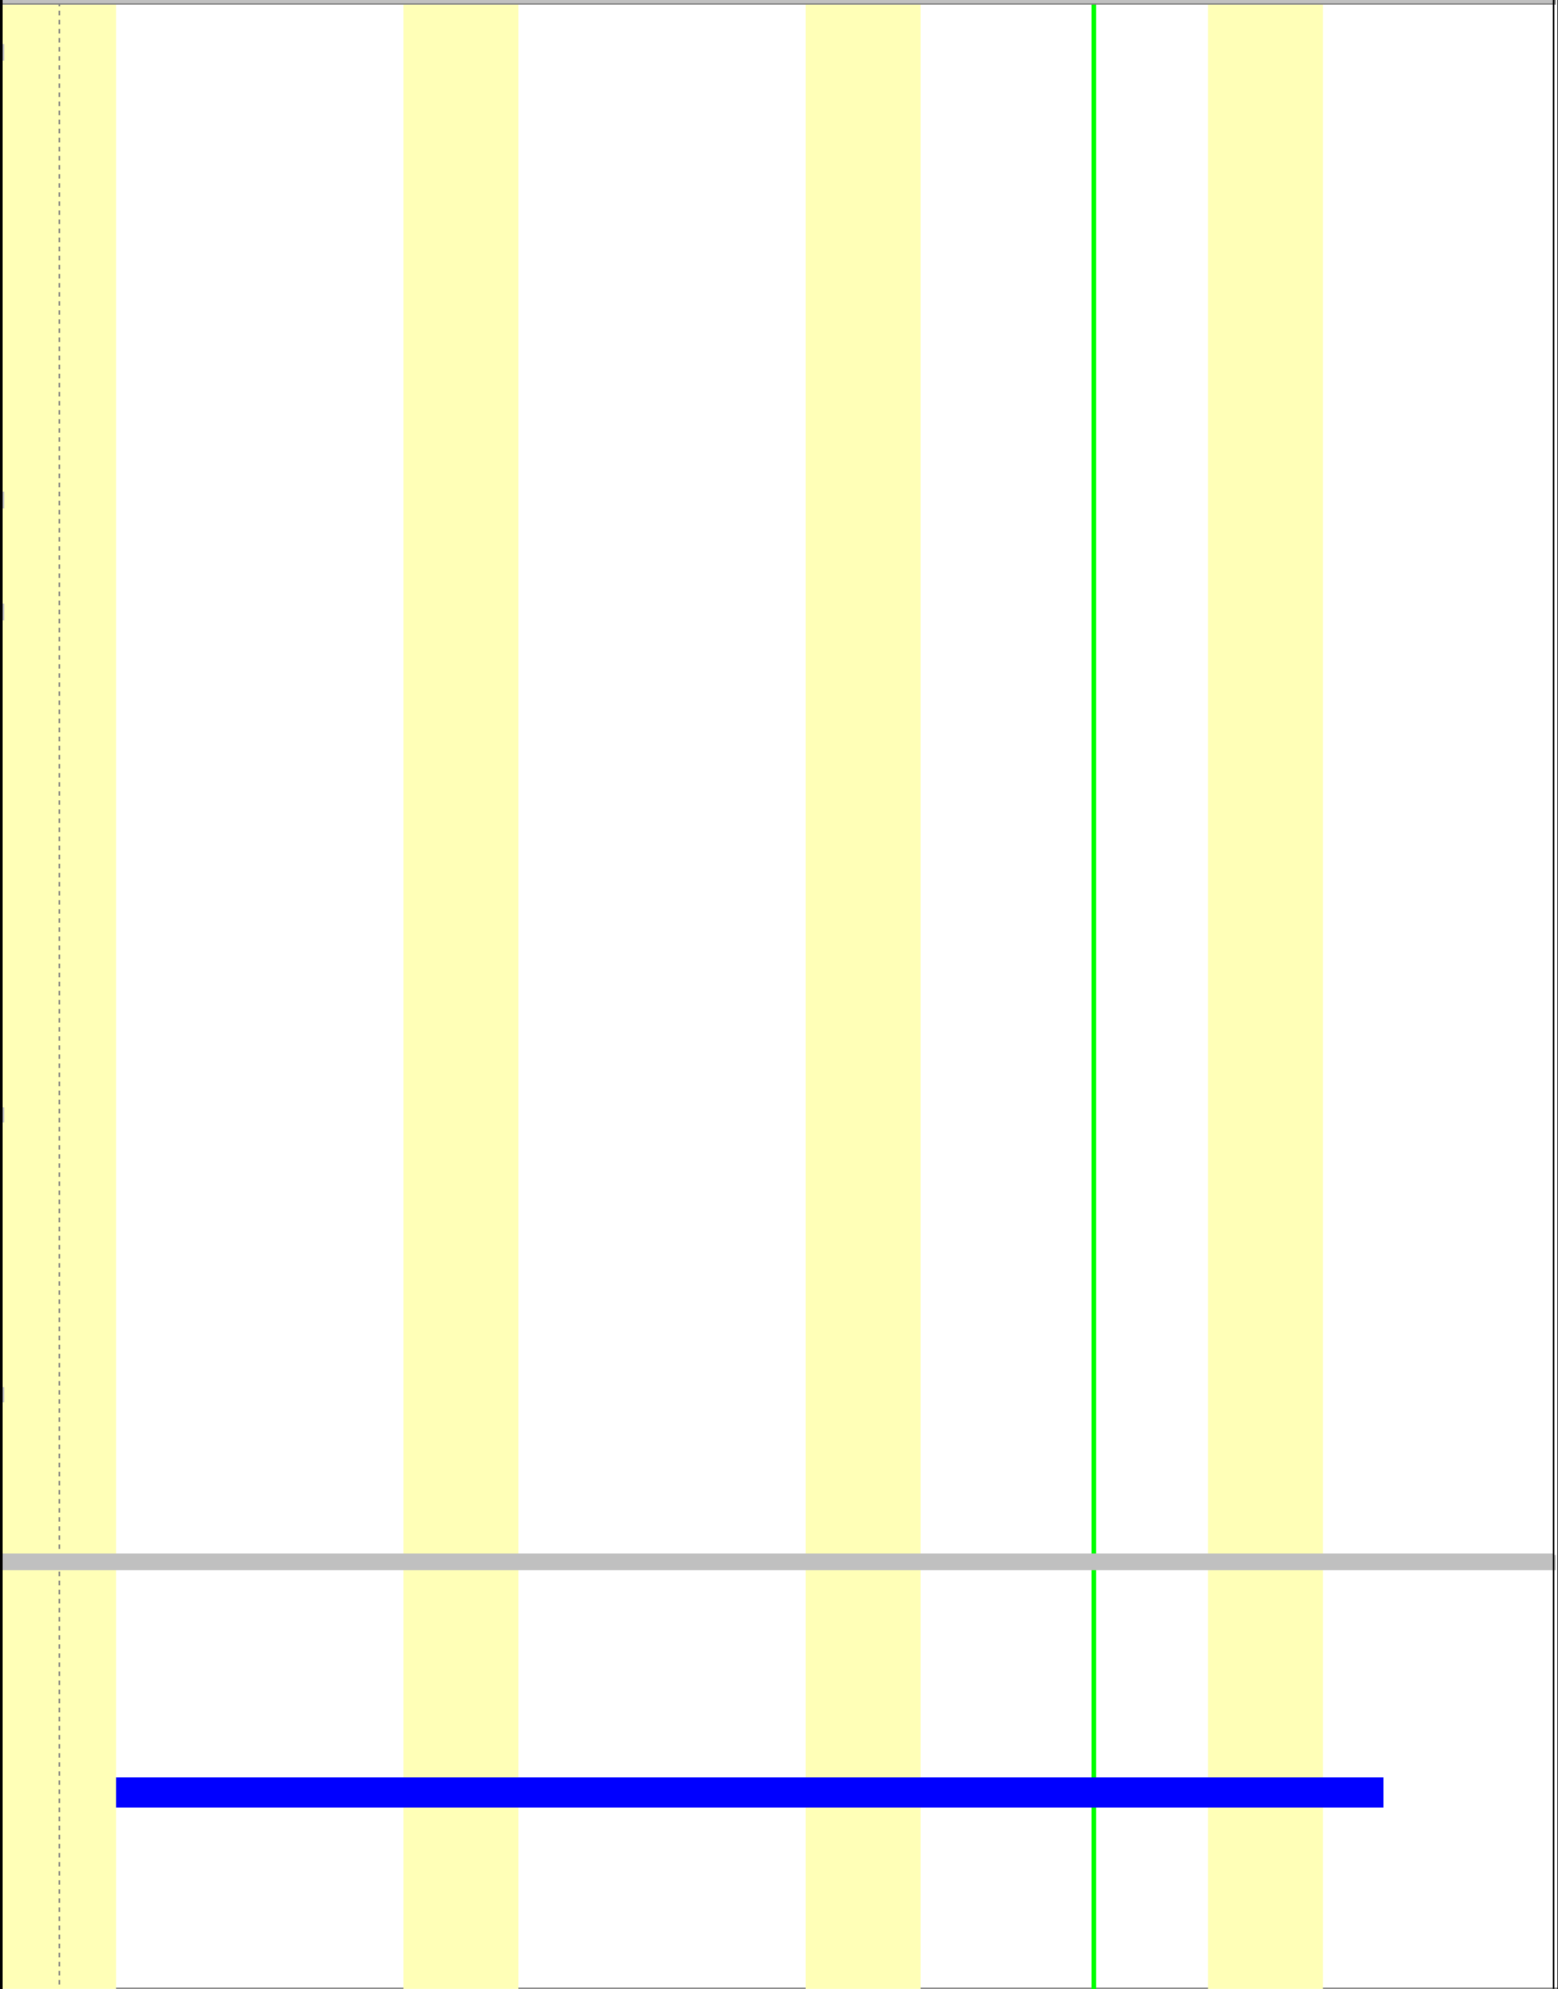

Mese 9

227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Mese 9

227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Mese 9

227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Mese 9


227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----




Mese 10																											
254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	

Mese 10

254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

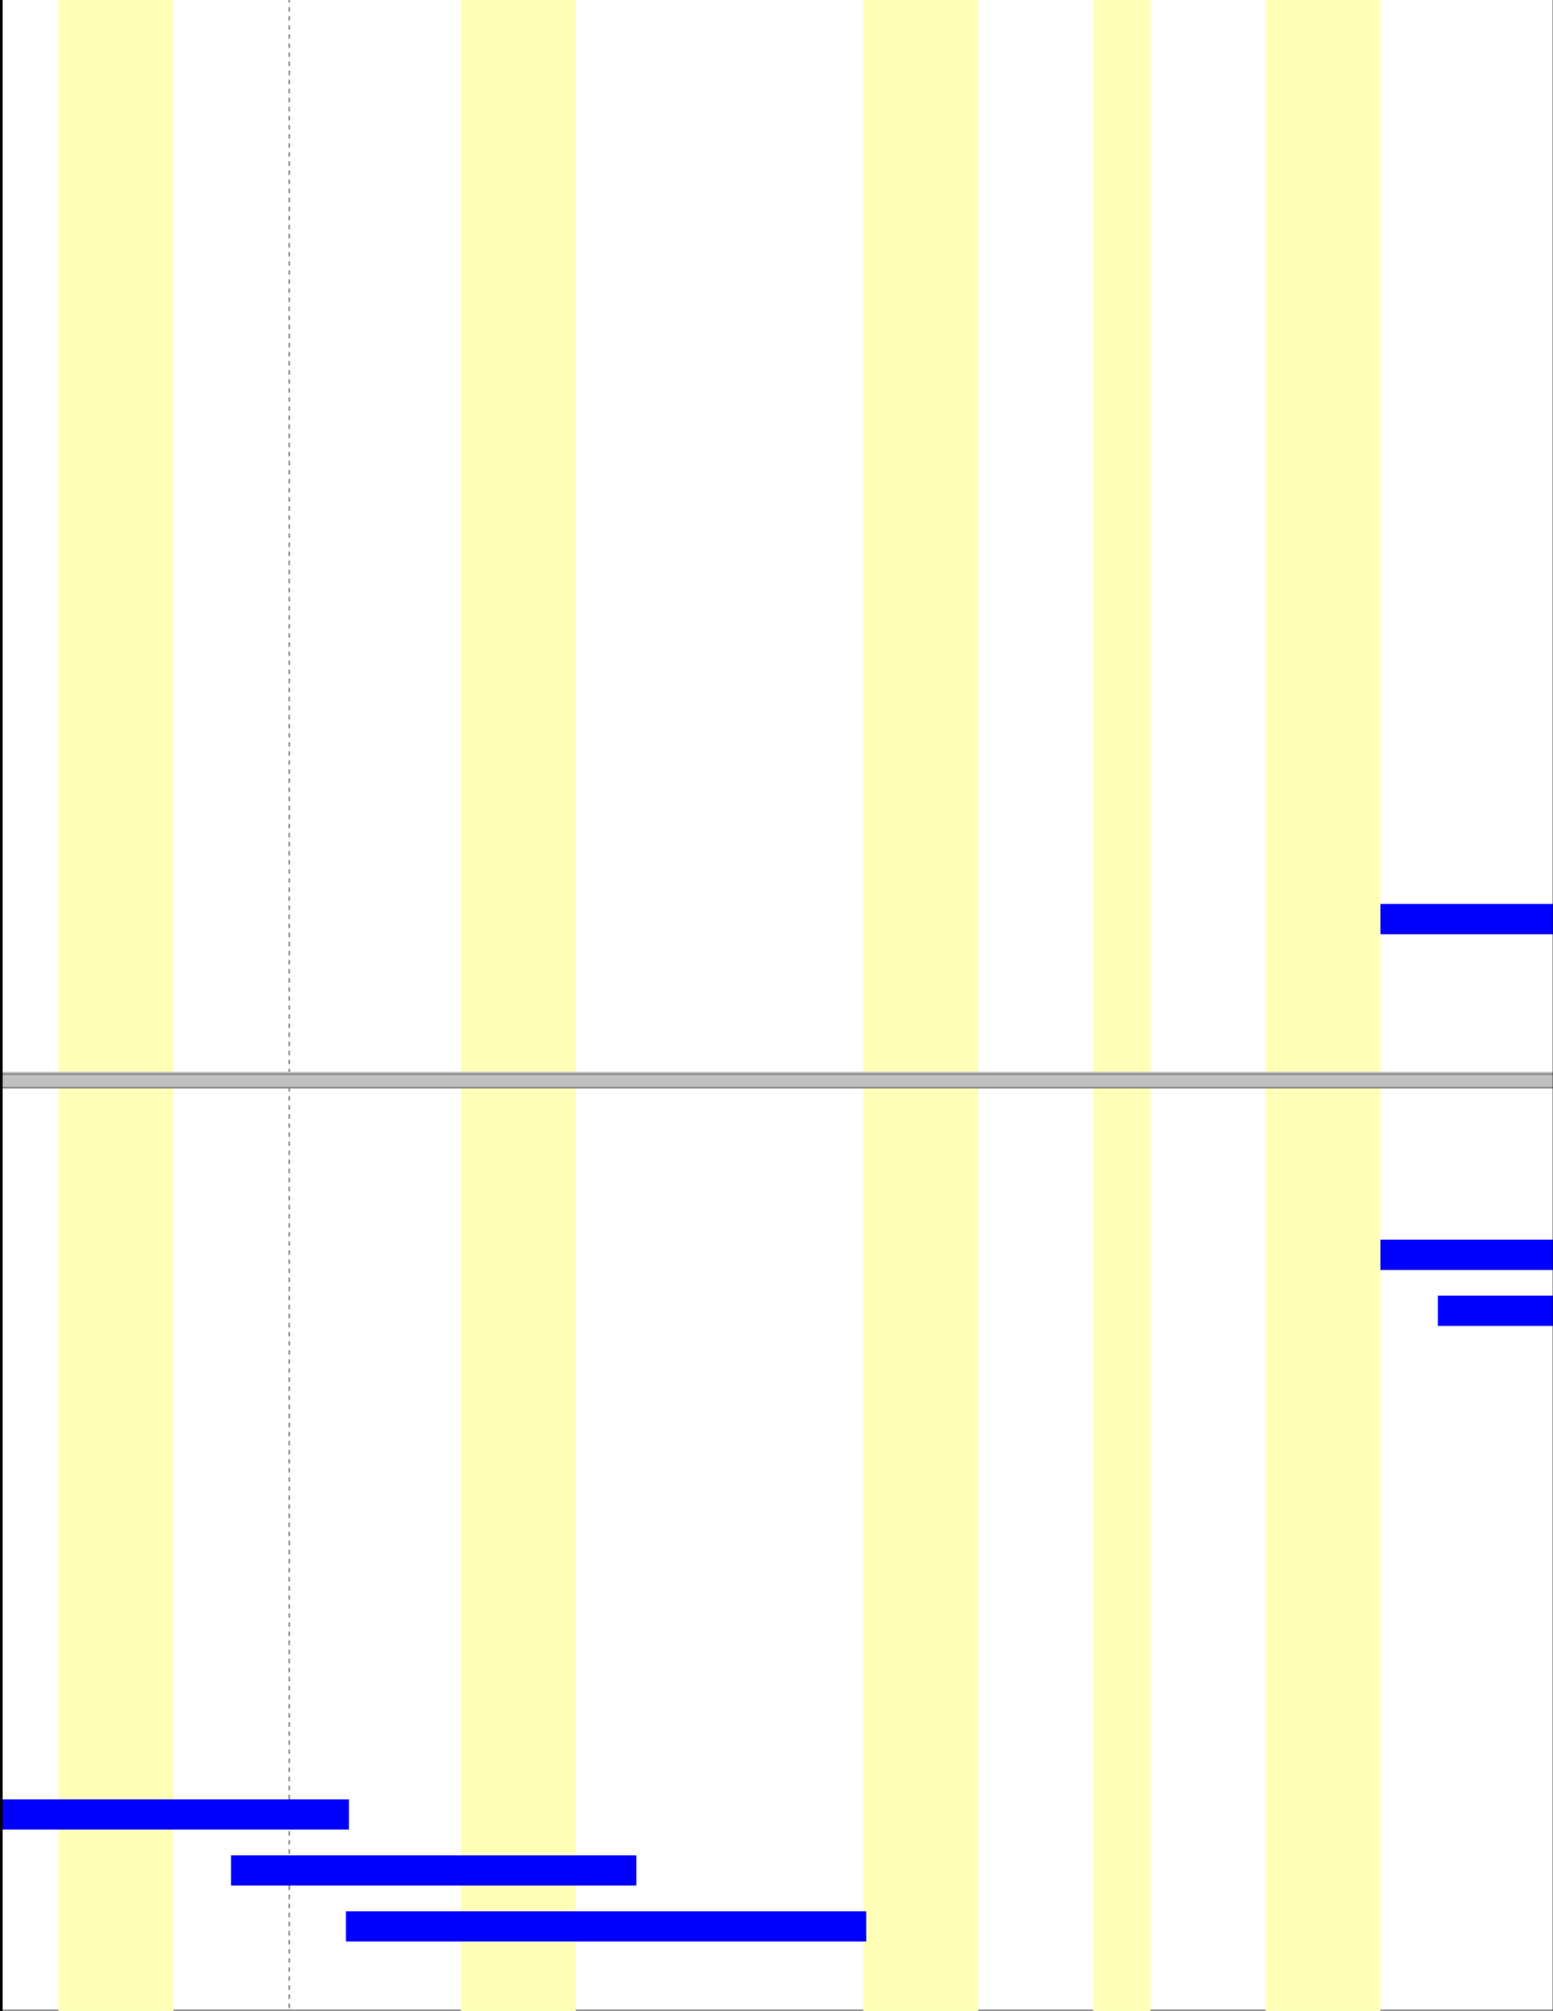

Mese 10

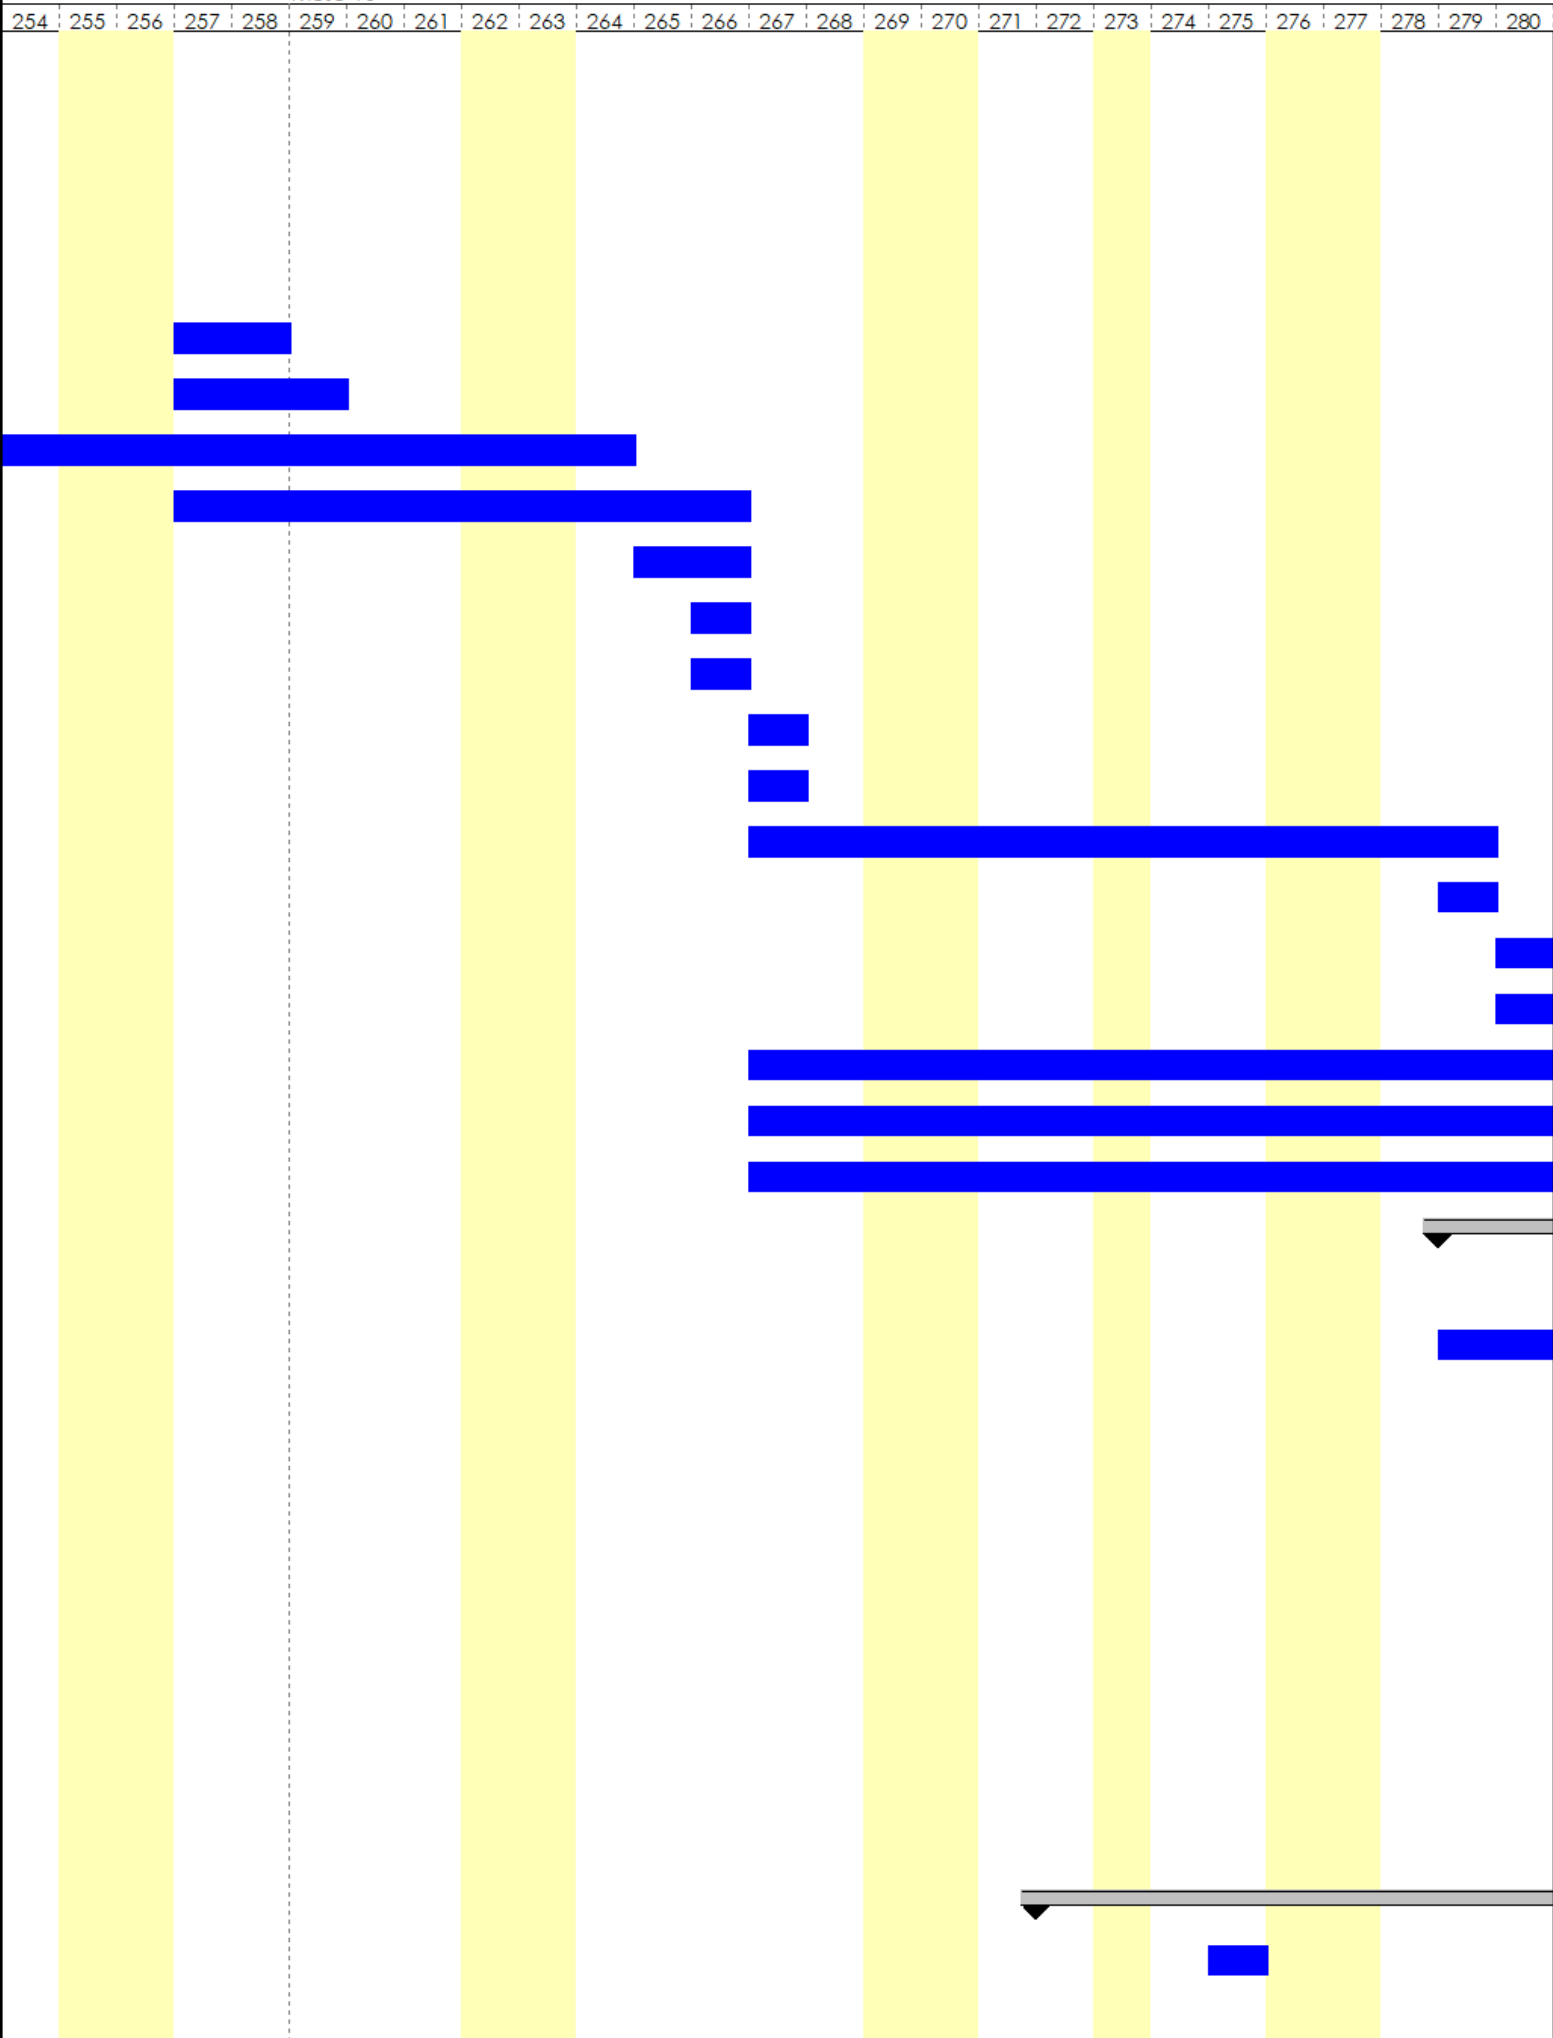

[illegible]

Mese 10

254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----




Mese 11

281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Mese 11


281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

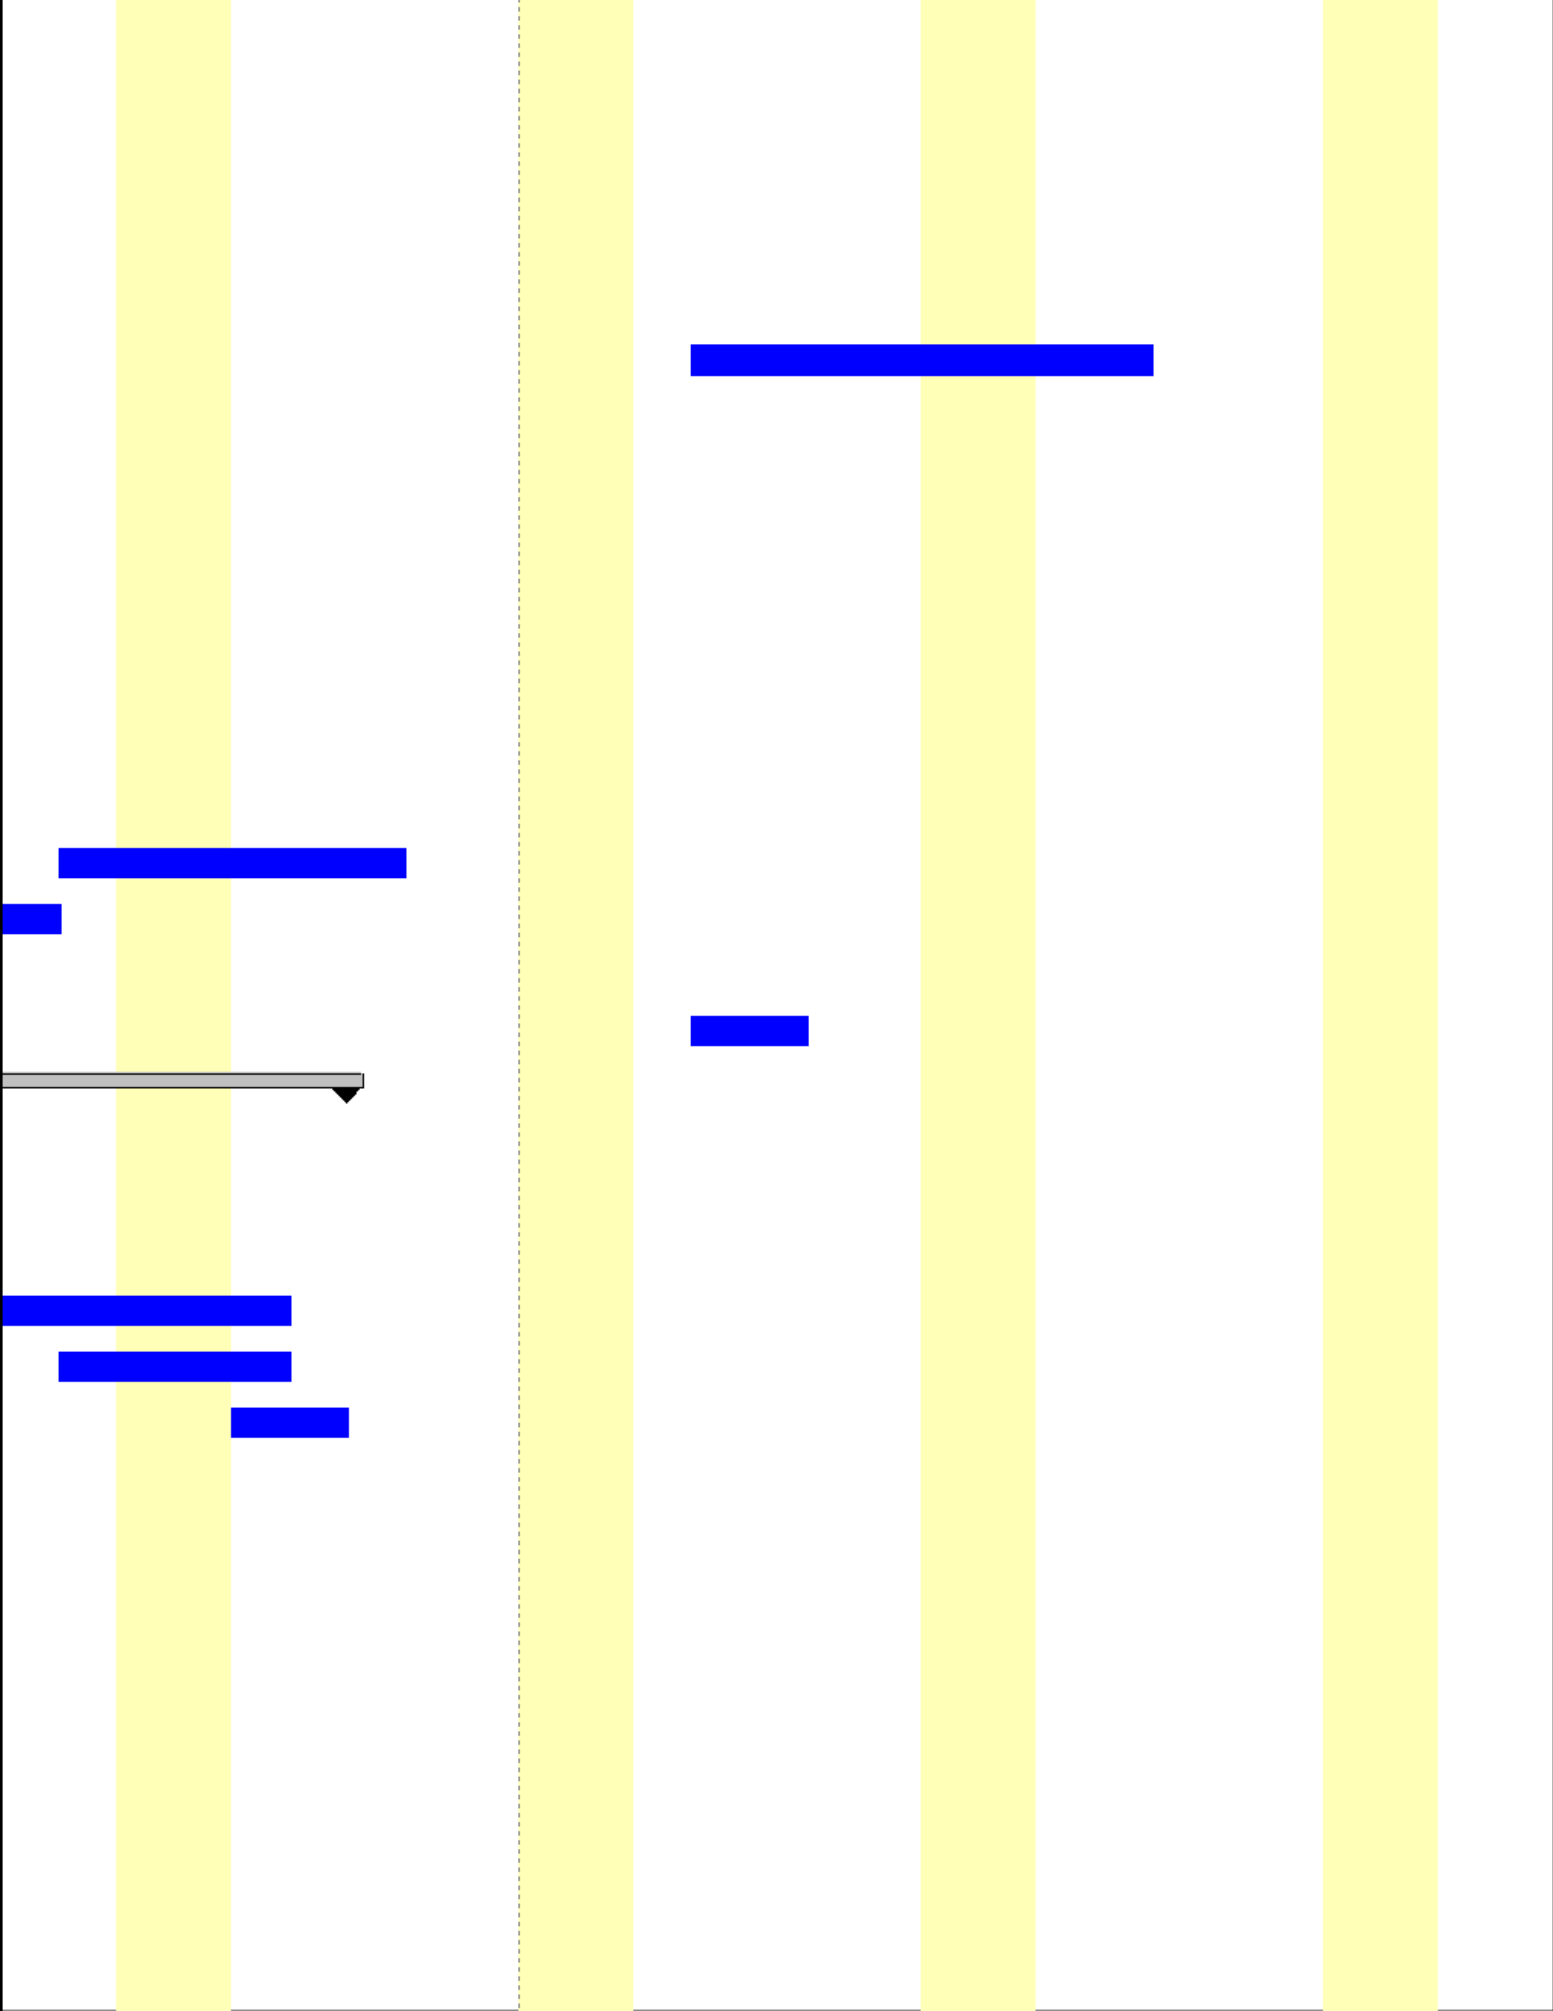



Mese 11

281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

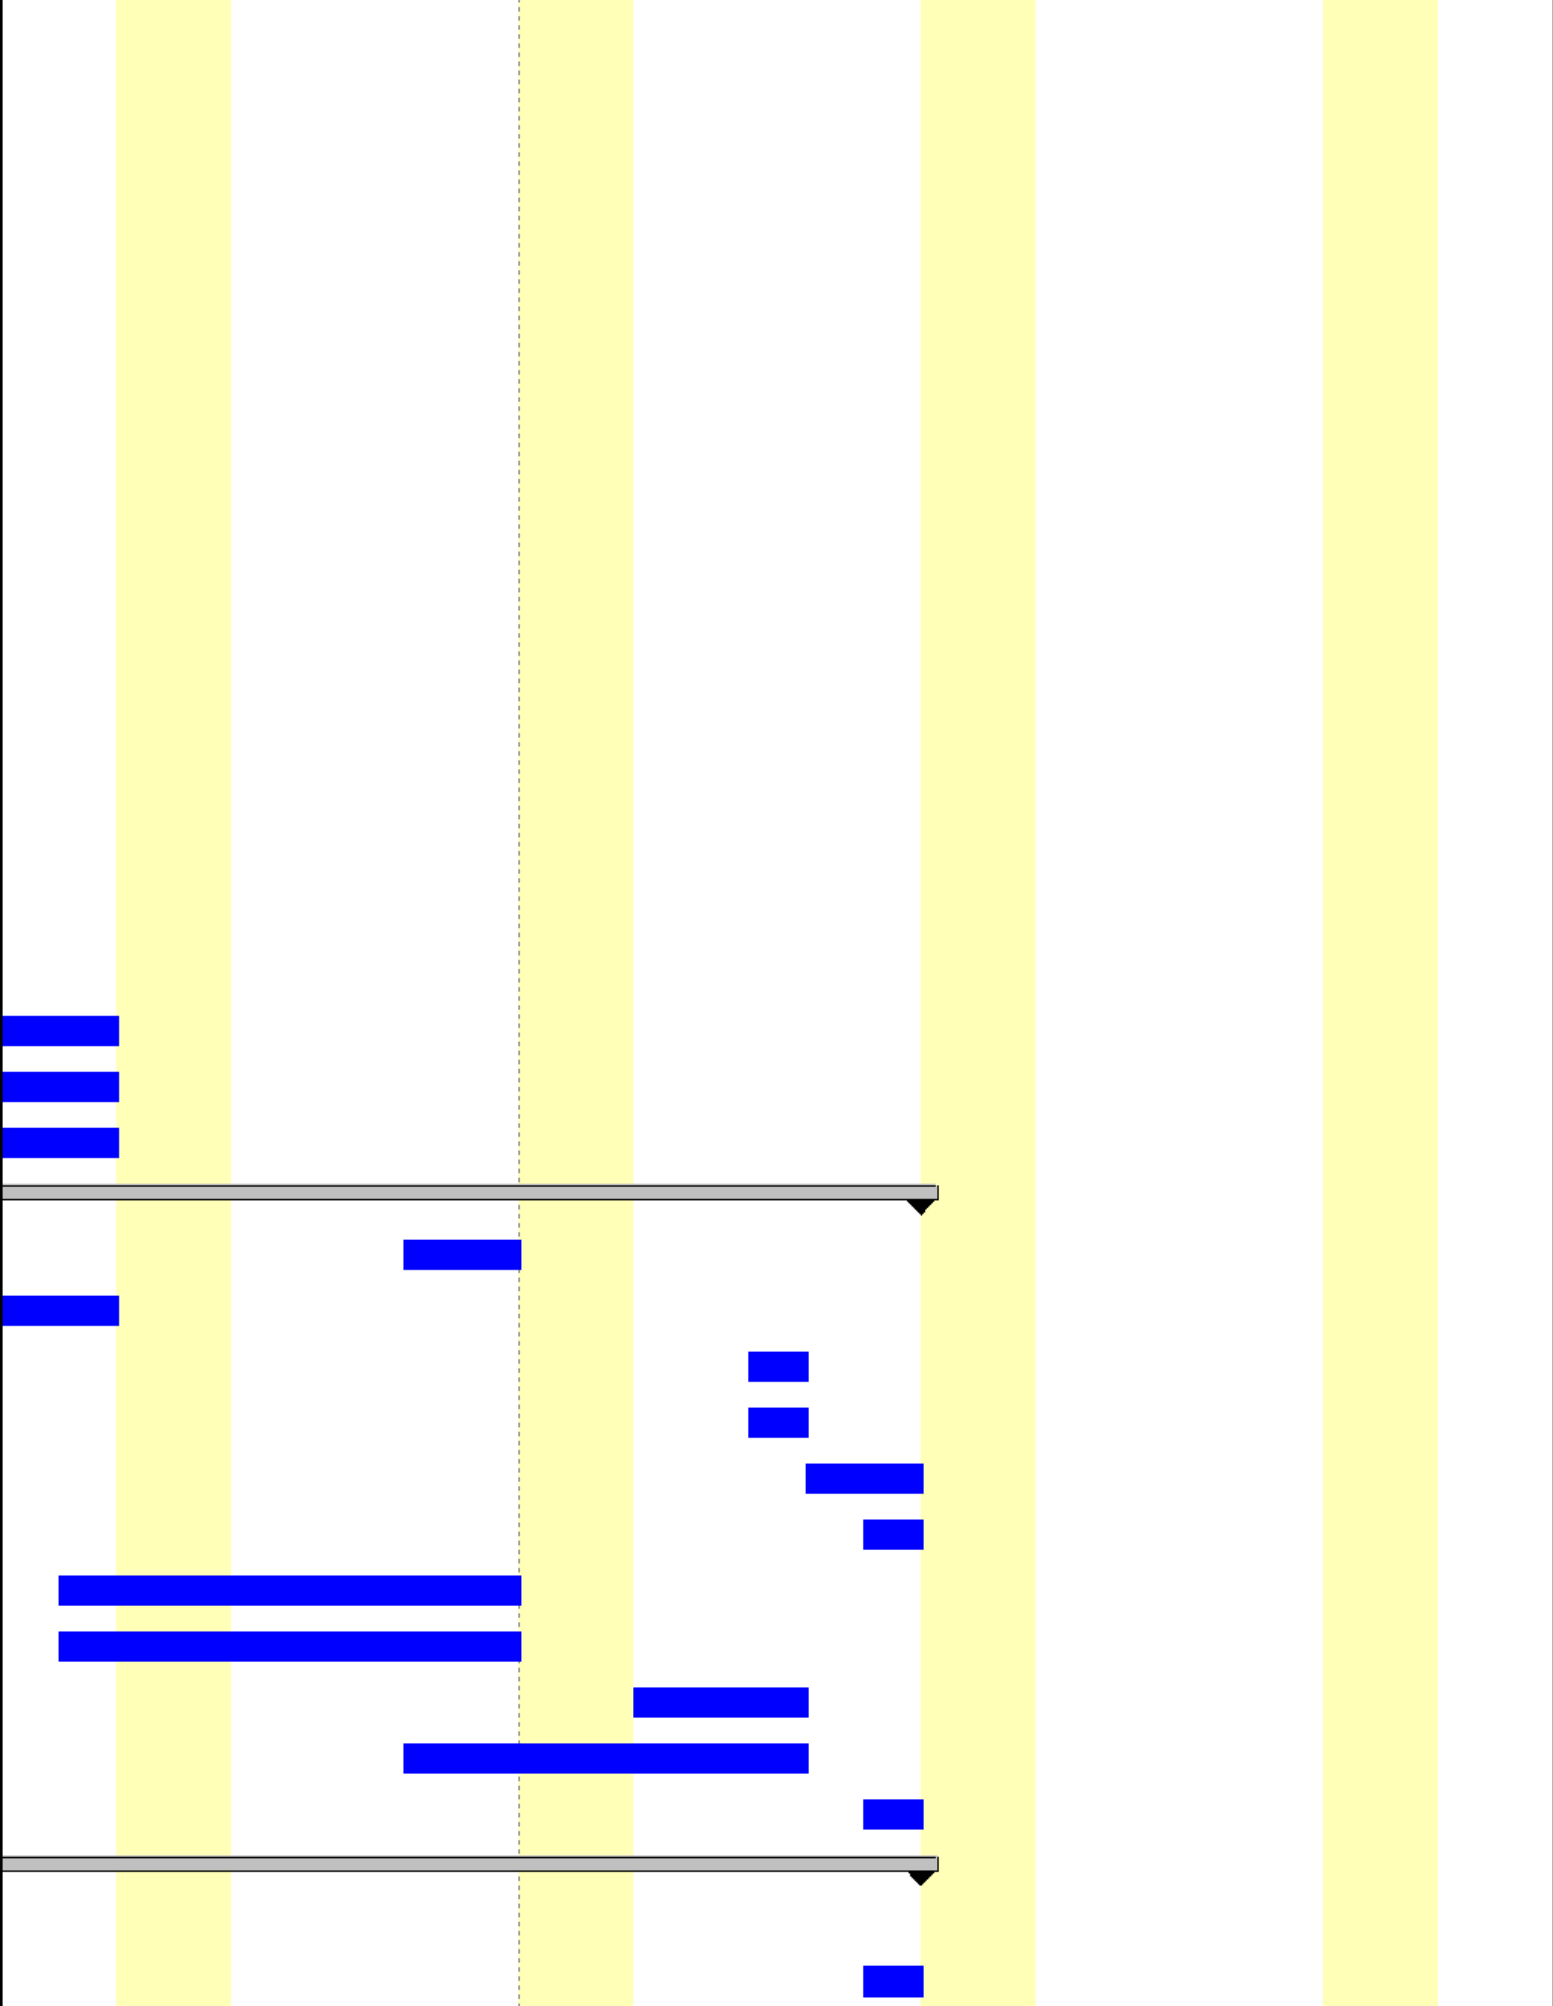


Mese 11

281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Mese 11


281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



[illegible]

Mese 12

308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

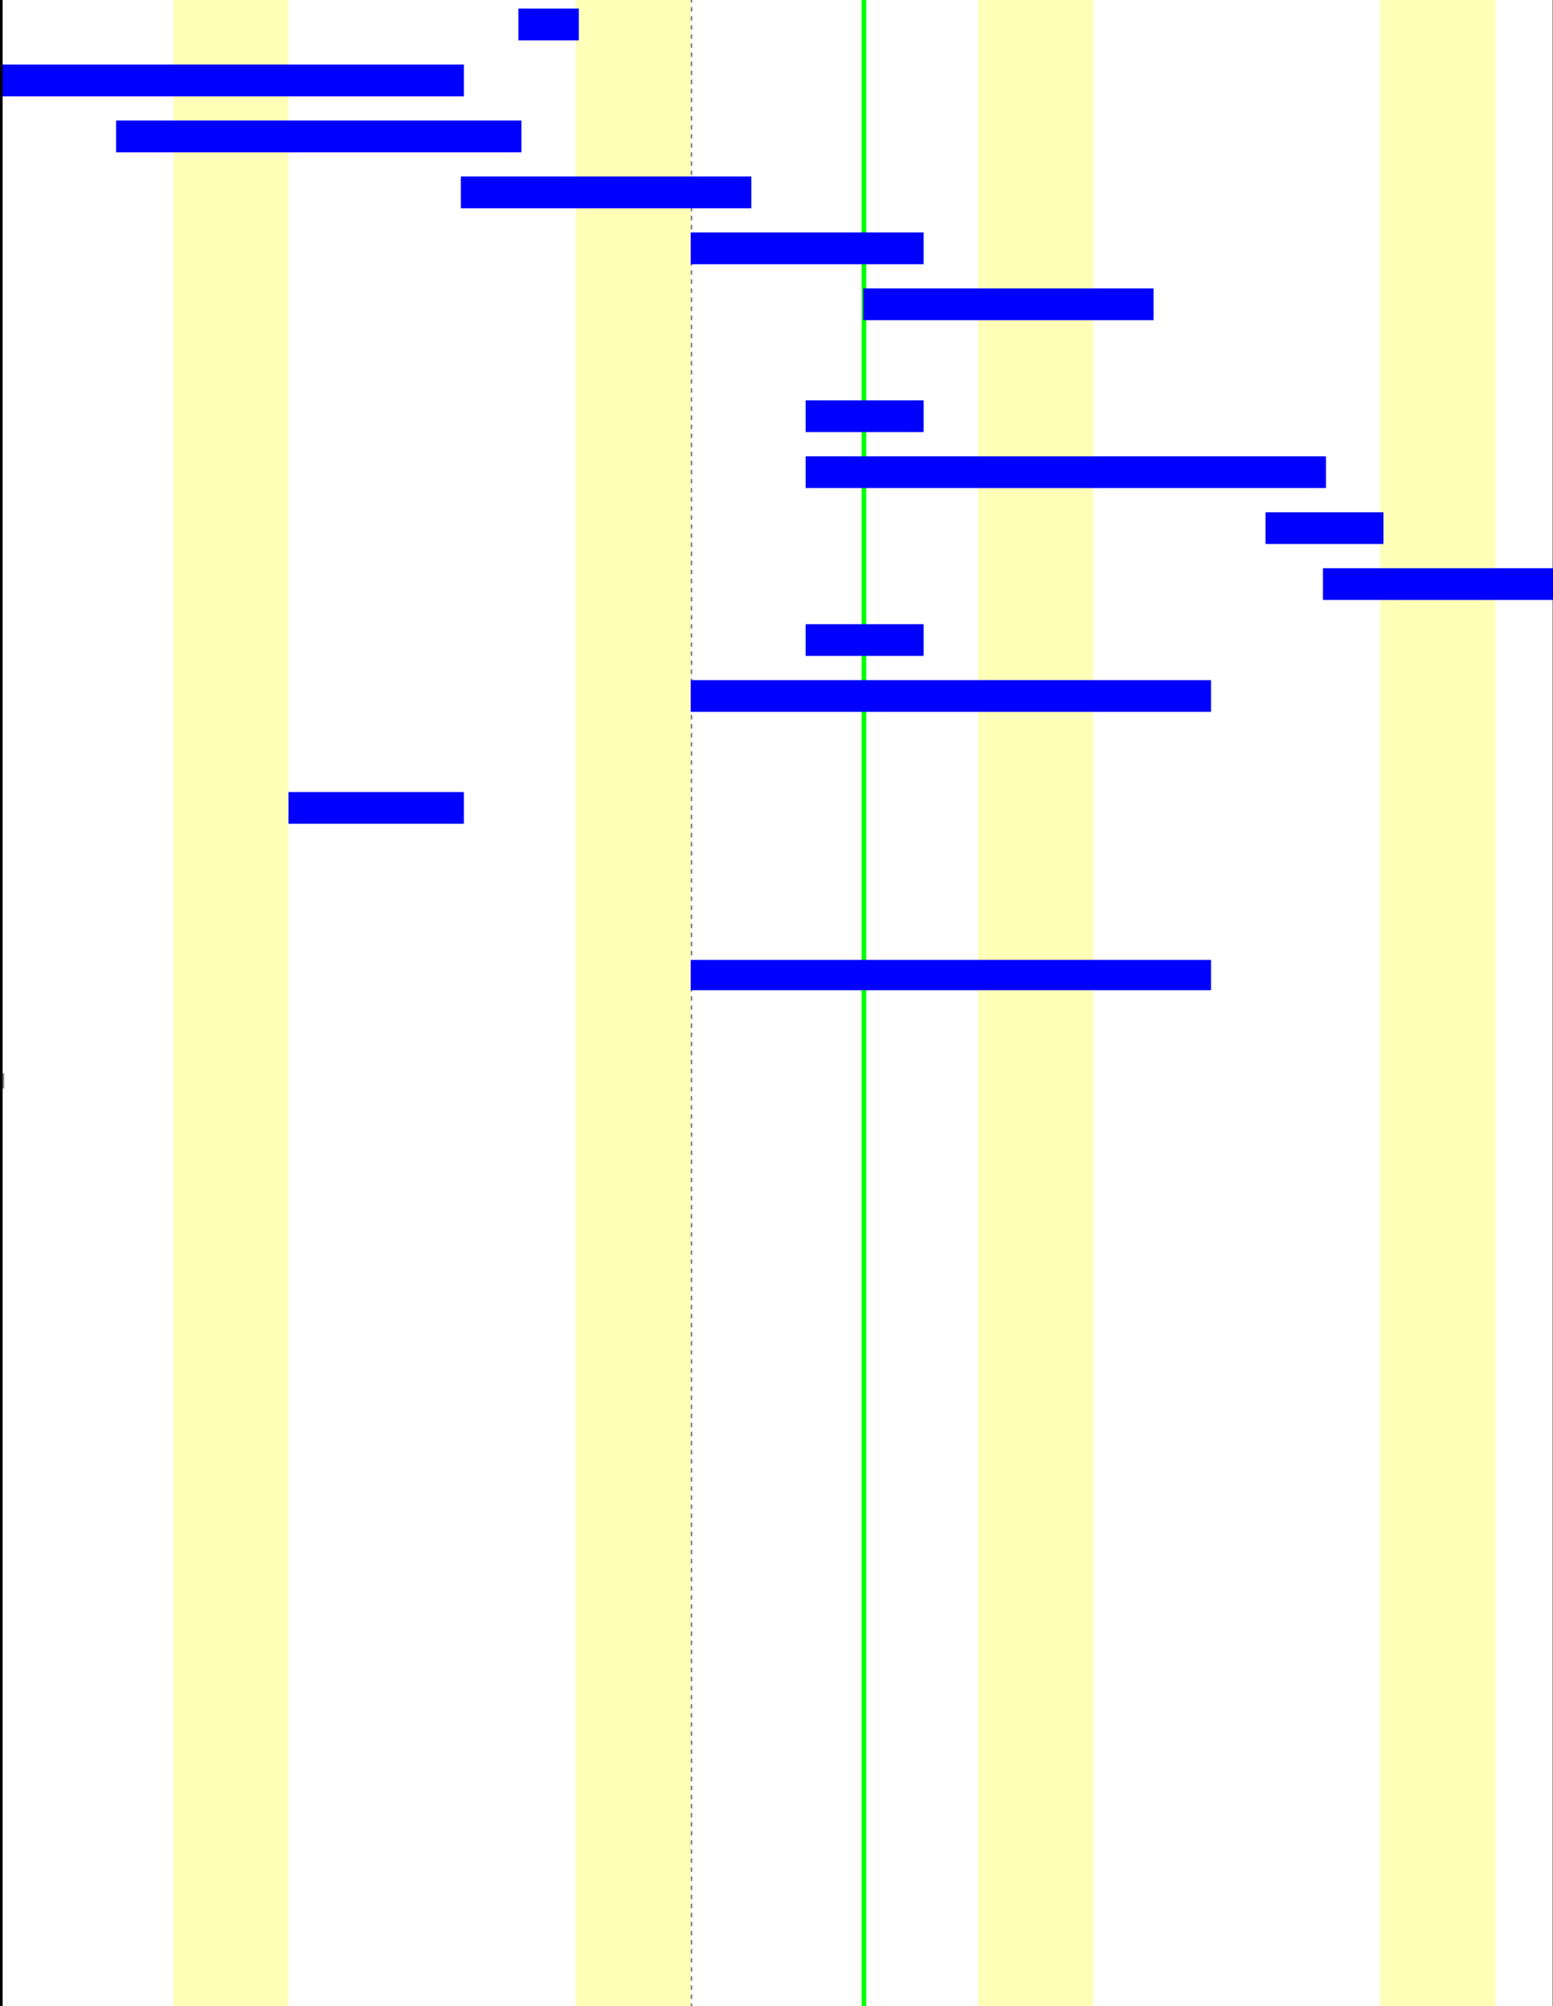


Mese 12

308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334

COMMITTENTE: Comune di Lampedusa e Linosa

Mese 12

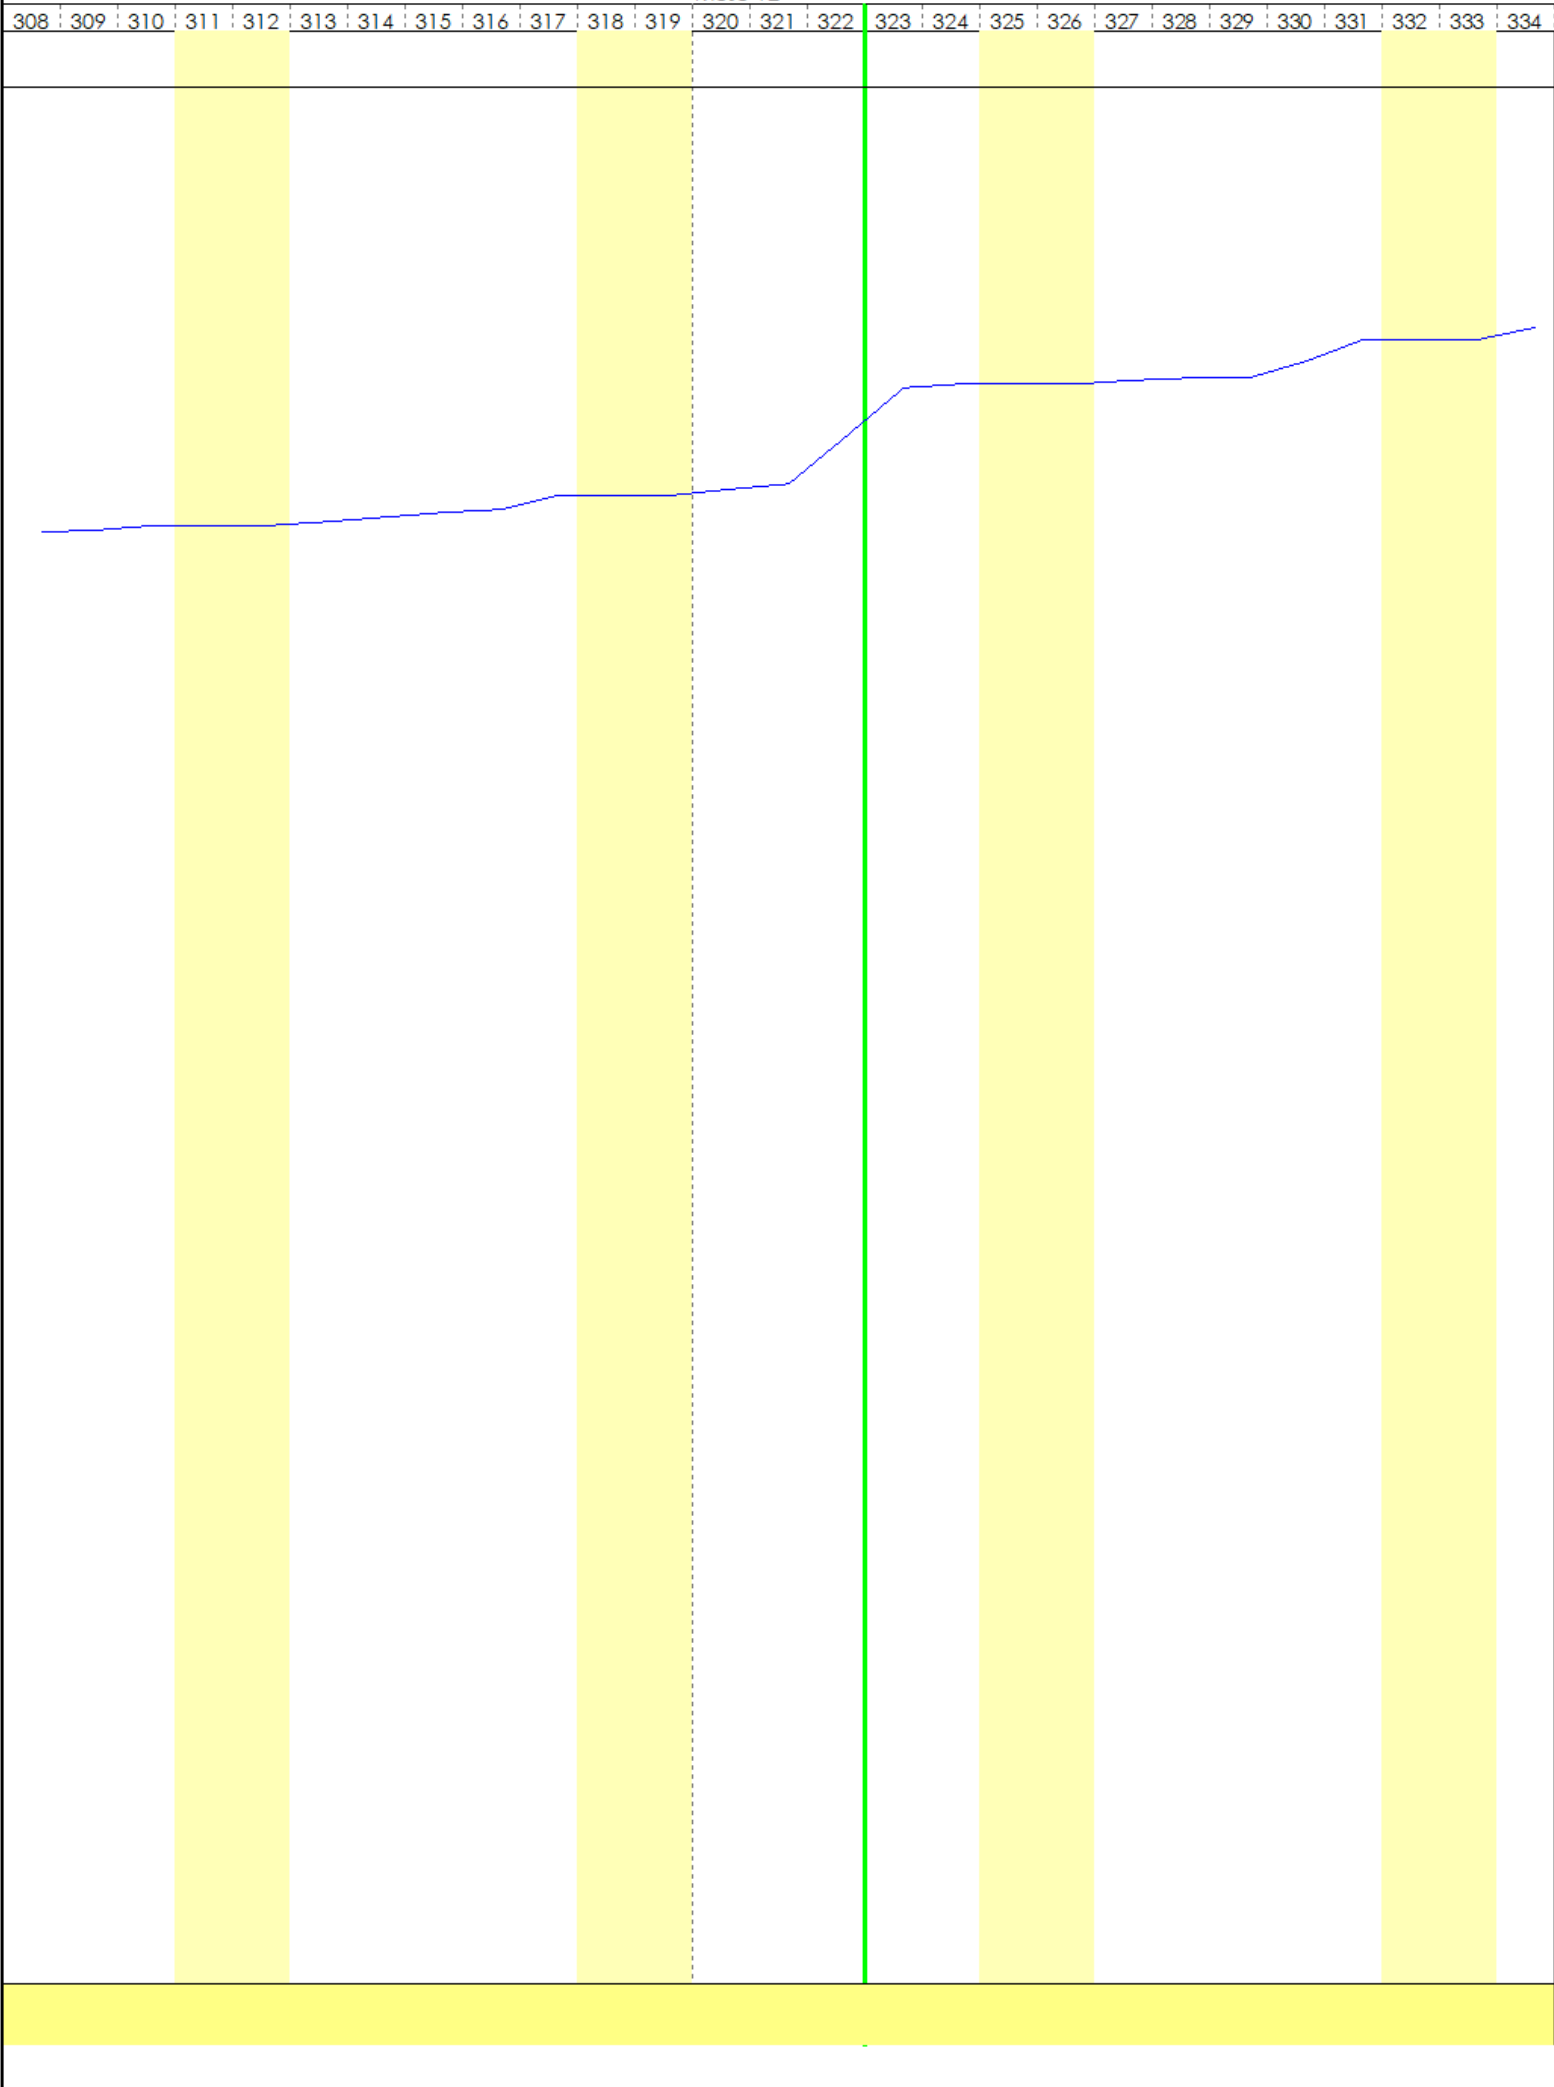



Comune di Lampedusa e Linosa  
Provincia di Agrigento

Tabella Attività

**OGGETTO:** PROGETTO ESECUTIVO PER L'AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DI LAMPEDUSA, SITO IN ZONA CALA PISANA.

**COMMITTENTE:** Comune di Lampedusa e Linosa

Lampedusa e Linosa,

Il Tecnico  
(arch. Licata Giuseppe)

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
<b>Lavori a MISURA</b>	<b>897'531,93</b>	<b>100,00</b>	<b>1 gg</b>	<b>335 gg</b>	<b>231</b>	<b>335</b>
<b>* Scavi, Demolizioni e trasporto in discarica</b>	<b>30'205,79</b>	<b>3,37</b>	<b>1 gg</b>	<b>16 gg</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
** Dismissione, pulizia accatastamento di pavimentazione aut ... l'eventuale strato di sottofondo in calcestruzzo di cm 25.	6'704,08	0,75	5 gg	12 gg	6	8
** Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simi ... rro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.	6'870,30	0,77	1 gg	5 gg	3	5
** Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori d ... ta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.	9'762,30	1,09	12 gg	16 gg	5	5
** Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, ... cavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:	2'197,44	0,24	12 gg	12 gg	1	1
** Dismissione blocco palo di illuminazione tronco conico a ... io per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	722,79	0,08	12 gg	12 gg	1	1
** Dismissione di cancello esistente in acciaio inox delle d ... io per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	218,50	0,02	1 gg	1 gg	1	1
** Smontaggio, spostamento e rimontaggio di monumento lapide ... io per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	2'530,00	0,28	1 gg	1 gg	1	1
<b>** overflow</b>	<b>1'200,38</b>	<b>0,13</b>	<b>9 gg</b>	<b>12 gg</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
*** Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, ... ta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.	1'200,38	0,13	9 gg	12 gg	2	4
<b>* Strutture in fondazione e elevazione</b>	<b>185'449,45</b>	<b>20,66</b>	<b>16 gg</b>	<b>170 gg</b>	<b>104</b>	<b>155</b>
** Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolm ... le barre di armatura, per opere in fondazione con C 12/15	9'057,95	1,01	21 gg	26 gg	3	6
** Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B4 ... ministrazione); per strutture in cemento armato intelaiate	52'246,30	5,82	26 gg	168 gg	65	84
*** periodo 01	2'411,37	0,27	26 gg	28 gg	3	3
*** periodo 02	2'411,37	0,27	30 gg	34 gg	3	5
*** periodo 03	2'411,37	0,27	36 gg	42 gg	3	7
*** periodo 04	1'607,57	0,18	44 gg	48 gg	2	5
*** periodo 05	2'411,37	0,27	50 gg	54 gg	3	5
*** periodo 06	2'411,37	0,27	56 gg	58 gg	3	3
*** periodo 07	2'411,37	0,27	62 gg	64 gg	3	3
*** periodo 08	2'411,37	0,27	68 gg	70 gg	3	3
*** periodo 09	2'411,37	0,27	72 gg	76 gg	3	5
*** periodo 10	3'215,16	0,36	78 gg	83 gg	4	6
*** periodo 11	1'607,57	0,18	85 gg	86 gg	2	2
*** periodo 12	1'607,57	0,18	90 gg	91 gg	2	2
*** periodo 13	4'018,96	0,45	93 gg	99 gg	5	7
*** periodo 14	3'215,16	0,36	103 gg	106 gg	4	4
*** periodo 15	4'018,96	0,45	124 gg	128 gg	5	5
*** periodo 16	3'215,16	0,36	132 gg	135 gg	4	4
*** periodo 17	2'411,37	0,27	140 gg	142 gg	3	3
*** periodo 18	2'411,37	0,27	145 gg	147 gg	3	3
*** periodo 19	1'607,57	0,18	152 gg	153 gg	2	2
*** periodo 20	2'411,37	0,27	159 gg	162 gg	3	4
*** periodo 21	1'607,61	0,18	166 gg	168 gg	2	3
** Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato ... in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).	6'618,78	0,74	146 gg	169 gg	11	12
*** periodo 01	2'406,82	0,27	146 gg	149 gg	4	4
*** periodo 02	1'805,13	0,20	153 gg	155 gg	3	3
*** periodo 03	1'203,41	0,13	160 gg	162 gg	2	3
*** periodo 04	1'203,41	0,13	168 gg	169 gg	2	2
** Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, d ... per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.	28'205,13	3,14	28 gg	170 gg	38	38
*** periodo 01	1'484,46	0,17	28 gg	29 gg	2	2
*** periodo 02	1'484,46	0,17	34 gg	35 gg	2	2
*** periodo 03	1'484,46	0,17	42 gg	43 gg	2	2

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** periodo 04	1'484,46	0,17	48 gg	49 gg	2	2
** periodo 05	1'484,46	0,17	54 gg	55 gg	2	2
** periodo 06	742,34	0,08	61 gg	61 gg	1	1
** periodo 07	1'484,46	0,17	64 gg	65 gg	2	2
** periodo 08	1'484,46	0,17	70 gg	71 gg	2	2
** periodo 09	1'484,46	0,17	76 gg	77 gg	2	2
** periodo 10	1'484,46	0,17	83 gg	84 gg	2	2
** periodo 11	742,34	0,08	89 gg	89 gg	1	1
** periodo 12	2'226,80	0,25	98 gg	100 gg	3	3
** periodo 13	1'484,46	0,17	106 gg	107 gg	2	2
** periodo 14	2'226,80	0,25	126 gg	128 gg	3	3
** periodo 15	1'484,46	0,17	134 gg	135 gg	2	2
** periodo 16	1'484,46	0,17	141 gg	142 gg	2	2
** periodo 17	742,34	0,08	149 gg	149 gg	1	1
** periodo 18	742,34	0,08	155 gg	155 gg	1	1
** periodo 19	1'484,46	0,17	162 gg	163 gg	2	2
** periodo 20	1'484,23	0,17	169 gg	170 gg	2	2
** Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato i ... tura. - Per opere in fondazione per lavori edili : C 28/35	43'211,67	4,81	29 gg	107 gg	13	13
** periodo 01	3'324,52	0,37	29 gg	29 gg	1	1
** periodo 02	3'324,52	0,37	35 gg	35 gg	1	1
** periodo 03	3'324,52	0,37	43 gg	43 gg	1	1
** periodo 04	3'324,52	0,37	49 gg	49 gg	1	1
** periodo 05	3'324,52	0,37	55 gg	55 gg	1	1
** periodo 06	3'324,52	0,37	61 gg	61 gg	1	1
** periodo 07	3'324,52	0,37	65 gg	65 gg	1	1
** periodo 08	3'324,52	0,37	71 gg	71 gg	1	1
** periodo 09	3'324,52	0,37	77 gg	77 gg	1	1
** periodo 10	3'324,52	0,37	84 gg	84 gg	1	1
** periodo 11	3'324,52	0,37	89 gg	89 gg	1	1
** periodo 12	3'324,52	0,37	100 gg	100 gg	1	1
** periodo 13	3'317,47	0,37	107 gg	107 gg	1	1
** Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato i ... atura. - Per opere in elevazione per lavori edili: C 28/35	26'754,27	2,98	131 gg	170 gg	7	7
** periodo 01	3'822,58	0,43	131 gg	131 gg	1	1
** periodo 02	3'822,58	0,43	135 gg	135 gg	1	1
** periodo 03	3'822,58	0,43	142 gg	142 gg	1	1
** periodo 04	3'822,58	0,43	149 gg	149 gg	1	1
** periodo 05	3'822,58	0,43	155 gg	155 gg	1	1
** periodo 06	3'822,58	0,43	163 gg	163 gg	1	1
** periodo 07	3'818,81	0,43	170 gg	170 gg	1	1
** Fornitura e collocazione di rivestimento isolante per mur ... ssario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	2'562,50	0,29	16 gg	20 gg	3	5
** Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzont ... armatura trasversale regolamentare. per luci fino a 6,00 m	16'792,85	1,87	126 gg	142 gg	7	9
** periodo 01	9'595,91	1,07	126 gg	131 gg	4	6
** periodo 02	4'797,96	0,53	139 gg	140 gg	2	2
** periodo 03	2'398,98	0,27	142 gg	142 gg	1	1
<b>* elementi prefabbricati</b>	<b>288'227,36</b>	<b>32,11</b>	<b>107 gg</b>	<b>124 gg</b>	<b>12</b>	<b>18</b>
** Fornitura,trasporto e posa in opera di batteria di loculi ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	10'935,48	1,22	107 gg	107 gg	1	1
** Fornitura,trasporto e posa in opera di batteria di loculi ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	237'935,00	26,51	107 gg	117 gg	7	11
** Fornitura,trasporto e posa in opera di batteria di loculi ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	17'110,56	1,91	117 gg	120 gg	4	4
** Fornitura e posa in opera di cassetta ossario in batteria ... onere e magistero per realizzare l'opera a regola d'arte.	22'246,32	2,48	121 gg	124 gg	2	4
<b>* Tompagni e tramezzi</b>	<b>49'150,33</b>	<b>5,48</b>	<b>162 gg</b>	<b>194 gg</b>	<b>22</b>	<b>33</b>
** Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con ... arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.	42'564,30	4,74	162 gg	180 gg	12	19

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg ... spessore di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP	6'586,03	0,73	177 gg	194 gg	12	18
<b>* Rifiniture</b>	<b>251'300,63</b>	<b>28,00</b>	<b>194 gg</b>	<b>335 gg</b>	<b>101</b>	<b>142</b>
** Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo no ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	35'485,25	3,95	194 gg	208 gg	11	15
** Finiture idrofugata a civile media (rasante) e successiv ... sario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte	30'527,64	3,40	208 gg	225 gg	14	18
** Fornitura e collocazione di scossalina in lamiera prevern ... ssario per dare il lavoro finito a perfetta regole d'arte.	7'893,42	0,88	224 gg	226 gg	3	3
** Intonaco civile per interni dello spessore complessivo no ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	15'718,59	1,75	229 gg	250 gg	16	22
** Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello s ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	8'260,30	0,92	299 gg	303 gg	5	5
** Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina ... corre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	2'995,97	0,33	303 gg	310 gg	6	8
** Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolic ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	11'815,36	1,32	299 gg	306 gg	6	8
** Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due pa ... entemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.	7'304,47	0,81	317 gg	317 gg	1	1
** Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ... erfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici	2'458,86	0,27	308 gg	315 gg	6	8
** Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con s ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	7'471,83	0,83	310 gg	316 gg	5	7
** Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ... ate dalla D.L. battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm	1'098,77	0,12	316 gg	320 gg	3	5
** Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ... erfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici	7'229,64	0,81	320 gg	323 gg	4	4
** Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione pe ... ore non inferiore a 28 mm per elementi di formato 40x40 cm	2'070,58	0,23	323 gg	327 gg	3	5
** Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con gua ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	7'991,72	0,89	293 gg	300 gg	6	8
** Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qua ... di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travertino e simili	39'285,81	4,38	322 gg	323 gg	2	2
** Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qua ... di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travertino e simili	1'751,84	0,20	322 gg	330 gg	7	9
** Fornitura, e collocazione di staffa in bronzo per sostegn ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	17'064,96	1,90	330 gg	331 gg	2	2
** Fornitura, e collocazione di perno tipo parma in bronzo p ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	6'412,23	0,71	331 gg	334 gg	2	4
** Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con r ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	5'161,01	0,58	322 gg	323 gg	2	2
** Messa in opera di pavimentazione autobloccante esistente ... l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante	3'164,70	0,35	320 gg	328 gg	7	9
** Fornitura e posa in opera di cancelli carrabile e pedonal ... ore per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	7'877,27	0,88	335 gg	335 gg	1	1
** Fornitura e posa in opera di controsoffitti piani in rete ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	1'324,41	0,15	313 gg	315 gg	3	3



ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** Fornitura e collocazione d'infisso di PVC per portoncino, ... smittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K)	5'808,35	0,65	282 gg	287 gg	4	6
** Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzat ... smittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K)	9'613,20	1,07	278 gg	281 gg	4	4
** Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in con ... , da compensarsi a parte. per elementi di formato 16x12 cm	4'042,84	0,45	320 gg	328 gg	7	9
** Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera prevernici ... ompleta ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 80 mm	1'471,61	0,16	293 gg	294 gg	2	2
<b>* Impianto elettrico</b>	<b>36'329,14</b>	<b>4,05</b>	<b>240 gg</b>	<b>286 gg</b>	<b>32</b>	<b>47</b>
** Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli a ... ecanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale costipato	207,13	0,02	243 gg	244 gg	2	2
** Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, ... cavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:	21,70	0,00	244 gg	244 gg	1	1
** Fornitura e montaggio di quadro elettrico per ente distri ... o con malta cementizia, ed ogni altro onere ed accessorio.	1'265,00	0,14	278 gg	280 gg	3	3
** Fornitura e montaggio di quadro elettrico GENERALE preass ... o con malta cementizia, ed ogni altro onere ed accessorio.	5'635,00	0,63	279 gg	285 gg	5	7
** Fornitura e montaggio di quadro elettrico ONORANZE FUNEBR ... o con malta cementizia, ed ogni altro onere ed accessorio.	1'495,00	0,17	282 gg	285 gg	2	4
** Fornitura e montaggio di quadro elettrico SALA AUTOPTICA ... o con malta cementizia, ed ogni altro onere ed accessorio.	2'461,00	0,27	285 gg	286 gg	2	2
** Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato ce ... pleta a perfetta regola d'arte per pozzetti da 40x40x50 cm	1'985,20	0,22	244 gg	246 gg	3	3
** Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a ... a a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN)	1'183,14	0,13	247 gg	247 gg	1	1
** Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con ma ... unzionante a perfetta regola d'arte. diametro pari a 50 mm	582,00	0,06	244 gg	251 gg	6	8
** Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con ma ... unzionante a perfetta regola d'arte. diametro pari a 63 mm	981,75	0,11	250 gg	251 gg	2	2
** Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda ... ento con parti metalliche da proteggere o interconnettere.	354,00	0,04	252 gg	253 gg	2	2
** Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e co ... ompleta a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme.	259,90	0,03	253 gg	253 gg	1	1
** Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato co ... l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 2 x 1,5 mm²	921,00	0,10	254 gg	259 gg	4	6
** Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato co ... l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 10 mm²	1'409,70	0,16	258 gg	264 gg	5	7
** Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato co ... l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 6 mm²	688,55	0,08	260 gg	268 gg	7	9
** Impianto citofonico realizzato con: apparecchio citofonic ... nte, comprese opere murarie. - per ogni punto di ricezione	496,80	0,06	240 gg	240 gg	1	1
** Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65 ... pera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 24 W	1'073,64	0,12	240 gg	240 gg	1	1
** Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65 ... pera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 24 W	2'038,26	0,23	240 gg	240 gg	1	1
** Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, p ... era finita a perfetta regola d'arte. Con lampade FL 2x36 W	2'427,04	0,27	240 gg	240 gg	1	1

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, p ... era finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FL 1x58 W	1'799,52	0,20	240 gg	240 gg	1	1
** Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna l ... pera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 18 W	938,40	0,10	240 gg	240 gg	1	1
** Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, compl ... Ita cementizia e ogni altro onere. Dimensione 116x92x70 mm	93,96	0,01	257 gg	258 gg	2	2
** Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, compl ... Ita cementizia e ogni altro onere. Dimensione 154x92x70 mm	124,74	0,01	257 gg	259 gg	3	3
** Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commuta ... minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm <sup>2</sup>	1'779,05	0,20	254 gg	264 gg	7	11
** Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, dev ... minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm <sup>2</sup>	963,25	0,11	257 gg	266 gg	8	10
** Punto di comando aggiunto ad uno esistente, costituito da ... minuteria, ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm <sup>2</sup>	60,95	0,01	265 gg	266 gg	2	2
** Maggiorazione per realizzazione di punto di comando lumin ... mando predisposto per localizzazione dello stesso al buio.	23,60	0,00	266 gg	266 gg	1	1
** Maggiorazione per la realizzazione di punto di comando e/ ... collegamento dell'apparecchio modulare e ogni altro onere.	130,60	0,01	266 gg	266 gg	1	1
** Installazione di relè interruttore/commutatore di tipo el ... già predisposti. Inclusa la minuteria ed ogni altro onere.	70,15	0,01	267 gg	267 gg	1	1
** Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofa ... minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 4,0 mm <sup>2</sup>	87,64	0,01	267 gg	267 gg	1	1
** Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con ... elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm <sup>2</sup>	2'075,40	0,23	267 gg	279 gg	8	13
** Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1. ... di terra laterali e centrale e alveoli di fase schermati.	39,70	0,00	279 gg	279 gg	1	1
** Punto presa telefono di attestamento linea telefonica est ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	71,76	0,01	280 gg	280 gg	1	1
** Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con line ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	83,26	0,01	280 gg	280 gg	1	1
** Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo uni ... segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm <sup>2</sup>	676,80	0,08	267 gg	282 gg	11	16
** Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo uni ... segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 4,0 mm <sup>2</sup>	931,00	0,10	267 gg	282 gg	11	16
** Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo uni ... segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 6,0 mm <sup>2</sup>	893,55	0,10	267 gg	282 gg	11	16
<b>* Impianto di scarico acque nere, bionde e meteoriche</b>	<b>22'922,37</b>	<b>2,55</b>	<b>279 gg</b>	<b>296 gg</b>	<b>14</b>	<b>18</b>
** Fornitura e montaggio e installazione di valvola antirifi ... il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.	1'288,00	0,14	288 gg	289 gg	2	2
** Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, ... ta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.	4'998,36	0,56	279 gg	282 gg	4	4
** Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli a ... ecanici che manuali. - Per ogni m <sup>3</sup> di materiale costipato	929,09	0,10	294 gg	294 gg	1	1
** Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, ... cavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:	117,80	0,01	294 gg	294 gg	1	1
** Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tip ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	2'709,40	0,30	295 gg	296 gg	2	2

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a ... a a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN)	3'211,38	0,36	296 gg	296 gg	1	1
** Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fog ... da compensarsi a parte. D esterno 110 mm; interno 103,6 mm	926,07	0,10	282 gg	289 gg	6	8
** Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fog ... da compensarsi a parte. D esterno 125 mm; interno 117,6 mm	4'549,86	0,51	282 gg	289 gg	6	8
** Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazio ... icati dalla norma UNI EN 12056-1/5. - per punto di scarico	1'342,74	0,15	292 gg	294 gg	3	3
** Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi ... pleta ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 100 mm	1'297,17	0,14	288 gg	294 gg	5	7
** Fornitura e collocazione di autoclave per acqua uso sanit ... i elettrici. Compreso di collettore e valvole di chiusura.	1'552,50	0,17	296 gg	296 gg	1	1
<b>* Impianto idrico-sanitario</b>	<b>20'397,19</b>	<b>2,27</b>	<b>272 gg</b>	<b>296 gg</b>	<b>18</b>	<b>25</b>
** Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina ... ca in ottone OT 58 con premistoppa in tubetto algoflonato.	47,27	0,01	275 gg	275 gg	1	1
** Impianto di produzione ACS con scaldacqua elettrici o ter ... perfetta regola d'arte. Per Scaldacqua elettrico da l 100.	1'725,00	0,19	296 gg	296 gg	1	1
** Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idri ... o d'acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm	953,81	0,11	275 gg	278 gg	2	4
** Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da ½" compreso ogni onere e magistero.	188,37	0,02	278 gg	279 gg	2	2
** Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilen ... gni altro onere e magistero. per diametro esterno da 32 mm	364,05	0,04	278 gg	282 gg	5	5
** Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, ... ta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.	549,29	0,06	272 gg	275 gg	3	4
** Fornitura e collocazione di autoclave per acqua uso sanit ... i elettrici. Compreso di collettore e valvole di chiusura.	1'552,50	0,17	296 gg	296 gg	1	1
** Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli a ... eccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale costipato	102,07	0,01	289 gg	289 gg	1	1
** Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tip ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	641,70	0,07	289 gg	289 gg	1	1
** Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a ... a a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN)	760,59	0,08	289 gg	289 gg	1	1
** Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr ... pleta a perfetta regola d'arte. per diametro DN 16x11,6 mm	1'545,60	0,17	282 gg	289 gg	6	8
** Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr ... ompleta a perfetta regola d'arte. per diametro DN 20x15 mm	2'300,20	0,26	282 gg	289 gg	6	8
** Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellan ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	2'170,08	0,24	292 gg	294 gg	3	3
** Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès por ... nte a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 80x80 cm	306,71	0,03	294 gg	294 gg	1	1
** Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana v ... per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.	1'678,80	0,19	294 gg	295 gg	2	2
** Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monobloc ... e per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.	2'175,80	0,24	294 gg	294 gg	1	1
** Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabil ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	2'083,80	0,23	294 gg	295 gg	2	2

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza riba ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	434,01	0,05	296 gg	296 gg	1	1
** Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disa ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	507,15	0,06	296 gg	296 gg	1	1
** Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	310,39	0,03	296 gg	296 gg	1	1
<b>* Impianto di condizionamento</b>	<b>7'565,85</b>	<b>0,84</b>	<b>176 gg</b>	<b>176 gg</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
** Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di c ... à esterna a 1 metro di distanza non superiore a: 48 dB(A).	7'565,85	0,84	176 gg	176 gg	1	1
<b>* Prove di laboratorio</b>	<b>1'876,63</b>	<b>0,21</b>	<b>20 gg</b>	<b>170 gg</b>	<b>102</b>	<b>151</b>
** Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm ... provini. UNI EN 12390-3:2009 - Per ogni coppia di provini	640,08	0,07	170 gg	170 gg	1	1
** Prova di abbassamento al cono (Slump test). Verifica dell ... l calcestruzzo fresco. UNI EN 12350-2:2009 - Per ogni prova	53,82	0,01	35 gg	100 gg	3	3
*** periodo 01	17,94	0,00	35 gg	35 gg	1	1
*** periodo 02	17,94	0,00	83 gg	83 gg	1	1
*** periodo 03	17,94	0,00	100 gg	100 gg	1	1
** Confezionamento di calcestruzzo fresco in cubiere (15*15*15 cm). UNI EN12390-2:2009 - Per ogni serie da 2 provini	413,07	0,05	29 gg	170 gg	20	20
*** periodo 01	20,65	0,00	29 gg	29 gg	1	1
*** periodo 02	20,65	0,00	35 gg	35 gg	1	1
*** periodo 03	20,65	0,00	43 gg	43 gg	1	1
*** periodo 04	20,65	0,00	49 gg	49 gg	1	1
*** periodo 05	20,65	0,00	55 gg	55 gg	1	1
*** periodo 06	20,65	0,00	61 gg	61 gg	1	1
*** periodo 07	20,65	0,00	65 gg	65 gg	1	1
*** periodo 08	20,65	0,00	71 gg	71 gg	1	1
*** periodo 09	20,65	0,00	77 gg	77 gg	1	1
*** periodo 10	20,65	0,00	83 gg	83 gg	1	1
*** periodo 11	20,65	0,00	89 gg	89 gg	1	1
*** periodo 12	20,65	0,00	100 gg	100 gg	1	1
*** periodo 13	20,65	0,00	107 gg	107 gg	1	1
*** periodo 14	20,65	0,00	131 gg	131 gg	1	1
*** periodo 15	20,65	0,00	135 gg	135 gg	1	1
*** periodo 16	20,65	0,00	142 gg	142 gg	1	1
*** periodo 17	20,65	0,00	149 gg	149 gg	1	1
*** periodo 18	20,65	0,00	155 gg	155 gg	1	1
*** periodo 19	20,65	0,00	163 gg	163 gg	1	1
*** periodo 20	20,65	0,00	170 gg	170 gg	1	1
** Prova di trazione con determinazione di snervamento, rott ... . UNI EN ISO 6892-1:2009; D.M. 14.01.2008 - Per ogni prova	331,68	0,04	20 gg	20 gg	1	1
** Prova di piegamento e raddrizzamento. (per ogni terna). UNI EN ISO 7438:2005; D.M. 14.01.2008	141,24	0,02	20 gg	20 gg	1	1
** Taglio e preparazione della barra di acciaio, in tondo ad ... UNI EN ISO 7438:2005; D.M. 14.01.2008 - Per ogni campione	91,92	0,01	20 gg	20 gg	1	1
** Prova di trazione su provetta di reti o tralicci elettros ... . UNI EN ISO 6892-1:2009; D.M. 14.01.2008 - Per ogni prova	181,93	0,02	20 gg	20 gg	1	1
** Preparazione del campione di reti o tralicci elettrosaldati da sottoporsi a prove di laboratorio. - Per ogni campione	22,89	0,00	20 gg	20 gg	1	1
<b>* Opere provvisionali e di sicurezza</b>	<b>4'107,19</b>	<b>0,46</b>	<b>334 gg</b>	<b>335 gg</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
** Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e con manicotto : lunghezza 20 m	1'003,98	0,11	334 gg	335 gg	2	2
** Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e con manicotto : lunghezza 10 m	401,60	0,04	334 gg	334 gg	1	1



[illegible]

Comune di Lampedusa e Linosa  
Provincia di Agrigento

Tabella Date e Importi

**OGGETTO:** PROGETTO ESECUTIVO PER L'AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DI LAMPEDUSA, SITO IN ZONA CALA PISANA.

**COMMITTENTE:** Comune di Lampedusa e Linosa

Lampedusa e Linosa,

Il Tecnico  
(arch. Licata Giuseppe)



DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
1 gg	5'038,60	5'038,60	0,56
2 gg	2'290,10	7'328,70	0,82
5 gg	3'407,45	10'736,15	1,20
6 gg	1'117,35	11'853,49	1,32
7 gg	1'117,35	12'970,84	1,45
8 gg	1'117,35	14'088,19	1,57
9 gg	1'717,53	15'805,72	1,76
12 gg	6'590,23	22'395,95	2,50
13 gg	1'952,46	24'348,41	2,71
14 gg	1'952,46	26'300,87	2,93
15 gg	1'952,46	28'253,33	3,15
16 gg	2'806,63	31'059,96	3,46
19 gg	854,17	31'914,12	3,56
20 gg	1'623,83	33'537,95	3,74
21 gg	3'019,32	36'557,27	4,07
22 gg	3'019,32	39'576,59	4,41
26 gg	3'823,11	43'399,70	4,84
27 gg	803,79	44'203,49	4,93
28 gg	1'546,02	45'749,50	5,10
29 gg	4'087,40	49'836,90	5,55
30 gg	803,79	50'640,69	5,64
33 gg	803,79	51'444,48	5,73
34 gg	1'546,02	52'990,49	5,90
35 gg	4'105,34	57'095,83	6,36
36 gg	803,79	57'899,62	6,45
37 gg	803,79	58'703,41	6,54
42 gg	1'546,02	60'249,43	6,71
43 gg	4'087,40	64'336,82	7,17
44 gg	803,78	65'140,61	7,26
48 gg	1'546,01	66'686,62	7,43
49 gg	4'087,40	70'774,02	7,89
50 gg	803,79	71'577,81	7,97
51 gg	803,79	72'381,60	8,06
54 gg	1'546,02	73'927,61	8,24
55 gg	4'087,40	78'015,01	8,69
56 gg	803,79	78'818,80	8,78
57 gg	803,79	79'622,59	8,87
58 gg	803,79	80'426,38	8,96
61 gg	4'087,51	84'513,89	9,42
62 gg	803,79	85'317,68	9,51
63 gg	803,79	86'121,47	9,60
64 gg	1'546,02	87'667,48	9,77
65 gg	4'087,40	91'754,88	10,22
68 gg	803,79	92'558,67	10,31
69 gg	803,79	93'362,46	10,40
70 gg	1'546,02	94'908,47	10,57
71 gg	4'087,40	98'995,87	11,03
72 gg	803,79	99'799,66	11,12
75 gg	803,79	100'603,45	11,21
76 gg	1'546,02	102'149,47	11,38
77 gg	4'087,40	106'236,86	11,84
78 gg	803,79	107'040,65	11,93
79 gg	803,79	107'844,45	12,02
82 gg	803,79	108'648,24	12,11
83 gg	1'584,61	110'232,85	12,28
84 gg	4'066,74	114'299,59	12,73
85 gg	803,78	115'103,38	12,82
86 gg	803,78	115'907,16	12,91
89 gg	4'087,51	119'994,67	13,37
90 gg	803,78	120'798,46	13,46
91 gg	803,78	121'602,24	13,55
93 gg	803,79	122'406,03	13,64
96 gg	803,79	123'209,83	13,73
97 gg	803,79	124'013,62	13,82
98 gg	1'546,06	125'559,67	13,99
99 gg	1'546,06	127'105,73	14,16
100 gg	4'105,38	131'211,11	14,62
103 gg	803,79	132'014,90	14,71
104 gg	803,79	132'818,69	14,80
105 gg	803,79	133'622,48	14,89

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
106 gg	1'546,02	135'168,50	15,06
107 gg	49'006,55	184'175,04	20,52
110 gg	33'990,71	218'165,76	24,31
111 gg	33'990,71	252'156,47	28,09
112 gg	33'990,71	286'147,19	31,88
113 gg	33'990,71	320'137,90	35,67
114 gg	33'990,71	354'128,61	39,46
117 gg	38'268,35	392'396,96	43,72
118 gg	4'277,64	396'674,60	44,20
119 gg	4'277,64	400'952,24	44,67
120 gg	4'277,64	405'229,88	45,15
121 gg	11'123,16	416'353,04	46,39
124 gg	11'926,95	428'280,00	47,72
125 gg	803,79	429'083,79	47,81
126 gg	3'945,04	433'028,82	48,25
127 gg	3'945,04	436'973,86	48,69
128 gg	3'945,04	440'918,89	49,13
131 gg	6'242,21	447'161,10	49,82
132 gg	803,79	447'964,89	49,91
133 gg	803,79	448'768,68	50,00
134 gg	1'546,02	450'314,70	50,17
135 gg	5'389,25	455'703,95	50,77
139 gg	2'398,98	458'102,93	51,04
140 gg	3'202,77	461'305,70	51,40
141 gg	1'546,02	462'851,71	51,57
142 gg	7'788,23	470'639,94	52,44
145 gg	803,79	471'443,73	52,53
146 gg	1'405,49	472'849,22	52,68
147 gg	1'405,49	474'254,72	52,84
148 gg	601,71	474'856,42	52,91
149 gg	5'187,28	480'043,70	53,48
152 gg	803,78	480'847,49	53,57
153 gg	1'405,49	482'252,98	53,73
154 gg	601,71	482'854,69	53,80
155 gg	5'187,28	488'041,97	54,38
159 gg	803,79	488'845,76	54,47
160 gg	1'405,49	490'251,26	54,62
162 gg	5'694,75	495'946,00	55,26
163 gg	8'132,48	504'078,49	56,16
166 gg	4'350,83	508'429,32	56,65
168 gg	4'952,54	513'381,86	57,20
169 gg	4'890,85	518'272,71	57,74
170 gg	8'768,68	527'041,39	58,72
173 gg	3'547,02	530'588,42	59,12
174 gg	3'547,02	534'135,44	59,51
175 gg	3'547,02	537'682,47	59,91
176 gg	11'112,87	548'795,34	61,14
177 gg	4'095,86	552'891,20	61,60
180 gg	4'095,86	556'987,06	62,06
181 gg	548,84	557'535,89	62,12
182 gg	548,84	558'084,73	62,18
183 gg	548,84	558'633,57	62,24
184 gg	548,84	559'182,40	62,30
187 gg	548,84	559'731,24	62,36
188 gg	548,84	560'280,07	62,42
189 gg	548,84	560'828,91	62,49
190 gg	548,84	561'377,74	62,55
191 gg	548,84	561'926,58	62,61
194 gg	3'774,77	565'701,35	63,03
195 gg	3'225,93	568'927,28	63,39
196 gg	3'225,93	572'153,21	63,75
197 gg	3'225,93	575'379,15	64,11
198 gg	3'225,93	578'605,08	64,47
201 gg	3'225,93	581'831,01	64,83
202 gg	3'225,93	585'056,94	65,19
203 gg	3'225,93	588'282,87	65,54
204 gg	3'225,93	591'508,80	65,90
205 gg	3'225,93	594'734,73	66,26
208 gg	5'406,48	600'141,21	66,87
209 gg	2'180,55	602'321,76	67,11

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
210 gg	2'180,55	604'502,30	67,35
211 gg	2'180,55	606'682,85	67,59
212 gg	2'180,55	608'863,39	67,84
215 gg	2'180,55	611'043,94	68,08
216 gg	2'180,55	613'224,48	68,32
217 gg	2'180,55	615'405,03	68,57
218 gg	2'180,55	617'585,58	68,81
219 gg	2'180,55	619'766,12	69,05
222 gg	2'180,55	621'946,67	69,30
223 gg	2'180,55	624'127,21	69,54
224 gg	4'811,69	628'938,90	70,07
225 gg	4'811,69	633'750,59	70,61
226 gg	2'631,14	636'381,73	70,90
229 gg	982,41	637'364,14	71,01
230 gg	982,41	638'346,55	71,12
231 gg	982,41	639'328,96	71,23
232 gg	982,41	640'311,38	71,34
233 gg	982,41	641'293,79	71,45
236 gg	982,41	642'276,20	71,56
237 gg	982,41	643'258,61	71,67
238 gg	982,41	644'241,03	71,78
239 gg	982,41	645'223,44	71,89
240 gg	9'756,07	654'979,51	72,98
243 gg	1'085,98	656'065,49	73,10
244 gg	1'866,42	657'931,90	73,30
245 gg	1'741,15	659'673,05	73,50
246 gg	1'741,14	661'414,19	73,69
247 gg	2'262,55	663'676,74	73,94
250 gg	1'570,29	665'247,03	74,12
251 gg	587,88	665'834,91	74,19
252 gg	177,00	666'011,91	74,20
253 gg	436,90	666'448,81	74,25
254 gg	484,40	666'933,21	74,31
257 gg	693,37	667'626,57	74,38
258 gg	975,31	668'601,88	74,49
259 gg	928,33	669'530,21	74,60
260 gg	754,86	670'285,07	74,68
261 gg	754,86	671'039,93	74,77
264 gg	754,86	671'794,79	74,85
265 gg	249,25	672'044,03	74,88
266 gg	403,45	672'447,49	74,92
267 gg	742,97	673'190,46	75,00
268 gg	585,18	673'775,64	75,07
271 gg	486,82	674'262,46	75,12
272 gg	669,92	674'932,38	75,20
274 gg	669,92	675'602,30	75,27
275 gg	1'194,10	676'796,39	75,41
278 gg	3'955,69	680'752,09	75,85
279 gg	5'895,08	686'647,17	76,50
280 gg	5'656,79	692'303,95	77,13
281 gg	5'080,10	697'384,05	77,70
282 gg	6'430,01	703'814,06	78,42
285 gg	6'110,71	709'924,76	79,10
286 gg	4'236,21	714'160,97	79,57
287 gg	3'005,71	717'166,68	79,90
288 gg	2'457,06	719'623,74	80,18
289 gg	3'961,42	723'585,16	80,62
292 gg	1'430,37	725'015,54	80,78
293 gg	3'498,13	728'513,67	81,17
294 gg	8'908,82	737'422,49	82,16
295 gg	4'567,95	741'990,45	82,67
296 gg	11'979,58	753'970,03	84,00
299 gg	4'953,24	758'923,27	84,56
300 gg	4'953,24	763'876,51	85,11
301 gg	3'621,29	767'497,79	85,51
302 gg	3'621,29	771'119,08	85,92
303 gg	4'120,61	775'239,69	86,37
306 gg	2'468,56	777'708,25	86,65
307 gg	499,33	778'207,58	86,71
308 gg	909,14	779'116,71	86,81

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
309 gg	909,14	780'025,85	86,91
310 gg	2'403,51	782'429,36	87,18
313 gg	2'345,65	784'775,00	87,44
314 gg	2'345,65	787'120,65	87,70
315 gg	2'345,65	789'466,29	87,96
316 gg	1'860,63	791'326,92	88,17
317 gg	7'670,73	798'997,65	89,02
320 gg	3'203,32	802'200,96	89,38
321 gg	2'837,06	805'038,02	89,69
322 gg	25'310,73	830'348,75	92,51
323 gg	26'000,92	856'349,67	95,41
324 gg	1'970,10	858'319,78	95,63
327 gg	1'970,10	860'289,88	95,85
328 gg	1'279,91	861'569,79	95,99
329 gg	250,26	861'820,06	96,02
330 gg	8'782,74	870'602,80	97,00
331 gg	11'738,60	882'341,39	98,31
334 gg	6'534,40	888'875,79	99,04
335 gg	8'656,18	897'531,97	100,00
Lampedusa e Linosa,			
<p><b>Tecnico</b>  arch. Licata Giuseppe  ARCHITETTO  N. 1507  Sezione A.  Architettura  ORDINE REGIONALE  di ARCHITETTI  di Lampedusa e Linosa</p>			
