


REGIONE SICILIANA
COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

**PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
DELLE STRADE EXTRAURBANE DI
LAMPEDUSA**

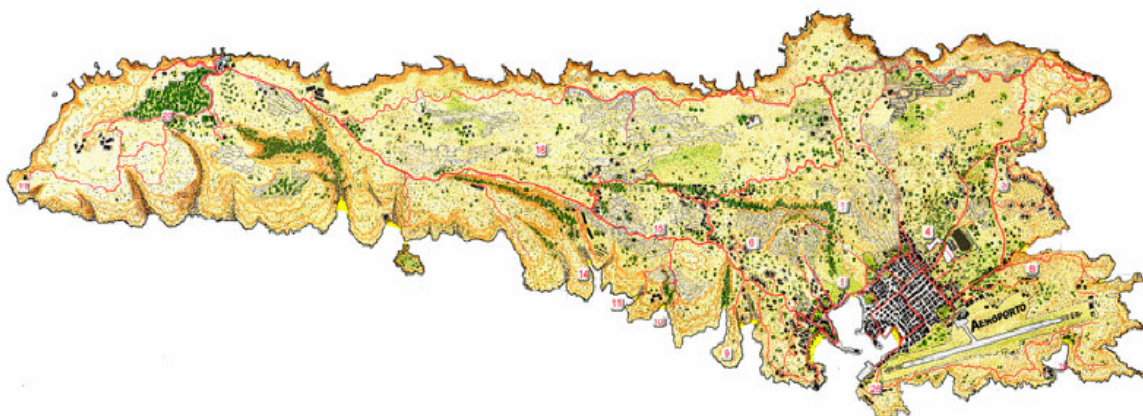

CRONOPROGRAMMA

IL PROGETTISTA
(.....)

PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI										
	mese									
	1	2	3	4	5	6	[€/mese]	durata [mesi]		[€]
0 ACCANTIERAMENTO							33.750,00	0,75		45.000,00
1 SCARIFICAZIONE E TRASPORTO A RIFIUTO							84.392,55	4,00		337.570,18
2 TAPPETINO D'USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO							225.345,51	5,00		1.126.727,55
3 SEGNALETICA VERTICALE							45.428,50	3,00		136.285,50
4 SEGNALETICA ORIZZONTALE							34.805,59	3,00		104.416,77
10 DISMISSIONE CANTIERE							11.250,00	0,25		45.000,00
SICUREZZA DA SOMMARE AI LAVORI							Totale lavori	6,00		1.750.000,00
							Sicurezza			50.000,00
							Totale			1.800.000,00
PRODUZIONE MENSILE [€/mese]	42.083,33	318.071,39	318.071,39	398.305,48	398.305,48	325.162,93	1.800.000,00			
PRODUZIONE TOTALE PROGRESSIVA [€]	42.083,33	360.154,72	678.226,11	1.076.531,59	1.474.837,07	1.800.000,00				
AVANZAMENTO PERCENTUALE	2,3%	20,0%	37,7%	59,8%	81,9%	100,0%				
